志賀原子力発電所周辺環境放射線監視結果報告書

（ 事 前 調 査 ）

（平成２年７月～４年10月）

平 成 5 年 7 月

石　　川　　県

は じ め に

石川県、志賀町及び北陸電力株式会社は、北陸電力株式会社志賀原子力発電所（以下「発電所」という。）周辺における公衆の安全を確保し生活環境の保全を図るため、「志賀原子力発電所周辺環境放射線監視年度計画」に基づき、発電所の運転開始前の平成２年７月から、発電所周辺地域における環境放射線監視を実施しています。

本報告書は、平成２年７月から平成４年10月までの事前調査結果について、平成５年７月に開催された「石川県原子力環境安全管理協議会」において確認されたものをとりまとめたものです。

【目　次】

1．調査概要

1．1　調査機関

石川県

北陸電力株式会社

1．2　調査期間

平成2年7月～平成4年10月

1．3　測定項目

測定項目は、表1～表3に示すとおりである。

表1　空間放射線

<table>
<tr><th>項　目</th><th>頻　度</th><th colspan="3">測　定　地　点
（図1　参照）</th></tr>
<tr><td rowspan="3">線量率</td><td rowspan="3">連　続</td><td rowspan="2">環境放射線観測局
（モニタリングステーション）
石川県実施分</td><td>①志 賀 局
②赤 住 局
③直 海 局</td><td>志賀町安部屋
志賀町赤住
志賀町直海</td></tr>
<tr><td>④福 浦 局
⑤熊 野 局</td><td>富来町福浦港
富来町三明</td></tr>
<tr><td>モニタリングポスト
北陸電力実施分</td><td>①MP－1
②MP－2
③MP－3
④MP－4
⑤MP－5
⑥MP－6
⑦MP－7</td><td>志 賀 町
（発電所
敷地境界）</td></tr>
</table>

表１　空間放射線（つづき）

項　目	頻　度	測　定　地　点 （図１　参照）		
積算線量	３カ月毎	ＴＬＤポスト （モニタリングポイント） 石川県実施分	志賀町	①　若葉台
				②　直海
				③　代田
				④　徳田
				⑤　赤住
				⑥　大笹
				⑦　志賀
				⑧　上野
				⑨　高浜町
				⑩　倉垣
				⑪　二所宮
				⑫　岩田
			富来町	⑬　大福寺
				⑭　赤崎
				⑮　大西
				⑯　里本江
				⑰　風無
				⑱　生神
				⑲　熊野
				⑳　福浦
			羽咋市	㉑　柴垣町
				㉒　旭町
			田鶴浜町	㉓　大津
				㉔　田鶴浜

表１　空間放射線（つづき）

項　目	頻　度	測定地点（図１　参照）		
積算線量	３カ月毎	ＴＬＤポスト（モニタリングポイント）石川県実施分	鳥屋町	㉕ 瀬戸 ㉖ 羽坂
			中島町	㉗ 中島 ㉘ 豊田町
			鹿西町	㉙ 上後山 ㉚ 能登部上
		モニタリングポイント 北陸電力実施分	志賀町	① 若葉台 ② 五里峠 ③ 赤住（袮々） ④ 赤住（公民館） ⑤ 赤住（江野） ⑥ 百浦 ⑦ 高浜
			富来町	⑧ 高田 ⑨ 谷神 ⑩ 牛下 ⑪ 和光台 ⑫ 福浦港

表2　環境試料中の放射能

測定試料			地点数		採取頻度	採取地点（図2　参照）
陸上試料	降下物（雨水ちり）		県	2	毎　月	志賀町安部屋（志賀局） 富来町福浦港（福浦局）
陸上試料	降下物（雨水ちり）		電	2	毎　月	発電所敷地内 富来町福浦港
陸上試料	大気中放射性物質（大気浮遊じん）		県	1	連　続（毎　月）	志賀町安部屋（志賀局）
陸上試料	大気中放射性物質（大気浮遊じん）		県	1	毎　月	富来町福浦港（福浦局）
陸上試料	大気中放射性物質（大気浮遊じん）		電	2	連　続（毎　月）	発電所敷地内 （MP－2、MP－6）
陸上試料	陸水	水道水	県	2	年4回	志賀町高浜 富来町地頭
陸上試料	陸水	水道水	電	1	年4回	志賀町若葉台
陸上試料	陸水	河川水	電	1	年4回	大坪川
陸上試料	土壌		県	2	年1回	志賀町若葉台 志賀町直海
陸上試料	土壌		電	2	年4回	発電所敷地内 志賀町赤住

（注）県は石川県実施分、電は北陸電力実施分である。

表2　環境試料中の放射能（つづき）

測定試料			地点数		採取頻度	採取地点（図2　参照）
陸上試料	指標植物（松葉）		県	2	年4回	志賀町若葉台 富来町三明
			電	2	年4回	発電所敷地内 志賀町赤住
	農畜産物	牛乳	県	1	年4回	志賀町安部屋
			電	1	年4回	志賀町安部屋
		精米	県	2	年1回 （収穫期）	志賀町直海 富来町貝田
			電	2	年1回 （収穫期）	志賀町赤住 志賀町直海
		大根	県	3	年1回 （収穫期）	志賀町赤住 志賀町直海 富来町福浦港
			電	1	年1回 （収穫期）	志賀町五里峠
		キャベツ	電	1	年1回 （収穫期）	富来町牛下
		白菜	県	3	年1回 （収穫期）	志賀町赤住 志賀町直海 富来町福浦港
			電	1	年1回 （収穫期）	志賀町赤住

（注）県は石川県実施分、電は北陸電力実施分である。

表2　環境試料中の放射能（つづき）

<table>
<tr><th colspan="4">測　定　試　料</th><th colspan="2">地点数</th><th>採取頻度</th><th>採　取　地　点
（図2　参照）</th></tr>
<tr><td rowspan="4">陸上試料</td><td rowspan="4">農畜産物</td><td rowspan="4">地域特産物</td><td rowspan="2">スイカ</td><td>県</td><td>1</td><td>年1回
（収穫期）</td><td>志賀町倉垣</td></tr>
<tr><td>電</td><td>1</td><td>年1回
（収穫期）</td><td>志賀町大津</td></tr>
<tr><td>ころ柿
（干柿）</td><td>県</td><td>1</td><td>年1回
（収穫期）</td><td>志賀町矢田</td></tr>
<tr><td>アスパラガス</td><td>県</td><td>1</td><td>年1回
（収穫期）</td><td>富来町貝田</td></tr>
<tr><td rowspan="4">海洋試料</td><td colspan="3" rowspan="2">海　水</td><td>県</td><td>3</td><td>年1回</td><td>志賀町赤住（辰田）地先
志賀町赤住（宮の先）地先
富来町福浦港（吉良）地先</td></tr>
<tr><td>電</td><td>3</td><td>年4回</td><td>放水口付近
志賀町赤住（江野）地先
富来町福浦港（丹和）地先</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">海　底　土</td><td>県</td><td>3</td><td>年1回</td><td>志賀町赤住（辰田）地先
志賀町赤住（宮の先）地先
富来町福浦港（吉良）地先</td></tr>
<tr><td>電</td><td>3</td><td>年4回</td><td>放水口付近
志賀町赤住（江野）地先
富来町福浦港（丹和）地先</td></tr>
</table>

（注）県は石川県実施分、電は北陸電力実施分である。

表2　環境試料中の放射能（つづき）

<table>
<tr><th colspan="3">測　定　試　料</th><th colspan="2">地点数</th><th>採取頻度</th><th>採　取　地　点
（図2　参照）</th></tr>
<tr><td rowspan="10">海
洋
試
料</td><td colspan="2" rowspan="2">指標海産物
（ホンダワラ）</td><td>県</td><td>4</td><td>年3回</td><td>志賀町赤住（松戸）地先
志賀町百浦地先
富来町福浦港（水之間）地先
富来町福浦港（丹和）地先</td></tr>
<tr><td>電</td><td>3</td><td>年4回</td><td>放水口付近
志賀町赤住（江野）地先
富来町福浦港（丹和）地先</td></tr>
<tr><td rowspan="8">海
産
物</td><td>イワノリ</td><td>県</td><td>2</td><td>年1回
（漁期）</td><td>志賀町上野地先
富来町吉良地先</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ワカメ</td><td>県</td><td>2</td><td>年1回
（漁期）</td><td>志賀町赤住地先
富来町吉良地先</td></tr>
<tr><td>電</td><td>1</td><td>年1回
（漁期）</td><td>志賀町赤住地先</td></tr>
<tr><td rowspan="2">サザエ</td><td>県</td><td>2</td><td>年2回
（漁期）</td><td>志賀町百浦地先
富来町吉良地先</td></tr>
<tr><td>電</td><td>1</td><td>年1回
（漁期）</td><td>志賀町赤住地先</td></tr>
<tr><td>チダイ</td><td>県</td><td>2</td><td>年1回
（漁期）</td><td>志賀町沖
富来町沖</td></tr>
<tr><td>マダイ</td><td>電</td><td>1</td><td>年1回
（漁期）</td><td>志賀町沖</td></tr>
</table>

（注）県は石川県実施分、電は北陸電力実施分である。

表２　環境試料中の放射能（つづき）

測定試料			地点数		採取頻度	採取地点 （図２　参照）
海洋試料	海産物	メバル	県	2	年１回 （漁期）	志賀町沖 富来町沖
		マガレイ	電	1	年１回 （漁期）	志賀町沖
		ヒラメ	県	2	年１回 （漁期）	志賀町沖 富来町沖
			電	1	年１回 （漁期）	志賀町沖
		キス	県	2	年１回 （漁期）	志賀町沖 富来町沖
		マイワシ	電	1	年１回 （漁期）	志賀町沖

（注）県は石川県実施分、電は北陸電力実施分である。

表3　気象要素

観測地点（図1　参照）			頻度	項目									
				風向	風速	日射量	放射収支量	気温	湿度	降水量	積雪深	感雨雪	感雷
県	志賀町	①　志賀局	連続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		②　赤住局		○	○								
		③　直海局		○	○								
	富来町	④　福浦局		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		⑤　熊野局		○	○								
電	発電所敷地内（気象観測鉄塔地点）			○	○			○					

（注）県は石川県実施分、電は北陸電力実施分である。

図１　空間放射線測定地点図

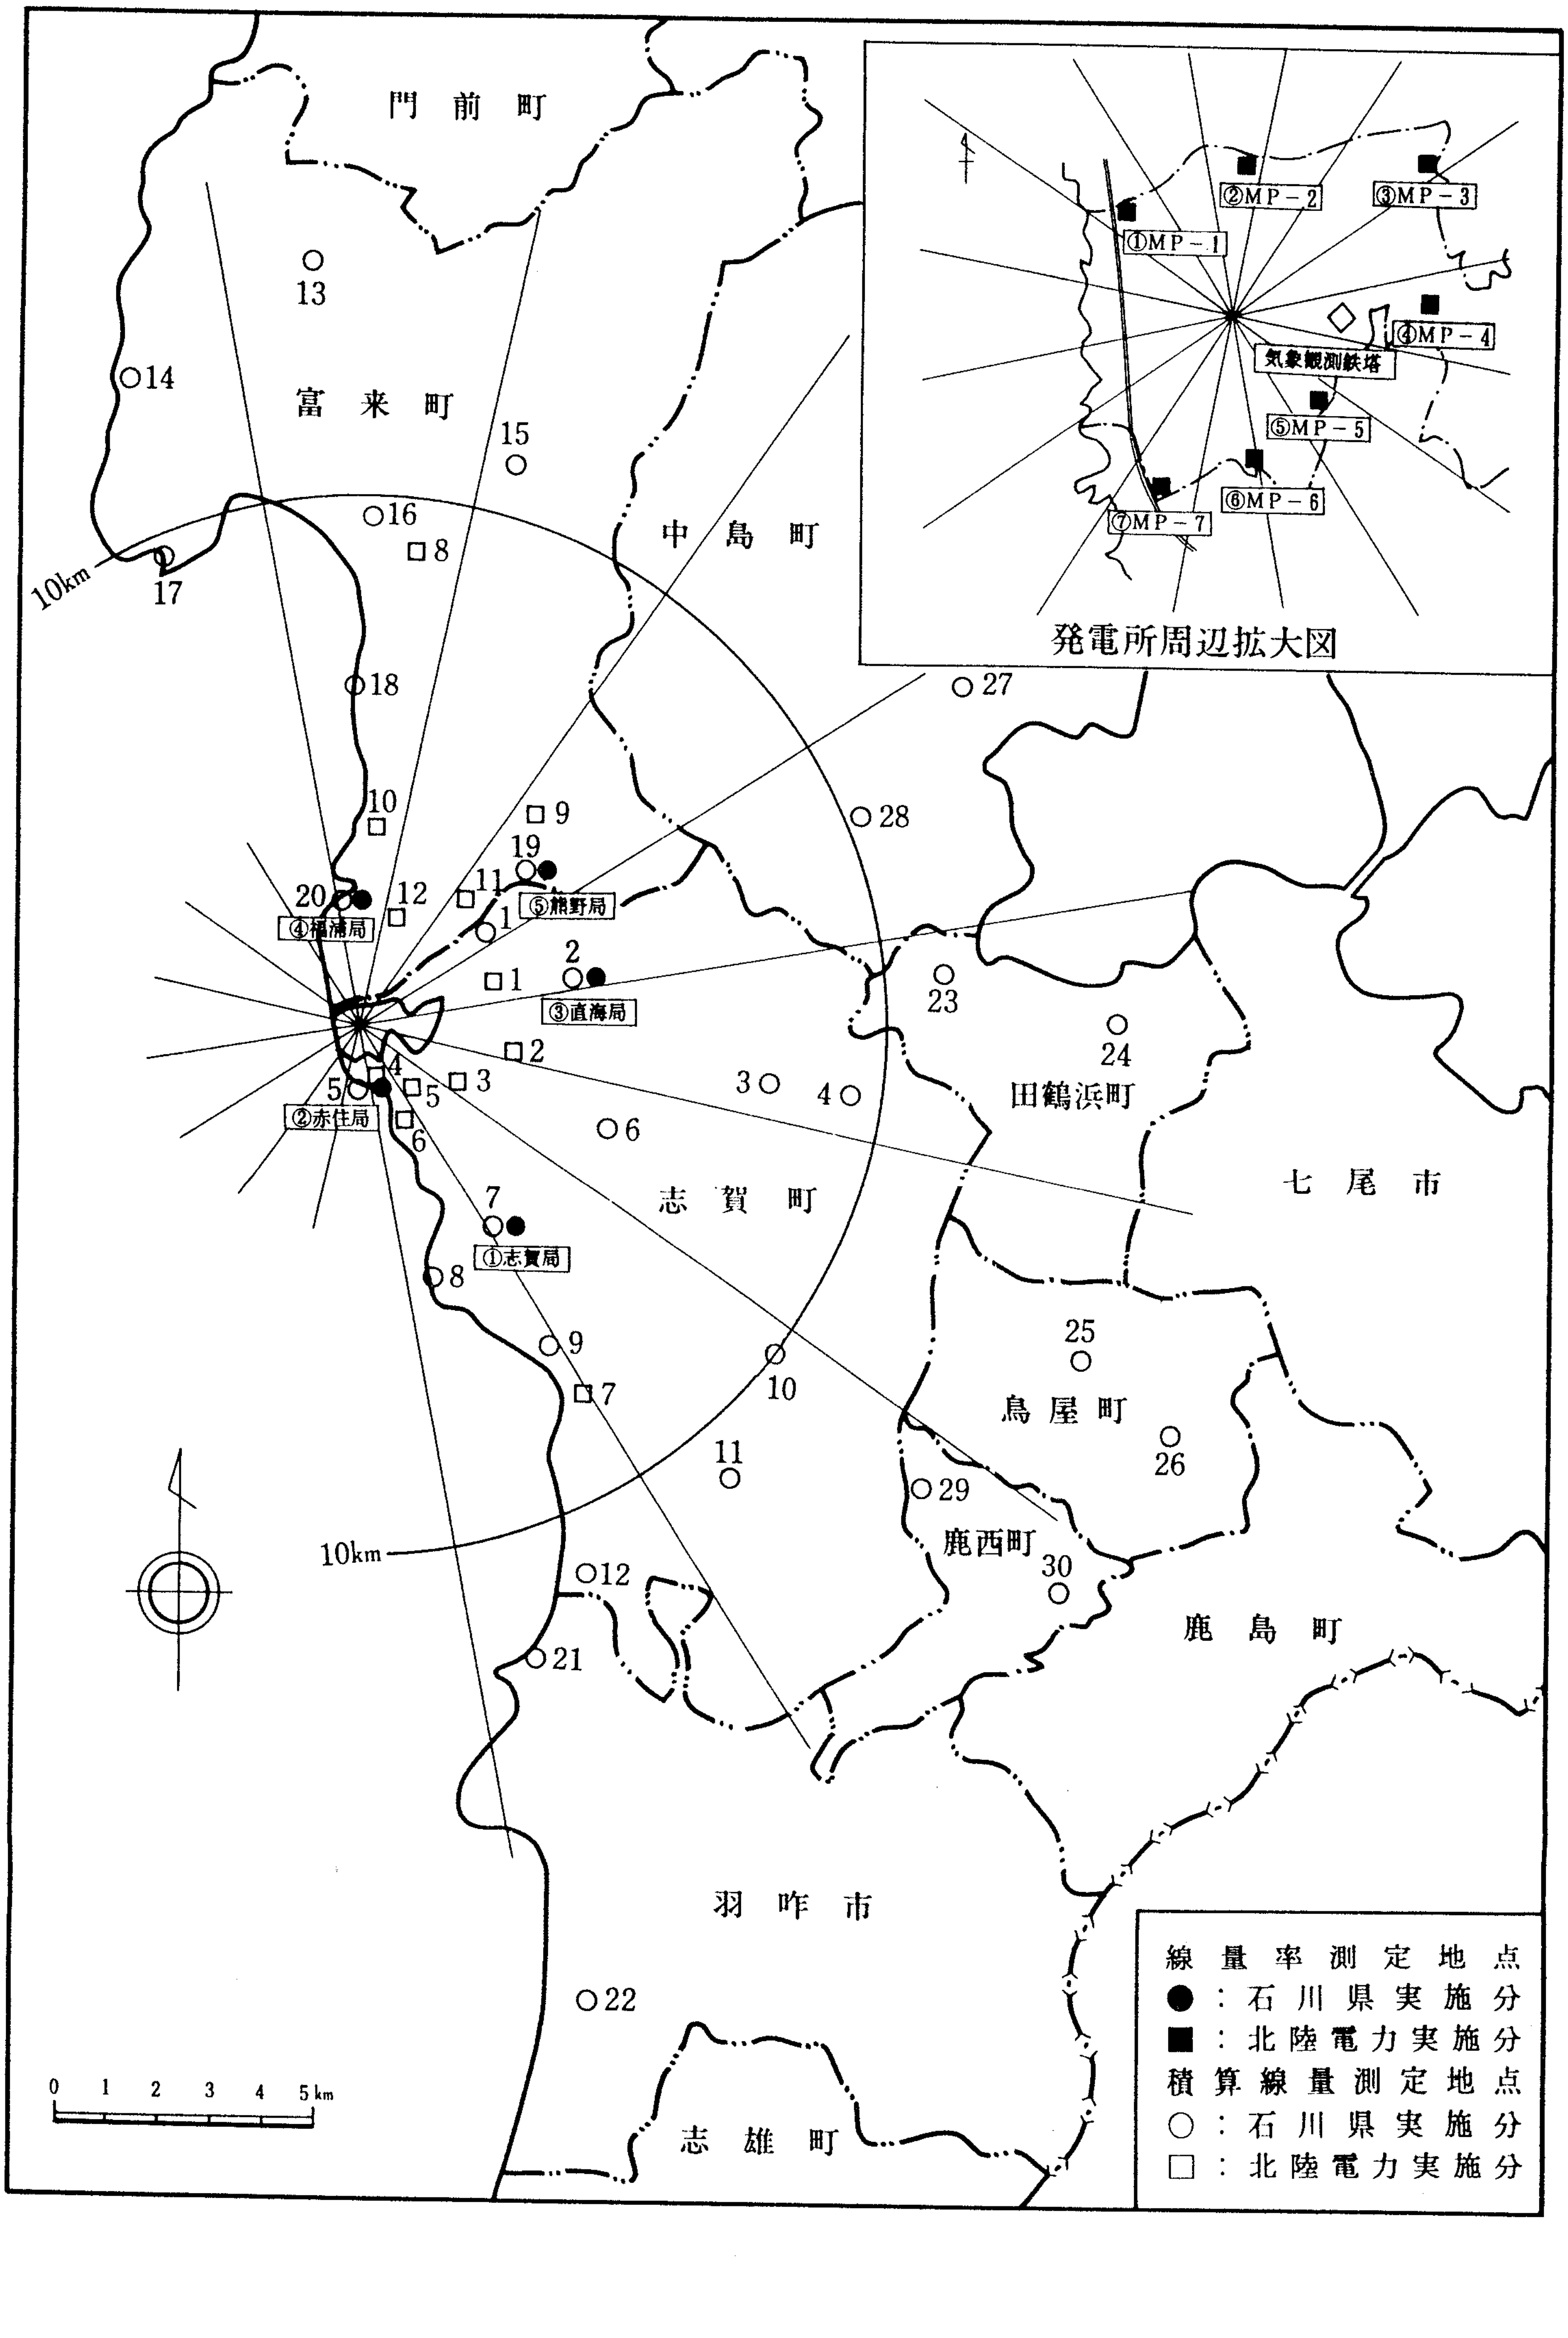

図２　環境試料採取地点図

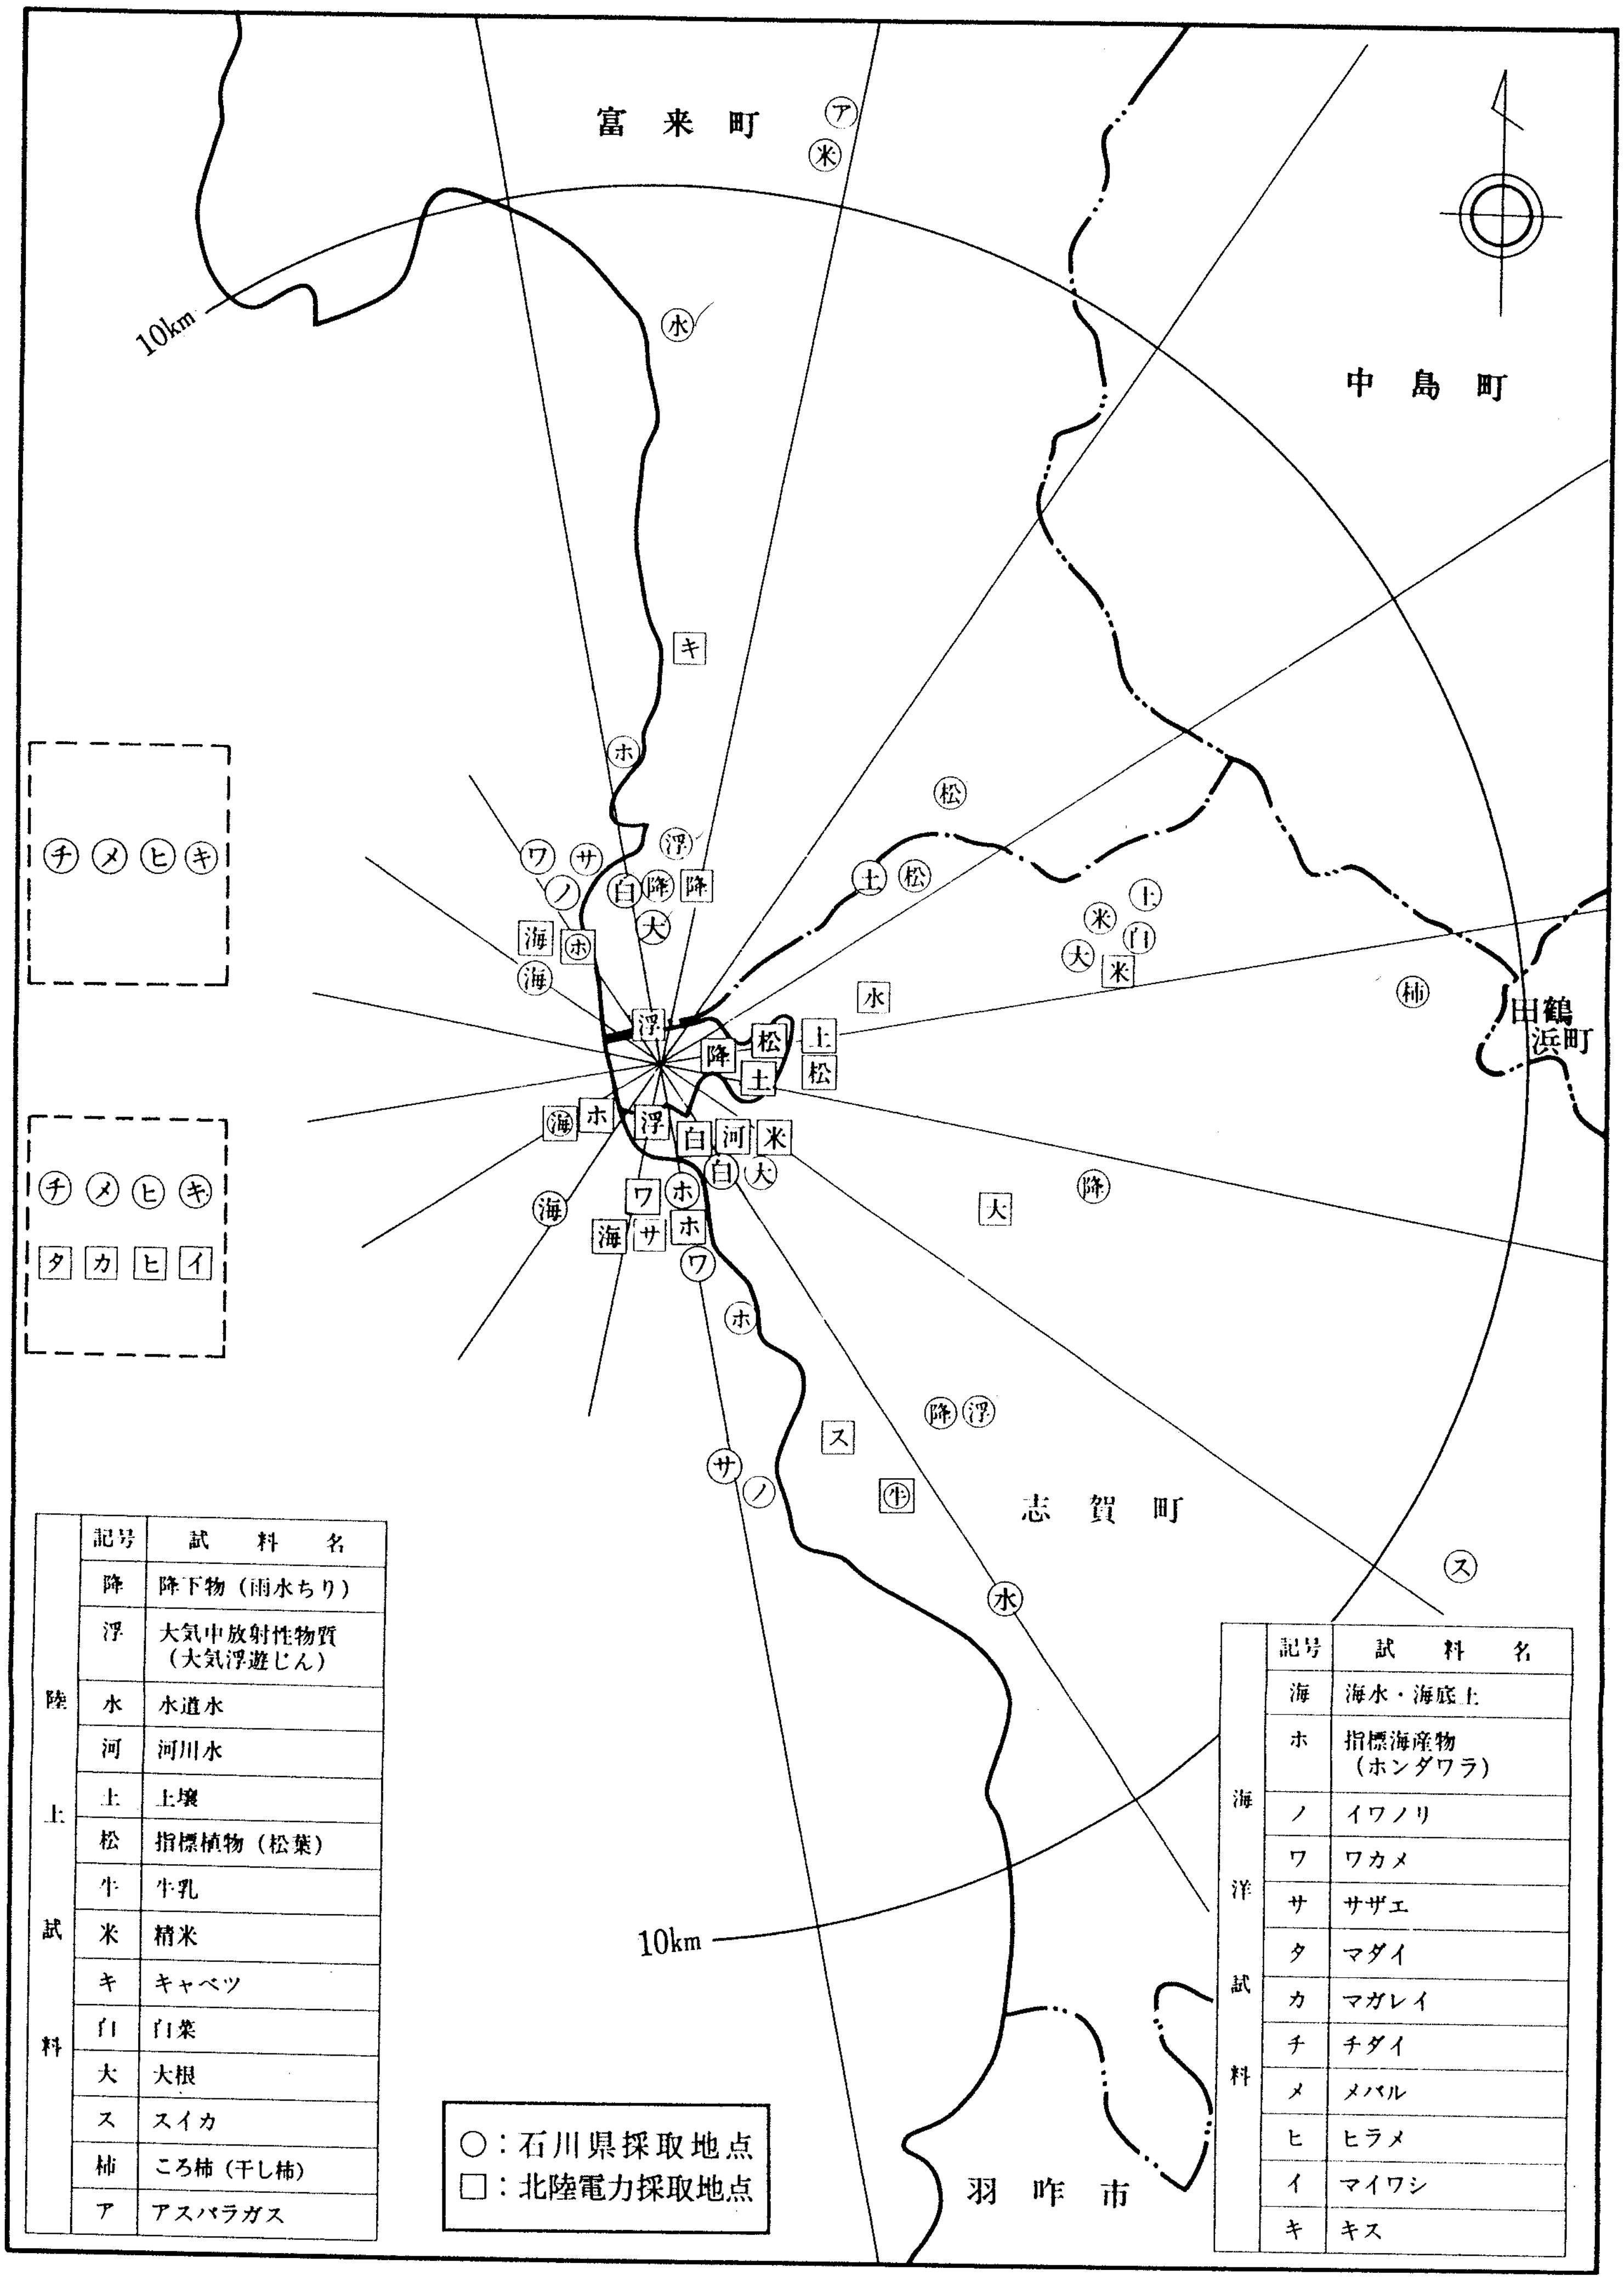

	記号	試料名
陸上試料	降	降下物（雨水ちり）
	浮	大気中放射性物質（大気浮遊じん）
	水	水道水
	河	河川水
	土	土壌
	松	指標植物（松葉）
	牛	牛乳
	米	精米
	キ	キャベツ
	白	白菜
	大	大根
	ス	スイカ
	柿	ころ柿（干し柿）
	ア	アスパラガス

	記号	試料名
海洋試料	海	海水・海底土
	ホ	指標海産物（ホンダワラ）
	ノ	イワノリ
	ワ	ワカメ
	サ	サザエ
	タ	マダイ
	カ	マガレイ
	チ	チダイ
	メ	メバル
	ヒ	ヒラメ
	イ	マイワシ
	キ	キス

２．調査結果

２．１　空間放射線

(1)　線量率

環境放射線観測局及びモニタリングポストにおける線量率の測定結果は、それぞれ表４のとおりであった。

表４－１　線量率の測定結果

石川県実施分　　　　　　　　　　単位：ｎＧｙ／ｈ

測　定　地　点		最高値	最低値	平均値
志賀町	①　志賀局	１１１	２９．３	４５．３
	②　赤住局	９７．７	３９．４	４６．０
	③　直海局	１０７	３５．２	５１．７
富来町	④　福浦局	９９．５	２７．５	３８．９
	⑤　熊野局	９１．８	２９．６	４０．９

（注）測定位置：地上１．８ｍ

表４－２　線量率の測定結果

北陸電力実施分　　　　　　　　　単位：ｎＧｙ／ｈ

測 定 地 点	最高値	最低値	平均値
① ＭＰ－１	１０３	２２．０	２７．４
② ＭＰ－２	１１５	２２．９	３２．７
③ ＭＰ－３	１０６	１７．８	２８．４
④ ＭＰ－４	１１０	２２．０	３３．３
⑤ ＭＰ－５	１１４	１９．５	２９．９
⑥ ＭＰ－６	１１０	２３．２	３４．７
⑦ ＭＰ－７	１０３	１９．０	２５．９

（注）測定位置：鉄骨造建物屋上（地上約４ｍ）

⑵　積算線量

モニタリングポイント（４２カ所）における積算線量は、０．１０～０．１９ｍＧｙ／９１日であった。

2．2　環境試料中の放射能

(1) 大気中放射性物質

a．大気浮遊じん（全アルファ放射能）

志賀局における大気中放射性物質の全アルファ放射能は0．0～6．7Bq／m³であった。

b．大気浮遊じん（全ベータ放射能）

志賀局、MP－2、MP－6における大気中放射性物質の全ベータ放射能は0．0～12．7Bq／m³であった。

c．放射性ヨウ素

志賀局における大気中放射性物質の放射性ヨウ素はすべて検出下限値未満であった。

(2) 核種分析（機器分析）

環境試料について、測定された人工放射性核種の濃度は表5のとおりであった。

平成3年度に採取した一部のホンダワラから検出目標レベル（0．2Bq／kg生）未満ではあるが、ヨウ素131と推定されるガンマ線スペクトルのピークがみられた。

(3) 核種分析（放射化学分析）

環境試料中の放射性ストロンチウム、トリチウムの濃度は表6のとおりであった。

表5　核種分析結果

測定試料			単位	地点数	検体数	測定された核種	測定値範囲
陸上試料	降下物（雨水ちり）		Bq/m²・月	4	112	Cs-137	LTD〜0.20
	大気中放射性物質（大気浮遊じん）		mBq/m³	4	131	無し	LTD
	陸水	水道水	mBq/ℓ	3	30	無し	LTD
		河川水	mBq/ℓ	1	10	無し	LTD
	土壌		Bq/kg乾土	4	30	Cs-137	LTD〜121
	指標植物（松葉）		Bq/kg生	4	36	Cs-137	LTD〜0.71
	農畜産物	牛乳	Bq/ℓ	1	18	無し	LTD
		精米	Bq/kg生	4	12	無し	LTD
		大根	Bq/kg生	4	10	無し	LTD
		白菜	Bq/kg生	4	8	無し	LTD
		キャベツ	Bq/kg生	1	2	無し	LTD
		スイカ	Bq/kg生	2	6	無し	LTD
		ころ柿（干柿）	Bq/kg生	1	2	Cs-137	0.20〜0.25
		アスパラガス	Bq/kg生	1	3	無し	LTD

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。

表5　核種分析結果（つづき）

測定試料			単位	地点数	検体数	測定された核種	測定値範囲
海洋試料	海水		mBq/ℓ	6	39	Cs-137	2.1～4.3
	海底土		Bq/kg乾土	6	39	無し	LTD
	指標海産物(ホンダワラ)		Bq/kg生	7	62	Cs-137	LTD～0.30
	海産物	イワノリ	Bq/kg生	2	4	無し	LTD
		ワカメ	Bq/kg生	3	9	無し	LTD
		サザエ	Bq/kg生	3	26	Cs-137	LTD～0.22
		チダイ	Bq/kg生	2	6	Cs-137	LTD～0.24
		マダイ	Bq/kg生	1	3	Cs-137	0.20～0.23
		メバル	Bq/kg生	2	6	Cs-137	LTD～0.29
		マガレイ	Bq/kg生	1	2	無し	LTD
		ヒラメ	Bq/kg生	3	9	Cs-137	LTD～0.29
		キス	Bq/kg生	2	6	Cs-137	LTD～0.23
		マイワシ	Bq/kg生	1	3	無し	LTD

（注）LTDは検出目標レベル未満である。

表６－１　核種分析結果（放射化学分析：放射性ストロンチウム）

測　定　試　料			単　位	地点数	検体数	測定値範囲
陸上試料	土　　壌		Bq/kg乾土	2	１８	1.9～12.5
陸上試料	農畜産物	牛　　乳	Bq/ℓ	1	9	0.021～0.039
陸上試料	農畜産物	精　　米	Bq/kg生	2	6	ＬＴＤ
陸上試料	農畜産物	大　　根	Bq/kg生	4	１０	ＬＴＤ～0.73
陸上試料	農畜産物	白　　菜	Bq/kg生	3	6	0.08～0.26
陸上試料	農畜産物	キャベツ	Bq/kg生	1	2	0.06～0.23
海洋試料	海　底　土		Bq/kg乾土	3	３０	ＬＴＤ
海洋試料	海産物	ワ　カ　メ	Bq/kg生	2	6	ＬＴＤ
海洋試料	海産物	サ　ザ　エ	Bq/kg生	2	２０	ＬＴＤ
海洋試料	海産物	チ　ダ　イ	Bq/kg生	2	6	ＬＴＤ
海洋試料	海産物	メ　バ　ル	Bq/kg生	2	6	ＬＴＤ

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。

表6－2　核種分析結果（放射化学分析：トリチウム）

測　定　試　料	単　位	地点数	検体数	測定値範囲
水　道　水	Bq/ℓ	3	３０	ＬＴＤ～1.9
河　川　水	Bq/ℓ	1	１０	ＬＴＤ～1.5
海　　　水	Bq/ℓ	6	３９	ＬＴＤ

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。

資　料　編

【目　次】

1．空間放射線

(1) 線量率

石川県実施分

測　定　地　点		測定年月	最高値	最低値	平均値
志賀町	① 志賀局	2年　7月	72．8	40．4	46．0
		8月	63．1	43．2	46．9
		9月	72．4	41．8	45．8
		10月	65．1	40．9	44．6
		11月	83．1	41．9	45．5
		12月	111．3	41．3	46．2
		3年　1月	92．1	37．2	45．8
		2月	81．2	29．3	44．1
		3月	64．9	42．1	45．3
		4月	73．2	41．6	44．5
		5月	80．5	41．8	45．0
		6月	84．7	41．5	45．6
		7月	86．4	41．3	44．7
		8月	61．9	41．7	45．6
		9月	75．2	42．4	45．5
		10月	72．6	41．0	44．4
		11月	84．4	41．5	45．5
		12月	105．4	37．9	45．7
		4年　1月	96．6	36．8	46．1
		2月	75．6	39．7	45．8
		3月	70．7	37．3	44．9
		4月	65．4	40．9	44．3
		5月	63．8	41．0	43．9
		6月	63．2	43．1	46．1
		7月	98．5	41．5	45．1
		8月	75．9	41．7	45．2
		9月	67．4	41．3	45．4
		10月	76．1	42．4	45．5
		期　間	111．3	29．3	45．3

（注）測定位置：地上1．8m

単位：nGy／h

平均値 ＋ 3×標準偏差	平均値 ＋3×標準偏差 を超えた数（%）	原因	
		降雨雪	その他
54.1	97（2.2）	97	0
52.4	92（2.1）	92	0
54.2	96（2.2）	96	0
53.8	151（3.4）	151	0
58.8	110（2.5）	110	0
65.8	93（2.1）	93	0
62.6	63（1.4）	63	0
63.9	36（0.9）	36	0
56.4	170（3.8）	170	0
53.2	111（2.6）	111	0
54.4	105（2.4）	105	0
58.1	108（2.5）	108	0
58.0	122（2.7）	122	0
51.6	54（1.2）	54	0
54.6	81（1.9）	81	0
53.8	132（3.0）	132	0
59.9	119（2.8）	119	0
64.7	91（2.0）	91	0
65.6	98（2.2）	98	0
61.8	123（2.9）	123	0
58.1	136（3.1）	136	0
55.8	155（3.6）	155	0
51.2	125（2.8）	125	0
52.0	96（2.2）	96	0
57.2	119（2.7）	119	0
53.8	105（2.6）	105	0
52.7	109（2.7）	109	0
54.6	125（2.8）	125	0
57.8	2,885（2.4）	2,885	0

(1) 線量率（つづき）

石川県実施分

測　定　地　点		測定年月	最高値	最低値	平均値
志賀町	② 赤住局	2年 7月	70.8	42.6	45.7
		8月	58.8	43.7	46.6
		9月	65.3	42.8	45.7
		10月	60.9	42.8	45.5
		11月	76.7	42.7	46.1
		12月	97.7	43.1	46.6
		3年 1月	75.0	40.0	47.0
		2月	74.1	39.4	46.4
		3月	63.7	43.2	45.9
		4月	73.9	43.2	45.4
		5月	70.7	42.5	45.5
		6月	73.2	43.0	45.9
		7月	73.8	42.7	45.5
		8月	59.0	43.1	45.8
		9月	70.2	43.6	45.8
		10月	66.5	43.1	45.7
		11月	65.5	43.6	46.4
		12月	89.4	41.8	46.6
		4年 1月	83.3	40.9	46.8
		2月	73.1	42.5	46.7
		3月	66.6	41.6	46.0
		4月	62.2	42.9	45.6
		5月	60.0	42.4	45.1
		6月	58.0	43.9	46.1
		7月	82.0	43.4	46.0
		8月	68.0	43.3	46.0
		9月	61.7	43.3	45.8
		10月	69.3	43.2	45.9
		期　間	97.7	39.4	46.0

（注）測定位置：地上1．8m
赤住局の原因（降雨雪）：志賀局の感雨・積雪深をもととした。

単位：ｎＧｙ／ｈ

平均値 ＋ ３×標準偏差	平均値 ＋３×標準偏差 を超えた数（%）	原　　因	
		降雨雪	その他
５２．０	９７（２．２）	９７	0
５０．９	９０（２．０）	９０	0
５１．５	９３（２．２）	９３	0
５２．６	１５２（３．４）	１５２	0
５６．７	１０６（２．５）	１０６	0
６０．２	８０（１．８）	８０	0
５９．５	６９（１．５）	６９	0
５８．１	６１（１．５）	６１	0
５４．８	１５３（３．４）	１５３	0
５１．８	８６（２．０）	８６	0
５２．４	１０８（２．４）	１０８	0
５４．９	１２０（２．８）	１２０	0
５４．５	１１４（２．６）	１１４	0
５０．０	４３（１．０）	４３	0
５２．７	７６（１．８）	７６	0
５２．７	１４０（３．１）	１４０	0
５６．１	１１９（２．８）	１１９	0
６０．４	８９（２．０）	８９	0
６０．７	１１５（２．６）	１１５	0
５８．５	１１５（２．８）	１１５	0
５６．７	１２３（２．８）	１２３	0
５４．２	１４９（３．４）	１４９	0
５０．６	１２９（２．９）	１２９	0
５０．６	１０２（２．４）	１０２	0
５４．８	１２３（２．８）	１２３	0
５２．６	１１１（２．５）	１１１	0
５０．９	１１０（２．６）	１１０	0
５２．６	１３５（３．０）	１３５	0
５５．０	3,073（２．５）	3,073	0

(1) 線量率（つづき）

石川県実施分

測　定　地　点		測 定 年 月	最高値	最低値	平均値
志 賀 町	③ 直 海 局	2年 7月	82.5	47.4	51.8
		8月	65.3	48.8	53.0
		9月	74.7	48.9	53.2
		10月	72.6	49.0	52.1
		11月	86.0	48.7	52.6
		12月	106.8	47.7	52.8
		3年 1月	78.6	44.8	52.4
		2月	83.5	35.2	50.2
		3月	73.2	46.0	51.5
		4月	80.8	45.7	50.3
		5月	77.0	45.4	50.1
		6月	77.1	47.4	51.2
		7月	81.9	46.5	51.1
		8月	67.0	46.9	51.7
		9月	76.5	48.3	52.3
		10月	71.8	47.1	51.2
		11月	78.7	47.7	52.2
		12月	102.3	47.6	52.4
		4年 1月	95.4	44.0	52.5
		2月	78.3	46.9	52.4
		3月	72.3	47.1	51.7
		4月	67.9	46.5	50.8
		5月	64.2	45.8	50.0
		6月	71.7	46.8	50.7
		7月	77.7	46.8	51.1
		8月	78.3	48.3	51.7
		9月	67.0	47.6	51.8
		10月	73.9	48.0	51.4
		期　間	106.8	35.2	51.7

（注）測定位置：地上1.8m
直海局の原因（降雨雪）：志賀局の感雨・積雪深をもととした。

単位：ｎＧｙ／ｈ

平均値 ＋ ３×標準偏差	平均値 ＋３×標準偏差 を超えた数（％）	原因	
		降雨雪	その他
５９．６	９２（２．１）	９２	0
５７．６	６８（１．５）	６８	0
５９．９	９８（２．３）	９８	0
６０．２	１４４（３．２）	１４４	0
６４．８	１０６（２．５）	１０６	0
６７．５	８８（２．０）	８８	0
６５．８	８２（１．８）	８２	0
６９．３	１９（０．５）	１９	0
６１．１	１１４（２．６）	１１４	0
５８．０	７１（１．６）	７１	0
５８．５	９９（２．２）	９９	0
６１．１	１１８（２．７）	１１８	0
６２．７	１１４（２．６）	１１４	0
５６．７	６２（１．４）	６２	0
６０．１	７４（１．７）	７４	0
５９．５	１３４（３．０）	１３４	0
６３．１	１１５（２．７）	１１５	0
６７．８	６８（１．５）	６８	0
６９．１	９５（２．１）	９５	0
６６．１	１１６（２．８）	１１６	0
６２．７	１２４（２．８）	１２４	0
６０．０	１５０（３．５）	１５０	0
５６．２	１３２（３．０）	１３２	0
５６．６	８７（２．０）	８７	0
６１．５	１３４（３．０）	１３４	0
５９．５	１１９（２．７）	１１９	0
５８．０	１１５（２．７）	１１５	0
５８．９	１２９（２．９）	１２９	0
６２．４	2,654（２．２）	2,654	0

(1) 線量率（つづき）

石川県実施分

測　定　地　点		測定年月	最高値	最低値	平均値
富来町	④ 福浦局	2年　7月	68.2	35.8	38.5
		8月	55.1	35.9	39.2
		9月	61.8	35.7	38.7
		10月	58.1	35.8	38.6
		11月	76.3	35.9	39.4
		12月	99.5	35.6	39.7
		3年　1月	72.6	33.0	40.1
		2月	74.4	27.5	38.9
		3月	59.9	36.1	38.9
		4月	69.8	36.1	38.3
		5月	72.1	35.9	38.7
		6月	77.6	35.9	39.1
		7月	70.7	35.3	38.2
		8月	54.4	35.8	38.6
		9月	67.5	36.1	38.6
		10月	60.7	35.6	38.3
		11月	65.9	35.8	39.1
		12月	87.5	35.4	39.7
		4年　1月	83.4	32.4	39.8
		2月	64.9	35.3	39.7
		3月	68.2	35.2	38.8
		4月	59.5	35.6	38.4
		5月	57.4	35.6	37.8
		6月	56.2	36.0	38.7
		7月	72.5	35.7	38.8
		8月	64.3	35.3	38.6
		9月	63.6	35.7	39.0
		10月	64.8	36.8	39.6
		期　間	99.5	27.5	38.9

（注）測定位置：地上1.8m

単位：nGy／h

平均値 ＋ 3×標準偏差	平均値 ＋3×標準偏差 を超えた数（%）	原因	
		降雨雪	その他
46.5	95（2.2）	95	0
43.9	101（2.3）	101	0
45.7	110（2.6）	110	0
47.4	158（3.5）	158	0
52.7	102（2.4）	102	0
56.3	74（1.7）	74	0
54.9	88（2.0）	88	0
55.3	40（1.0）	40	0
49.4	154（3.4）	154	0
46.1	106（2.5）	106	0
48.1	106（2.4）	106	0
51.3	115（2.7）	115	0
49.8	135（3.0）	135	0
43.9	70（1.6）	70	0
46.7	73（1.7）	73	0
46.7	143（3.2）	143	0
51.0	132（3.1）	132	0
56.9	99（2.2）	99	0
56.3	101（2.3）	101	0
53.3	109（2.6）	109	0
51.6	117（2.6）	117	0
48.8	147（3.4）	147	0
44.4	128（2.9）	128	0
44.3	107（2.5）	107	0
50.4	124（2.8）	124	0
46.6	119（2.7）	119	0
46.1	116（2.7）	116	0
48.7	143（3.2）	143	0
50.1	3,118（2.5）	3,118	0

(1) 線量率（つづき）

石川県実施分

測定地点		測定年月	最高値	最低値	平均値
富来町	⑤ 熊野局	2年 7月	64.4	38.0	41.1
		8月	55.3	39.5	42.3
		9月	60.4	39.1	41.7
		10月	59.6	38.5	41.2
		11月	74.1	38.5	41.7
		12月	91.8	38.6	43.2
		3年 1月	65.0	35.7	41.9
		2月	79.3	29.6	40.4
		3月	58.6	37.7	41.0
		4月	67.3	37.5	39.9
		5月	67.9	37.4	40.1
		6月	67.9	36.5	40.6
		7月	69.5	36.2	40.5
		8月	56.8	38.3	40.9
		9月	65.1	38.3	40.8
		10月	59.0	38.0	40.5
		11月	63.6	38.2	41.4
		12月	91.4	37.4	41.6
		4年 1月	77.2	34.1	41.4
		2月	62.8	37.4	41.4
		3月	60.5	35.5	40.6
		4月	58.5	37.1	40.0
		5月	54.4	37.0	39.1
		6月	63.3	37.5	39.9
		7月	71.9	37.3	40.6
		8月	62.5	38.0	40.5
		9月	56.5	38.1	40.6
		10月	57.3	37.9	40.4
		期間	91.8	29.6	40.9

（注）測定位置：地上1．8m
熊野局の原因（降雨雪）：福浦局の感雨・積雪深をもととした。

単位：nGy／h

平均値 ＋ 3×標準偏差	平均値 ＋3×標準偏差 を超えた数（%）	原因	
		降雨雪	その他
47.7	103（2.3）	103	0
46.4	95（2.1）	95	0
47.7	107（2.5）	107	0
49.0	162（3.6）	162	0
53.2	98（2.3）	98	0
57.9	67（1.5）	67	0
54.0	93（2.1）	93	0
56.2	30（0.7）	30	0
49.9	124（2.8）	124	0
46.4	85（2.0）	85	0
47.9	109（2.4）	109	0
50.1	122（2.8）	122	0
51.5	130（2.9）	130	0
45.6	68（1.5）	68	0
47.9	77（1.8）	77	0
48.2	153（3.4）	153	0
51.7	128（3.0）	128	0
56.4	88（2.0）	88	0
55.7	94（2.1）	94	0
53.5	118（2.8）	118	0
50.7	132（3.0）	132	0
48.8	154（3.6）	154	0
44.7	138（3.1）	138	0
45.4	89（2.1）	89	0
51.4	134（3.0）	134	0
47.5	130（2.9）	130	0
46.1	120（2.8）	120	0
47.1	139（3.1）	139	0
50.8	2,893（2.4）	2,893	0

(1) 線量率（つづき）

石川県実施分

測定地点		測定年月	最高値	最低値	平均値
辰口町	⑥ 辰口局（比較対照局）	2年 7月	71.0	38.8	41.9
		8月	53.3	39.0	42.0
		9月	63.3	38.9	42.0
		10月	63.4	38.4	41.8
		11月	88.4	38.8	42.4
		12月	114.4	38.3	42.6
		3年 1月	73.5	32.5	41.7
		2月	69.7	30.5	40.8
		3月	65.2	37.6	41.6
		4月	63.1	38.0	40.9
		5月	63.4	38.1	40.9
		6月	67.6	38.1	41.9
		7月	67.3	37.9	40.8
		8月	58.9	38.0	41.5
		9月	57.8	38.2	41.6
		10月	74.0	34.3	41.9
		11月	77.5	38.3	42.7
		12月	85.7	37.5	42.7
		4年 1月	95.0	32.4	42.4
		2月	64.7	35.2	41.6
		3月	58.4	38.5	42.1
		4月	60.7	38.3	41.4
		5月	62.3	38.2	40.7
		6月	57.7	38.6	41.4
		7月	70.9	38.8	41.7
		8月	54.1	39.0	42.0
		9月	60.4	39.3	42.1
		10月	88.2	38.0	42.3
		期間	114.4	30.5	41.8

（注）測定位置：鉄筋コンクリート建物屋上

単位：ｎＧｙ／ｈ

平均値 ＋ ３×標準偏差	平均値 ＋３×標準偏差 を超えた数（％）	原因	
		降雨雪	その他
５０．３	９２（２．１）		
４６．５	４６（１．０）		
４９．３	９６（２．２）		
５０．９	１４１（３．２）		
５８．４	９５（２．２）		
６０．８	９２（２．１）		
５７．０	８１（１．８）		
５６．６	７８（２．０）		
５１．９	９６（２．２）		
４９．１	１０３（２．４）		
４８．３	９７（２．２）		
５４．４	１５４（３．６）		
５０．２	１０６（２．４）		
４８．０	５３（１．２）		
４７．３	６５（１．５）	感雨の測定なし	
５１．０	１０１（２．３）		
５５．８	１２７（３．０）		
５７．８	９９（２．２）		
６２．９	９８（２．２）		
５２．８	７８（１．９）		
５２．９	１３０（２．９）		
５１．０	１６４（３．８）		
４８．４	１０７（２．４）		
４７．９	１００（２．３）		
５０．２	１２９（２．９）		
４７．３	７５（１．７）		
４７．９	８６（２．０）		
５４．６	９７（２．２）		
５３．０	2,733（２．２）		

(1) 線量率（つづき）

北陸電力実施分

測定地点	測定年月	最高値	最低値	平均値
① ＭＰ－１	２年　７月	６０．３	２３．６	２６．６
	８月	４５．６	２４．２	２７．７
	９月	５０．０	２３．０	２７．５
	１０月	５１．３	２３．６	２７．４
	１１月	６１．１	２４．７	２８．２
	１２月	９４．５	２３．７	２８．２
	３年　１月	６７．０	２２．１	２８．７
	２月	７７．１	２２．１	２８．０
	３月	５０．０	２３．０	２６．９
	４月	５０．７	２３．８	２６．３
	５月	６０．０	２３．８	２６．７
	６月	６５．５	２３．４	２７．０
	７月	５８．４	２２．８	２６．１
	８月	４４．６	２４．１	２７．７
	９月	５８．２	２４．５	２７．８
	１０月	４９．６	２３．９	２７．２
	１１月	５４．４	２４．１	２７．８
	１２月	１０３	２３．１	２８．３
	４年　１月	７２．１	２２．０	２８．０
	２月	６０．０	２２．０	２７．７
	３月	５２．５	２２．３	２６．６
	４月	５０．４	２３．２	２６．４
	５月	４６．５	２３．６	２６．４
	６月	４５．０	２４．７	２７．６
	７月	６６．５	２３．９	２７．６
	８月	５６．５	２４．４	２７．８
	９月	４８．１	２４．１	２８．１
	１０月	５０．２	２４．５	２８．０
	期　間	１０３	２２．０	２７．４

（注）測定位置：鉄骨造建物屋上（地上約４ｍ）

単位：ｎＧｙ／ｈ

平均値 ＋ ３×標準偏差	平均値 ＋３×標準偏差 を超えた数（％）	原因	
		降雨雪	その他
３５．１	９１（２．０）	９１	0
３３．０	１０７（２．４）	１０７	0
３４．６	１０１（２．４）	１０１	0
３７．１	１４３（３．２）	１４３	0
４０．７	１２４（２．９）	１２４	0
４６．４	７６（１．７）	７６	0
４４．５	９０（２．０）	９０	0
４３．２	７７（２．０）	７７	0
３７．６	１２３（２．８）	１２３	0
３３．７	１１４（２．６）	１１４	0
３６．３	１０７（２．４）	１０７	0
３９．４	１０６（２．５）	１０６	0
３８．６	１１３（２．５）	１１３	0
３２．８	７１（１．６）	７１	0
３６．４	６８（１．６）	６８	0
３５．８	１３２（３．０）	１３２	0
３９．９	１３０（３．０）	１３０	0
４９．２	７６（１．７）	７６	0
４４．３	１３３（３．０）	１３３	0
４３．１	１２１（３．０）	１２１	0
３９．７	１４１（３．２）	１４１	0
３７．４	１３６（３．２）	１３６	0
３３．７	１３９（３．１）	１３９	0
３３．３	１２２（２．８）	１２２	0
３９．５	１１６（２．６）	１１６	0
３６．４	１２２（２．７）	１２２	0
３４．７	１２０（２．８）	１２０	0
３５．８	１２３（２．８）	１２３	0
３９．１	2,932（２．４）	2,932	0

(1) 線量率（つづき）

北陸電力実施分

測　定　地　点	測定年月	最高値	最低値	平均値
② ＭＰ－２	２年　７月	６９．０	２８．４	３２．０
	８月	５２．７	２９．６	３３．９
	９月	６３．０	２９．４	３３．９
	１０月	５７．８	２８．５	３３．２
	１１月	７７．２	２９．８	３３．９
	１２月	１１５	２８．５	３３．９
	３年　１月	７６．２	２５．４	３４．１
	２月	８４．８	２２．９	３３．０
	３月	６０．０	２６．０	３１．０
	４月	６５．７	２７．２	３０．７
	５月	７０．４	２８．０	３１．６
	６月	７４．２	２７．７	３２．７
	７月	６４．３	２５．０	３０．９
	８月	５１．７	２８．８	３２．５
	９月	６７．５	２９．０	３３．１
	１０月	５６．９	２８．６	３２．３
	１１月	６１．９	２８．４	３２．９
	１２月	１０８	２７．０	３２．７
	４年　１月	７９．３	２５．５	３２．７
	２月	６５．８	２６．０	３２．３
	３月	５９．６	２６．１	３１．５
	４月	５７．０	２５．６	３１．６
	５月	５２．８	２８．３	３１．４
	６月	５２．４	２８．５	３３．０
	７月	７３．７	２８．７	３３．１
	８月	６５．１	２９．９	３３．７
	９月	５７．０	２９．１	３４．０
	１０月	６０．４	３０．６	３４．１
	期　間	１１５	２２．９	３２．７

（注）測定位置：鉄骨造建物屋上（地上約４ｍ）

単位：nGy／h

平均値 ＋ 3×標準偏差	平均値 ＋3×標準偏差 を超えた数（%）	原因	
		降雨雪	その他
41.5	91（2.0）	91	0
40.4	103（2.3）	103	0
42.6	108（2.5）	108	0
44.2	151（3.4）	151	0
49.5	117（2.7）	117	0
55.4	67（1.5）	67	0
52.5	76（1.7）	76	0
51.1	54（1.4）	54	0
43.5	143（3.2）	143	0
39.7	101（2.3）	101	0
42.4	106（2.4）	106	0
46.4	117（2.7）	117	0
44.1	127（2.9）	127	0
38.3	65（1.5）	65	0
42.9	70（1.6）	70	0
42.2	140（3.1）	140	0
46.9	136（3.2）	136	0
54.6	88（2.0）	88	0
52.0	118（2.6）	118	0
49.3	126（3.0）	126	0
46.5	121（2.8）	121	0
43.8	139（3.3）	139	0
39.3	129（2.9）	129	0
39.6	112（2.6）	112	0
46.5	121（2.7）	121	0
43.1	126（2.8）	126	0
41.3	125（2.9）	125	0
43.3	131（2.9）	131	0
46.2	2,898（2.4）	2,898	0

(1) 線量率（つづき）

北陸電力実施分

測　定　地　点	測定年月	最高値	最低値	平均値
③ ＭＰ－３	2年　7月	6 1. 6	2 4. 1	2 7. 2
	8月	4 7. 5	2 5. 9	2 8. 4
	9月	5 5. 0	2 5. 0	2 8. 1
	1 0月	5 1. 6	2 4. 8	2 8. 1
	1 1月	7 2. 9	2 5. 0	2 8. 8
	1 2月	1 0 4	2 4. 0	2 9. 0
	3年　1月	6 8. 0	2 1. 8	2 9. 0
	2月	7 2. 7	1 7. 8	2 7. 7
	3月	4 8. 3	2 3. 9	2 7. 7
	4月	6 5. 1	2 4. 5	2 7. 2
	5月	6 5. 8	2 4. 2	2 7. 7
	6月	7 1. 7	2 4. 1	2 8. 5
	7月	6 4. 5	2 4. 2	2 7. 6
	8月	4 7. 9	2 4. 4	2 7. 7
	9月	6 2. 4	2 5. 3	2 8. 4
	1 0月	5 2. 1	2 4. 7	2 8. 1
	1 1月	5 7. 8	2 4. 2	2 8. 9
	1 2月	1 0 6	2 2. 4	2 9. 1
	4年　1月	7 3. 2	2 1. 8	2 9. 3
	2月	6 1. 8	2 3. 3	2 8. 9
	3月	5 5. 3	2 3. 0	2 8. 3
	4月	5 2. 5	2 4. 5	2 8. 1
	5月	4 9. 1	2 4. 0	2 7. 6
	6月	5 1. 1	2 5. 7	2 8. 6
	7月	7 0. 9	2 5. 5	2 9. 0
	8月	6 0. 3	2 5. 8	2 8. 9
	9月	5 4. 1	2 5. 9	2 9. 2
	1 0月	5 5. 4	2 6. 0	2 9. 5
	期　間	1 0 6	1 7. 8	2 8. 4

（注）測定位置：鉄骨造建物屋上（地上約４ｍ）

単位：ｎＧｙ／ｈ

平均値 ＋ ３×標準偏差	平均値 ＋３×標準偏差 を超えた数（%）	原因	
		降雨雪	その他
３６．４	９３（２．１）	９３	0
３４．３	１０６（２．４）	１０６	0
３６．２	９８（２．３）	９８	0
３８．３	１５６（３．５）	１５６	0
４３．８	１１６（２．７）	１１６	0
４８．９	７４（１．７）	７４	0
４５．３	７７（１．７）	７７	0
４４．６	５０（１．３）	５０	0
３９．８	１４５（３．３）	１４５	0
３６．４	９５（２．２）	９５	0
３８．５	１０２（２．３）	１０２	0
４２．１	１１８（２．７）	１１８	0
４１．２	１２２（２．７）	１２２	0
３３．４	８２（１．８）	８２	0
３８．１	７１（１．７）	７１	0
３７．７	１３２（３．０）	１３２	0
４２．４	１２９（３．０）	１２９	0
５０．５	８２（１．９）	８２	0
４８．０	１１１（２．５）	１１１	0
４５．５	１２２（２．９）	１２２	0
４３．１	１３５（３．１）	１３５	0
４０．２	１４７（３．４）	１４７	0
３５．６	１３８（３．１）	１３８	0
３５．４	１１５（２．７）	１１５	0
４２．７	１１８（２．６）	１１８	0
３８．１	１２１（２．７）	１２１	0
３６．７	１１５（２．７）	１１５	0
３８．７	１２９（２．９）	１２９	0
４１．３	3,087（２．５）	3,087	0

(1) 線量率（つづき）

北陸電力実施分

測　定　地　点	測定年月	最高値	最低値	平均値
④ＭＰ－４	２年　７月	６６．７	２８．９	３２．０
	８月	５０．０	２９．４	３３．０
	９月	５８．０	２９．０	３２．８
	１０月	５６．５	２８．７	３２．５
	１１月	６８．８	２９．５	３３．１
	１２月	１０８	２８．０	３３．３
	３年　１月	７４．４	２３．０	３３．２
	２月	７５．７	２２．０	３２．０
	３月	５０．８	２８．０	３２．５
	４月	６８．６	２９．５	３２．３
	５月	６７．１	２９．５	３２．９
	６月	７３．９	２８．２	３３．３
	７月	６６．４	２８．３	３１．７
	８月	５１．３	２８．７	３２．４
	９月	６４．４	３０．４	３３．４
	１０月	５６．１	２９．６	３２．６
	１１月	５９．３	２９．２	３３．５
	１２月	１１０	２７．２	３３．５
	４年　１月	７４．２	２６．４	３３．３
	２月	６５．１	２７．８	３３．０
	３月	６０．５	２８．４	３３．３
	４月	５６．８	３０．０	３３．８
	５月	５２．６	３０．６	３３．５
	６月	５４．９	３１．４	３４．６
	７月	７３．４	３１．２	３４．８
	８月	６５．０	３１．８	３５．０
	９月	５８．１	３１．５	３５．３
	１０月	６０．７	３２．０	３５．４
	期　間	１１０	２２．０	３３．３

（注）測定位置：鉄骨造建物屋上（地上約４ｍ）

単位：nGy／h

平均値 ＋ 3×標準偏差	平均値 ＋3×標準偏差 を超えた数（%）	原因	
		降雨雪	その他
40.6	90（2.0）	90	0
38.4	97（2.2）	97	0
40.2	98（2.3）	98	0
42.1	151（3.4）	151	0
46.7	117（2.7）	117	0
52.7	74（1.7）	74	0
49.2	77（1.7）	77	0
48.3	56（1.4）	56	0
43.6	155（3.6）	155	0
41.1	98（2.3）	98	0
43.0	104（2.4）	104	0
45.9	106（2.5）	106	0
44.3	122（2.7）	122	0
38.1	57（1.3）	57	0
42.4	79（1.8）	79	0
41.8	136（3.1）	136	0
46.4	131（3.0）	131	0
54.5	76（1.7）	76	0
51.3	114（2.6）	114	0
49.0	118（2.8）	118	0
47.6	123（2.8）	123	0
45.4	144（3.4）	144	0
41.1	141（3.2）	141	0
40.9	118（2.7）	118	0
47.7	118（2.6）	118	0
43.8	125（2.8）	125	0
42.6	123（2.9）	123	0
43.9	132（3.0）	132	0
45.8	2,872（2.3）	2,872	0

(1) 線量率（つづき）

北陸電力実施分

測定地点	測定年月	最高値	最低値	平均値
⑤ＭＰ－５	２年　７月	６４．９	２５．６	２９．０
	８月	５１．０	２６．２	２９．８
	９月	５２．７	２５．８	２９．９
	１０月	５５．０	２６．１	３０．３
	１１月	６９．８	２６．１	３０．５
	１２月	１１４	２５．７	３０．７
	３年　１月	７３．６	２２．８	３０．７
	２月	７６．７	１９．５	２９．３
	３月	５１．９	２４．７	２８．８
	４月	６５．２	２５．６	２８．４
	５月	６７．２	２５．０	２９．０
	６月	７１．６	２５．３	３０．２
	７月	６６．２	２４．６	２８．９
	８月	５１．２	２６．３	２９．４
	９月	６５．２	２６．６	３０．２
	１０月	５４．０	２４．５	３０．０
	１１月	５８．５	２５．３	３０．４
	１２月	１０６	２４．５	３０．５
	４年　１月	７１．０	２４．０	３０．５
	２月	６３．７	２３．０	２９．５
	３月	５８．５	２４．０	２８．７
	４月	５３．０	２５．３	２９．４
	５月	４９．８	２６．０	２９．１
	６月	４９．０	２６．９	３０．４
	７月	７４．９	２６．７	３０．６
	８月	６５．７	２７．４	３０．６
	９月	５４．９	２６．６	３１．３
	１０月	５８．５	２７．１	３１．８
	期　間	１１４	１９．５	２９．９

（注）測定位置：鉄骨造建物屋上（地上約４ｍ）

単位：nGy／h

平均値 ＋ 3×標準偏差	平均値 ＋3×標準偏差 を超えた数（%）	原因	
		降雨雪	その他
38.3	88（2.0）	88	0
36.6	95（2.2）	95	0
37.0	81（2.0）	81	0
41.4	153（3.4）	153	0
45.2	107（2.5）	107	0
52.0	66（1.5）	66	0
48.3	71（1.6）	71	0
46.4	55（1.4）	55	0
40.6	140（3.2）	140	0
37.5	91（2.1）	91	0
39.9	102（2.3）	102	0
43.8	108（2.5）	108	0
42.7	121（2.7）	121	0
35.0	74（1.7）	74	0
40.0	72（1.7）	72	0
40.1	117（2.6）	117	0
44.1	128（3.0）	128	0
51.9	76（1.7）	76	0
49.3	130（2.9）	130	0
46.2	120（2.9）	120	0
42.8	116（2.7）	116	0
41.2	142（3.3）	142	0
37.2	137（3.1）	137	0
36.9	113（2.6）	113	0
44.3	118（2.6）	118	0
40.6	130（2.9）	130	0
38.6	109（2.5）	109	0
41.2	125（2.8）	125	0
43.1	2,920（2.4）	2,920	0

(1) 線量率（つづき）

北陸電力実施分

測　定　地　点	測定年月	最高値	最低値	平均値
⑥ＭＰ－６	２年　７月	６６．９	２７．８	３２．７
	８月	５２．１	２９．１	３５．２
	９月	５５．０	２９．０	３５．０
	１０月	５５．６	２７．５	３４．２
	１１月	７０．６	２９．０	３４．４
	１２月	１１０	２８．３	３４．２
	３年　１月	７９．０	２６．２	３３．９
	２月	７９．０	２３．２	３２．８
	３月	５３．８	２７．５	３３．１
	４月	６３．８	３０．２	３３．９
	５月	７１．２	２８．０	３５．０
	６月	７７．１	２７．８	３６．４
	７月	７２．９	２７．６	３５．４
	８月	５５．３	３１．９	３６．４
	９月	６６．０	２９．７	３４．５
	１０月	５９．２	２８．０	３３．２
	１１月	６７．４	２７．７	３４．０
	１２月	１０４	２７．３	３４．４
	４年　１月	７２．６	２７．５	３４．１
	２月	６７．７	２６．５	３４．２
	３月	６１．０	２６．９	３３．７
	４月	５８．０	２７．４	３４．０
	５月	５４．６	２９．９	３４．７
	６月	５４．４	３０．１	３６．９
	７月	８３．７	２９．４	３６．４
	８月	６８．８	３１．５	３６．２
	９月	６１．０	３２．７	３６．８
	１０月	６１．２	２９．６	３７．０
	期　間	１１０	２３．２	３４．７

（注）測定位置：鉄骨造建物屋上（地上約４ｍ）

単位：nGy／h

平均値 ＋ 3×標準偏差	平均値 ＋3×標準偏差 を超えた数（%）	原因	
		降雨雪	その他
41.6	86（1.9）	86	0
41.3	87（2.0）	87	0
41.8	76（1.9）	76	0
44.8	148（3.3）	148	0
47.8	114（2.6）	114	0
53.1	63（1.4）	63	0
50.1	70（1.6）	70	0
48.4	52（1.3）	52	0
43.5	114（2.6）	114	0
42.1	103（2.4）	103	0
45.7	102（2.3）	102	0
50.0	100（2.3）	100	0
49.1	116（2.6）	116	0
42.3	75（1.7）	75	0
44.9	63（1.5）	63	0
43.4	125（2.8）	125	0
48.0	122（2.8）	122	0
54.6	71（1.6）	71	0
52.6	130（2.9）	130	0
51.2	118（2.9）	118	0
47.8	122（2.8）	122	0
45.8	143（3.3）	143	0
43.1	135（3.0）	135	0
43.6	105（2.4）	105	0
49.9	127（2.8）	127	0
46.3	111（2.5）	111	0
44.3	124（2.9）	124	0
46.6	125（2.8）	125	0
47.8	2,538（2.1）	2,538	0

(1) 線量率（つづき）

北陸電力実施分

測　定　地　点	測定年月	最高値	最低値	平均値
⑦ＭＰ－７	２年　７月	５８．１	２１．９	２４．９
	８月	４２．４	２１．１	２４．８
	９月	４３．８	２０．７	２４．９
	１０月	４８．１	２０．８	２５．４
	１１月	６２．６	２１．８	２６．３
	１２月	１０３	２１．７	２６．８
	３年　１月	６６．８	１９．１	２７．３
	２月	７２．２	１９．０	２６．８
	３月	４６．１	２１．０	２５．８
	４月	６１．２	２２．１	２５．２
	５月	５７．４	２１．８	２５．２
	６月	６１．２	２１．０	２６．０
	７月	６２．５	２１．７	２５．４
	８月	４４．９	２２．２	２５．４
	９月	５６．０	２２．０	２５．６
	１０月	５０．１	２２．１	２５．７
	１１月	５４．７	２２．１	２６．６
	１２月	９３．０	２２．５	２６．９
	４年　１月	７２．２	２１．５	２７．２
	２月	５９．３	２１．８	２６．８
	３月	５２．４	２１．３	２５．７
	４月	４７．６	２２．３	２５．７
	５月	４５．１	２２．３	２５．０
	６月	４０．９	２２．８	２５．５
	７月	６９．８	２２．７	２５．９
	８月	５６．０	２２．９	２５．９
	９月	４８．７	２３．０	２６．１
	１０月	５１．５	２２．０	２６．４
	期　間	１０３	１９．０	２５．９

（注）測定位置：鉄骨造建物屋上（地上約４ｍ）

単位：nGy／h

平均値 ＋ 3×標準偏差	平均値 ＋3×標準偏差 を超えた数（%）	原因	
		降雨雪	その他
33.3	91（2.0）	91	0
30.3	98（2.2）	98	0
31.2	83（2.1）	83	0
35.5	142（3.2）	142	0
39.7	104（2.4）	104	0
46.3	69（1.6）	69	0
44.3	83（1.9）	83	0
42.3	56（1.4）	56	0
37.0	137（3.2）	137	0
33.7	96（2.2）	96	0
34.7	113（2.5）	113	0
38.1	114（2.6）	114	0
37.9	112（2.5）	112	0
30.5	82（1.8）	82	0
34.3	74（1.7）	74	0
35.0	137（3.1）	137	0
40.0	128（3.0）	128	0
46.8	84（1.9）	84	0
46.5	124（2.8）	124	0
43.3	115（2.8）	115	0
39.4	118（2.7）	118	0
37.0	139（3.2）	139	0
32.2	143（3.2）	143	0
31.2	112（2.6）	112	0
37.8	117（2.6）	117	0
34.7	131（2.9）	131	0
32.9	116（2.7）	116	0
35.5	134（3.0）	134	0
38.1	2,959（2.4）	2,959	0

線量率の変動状況

平成２年度

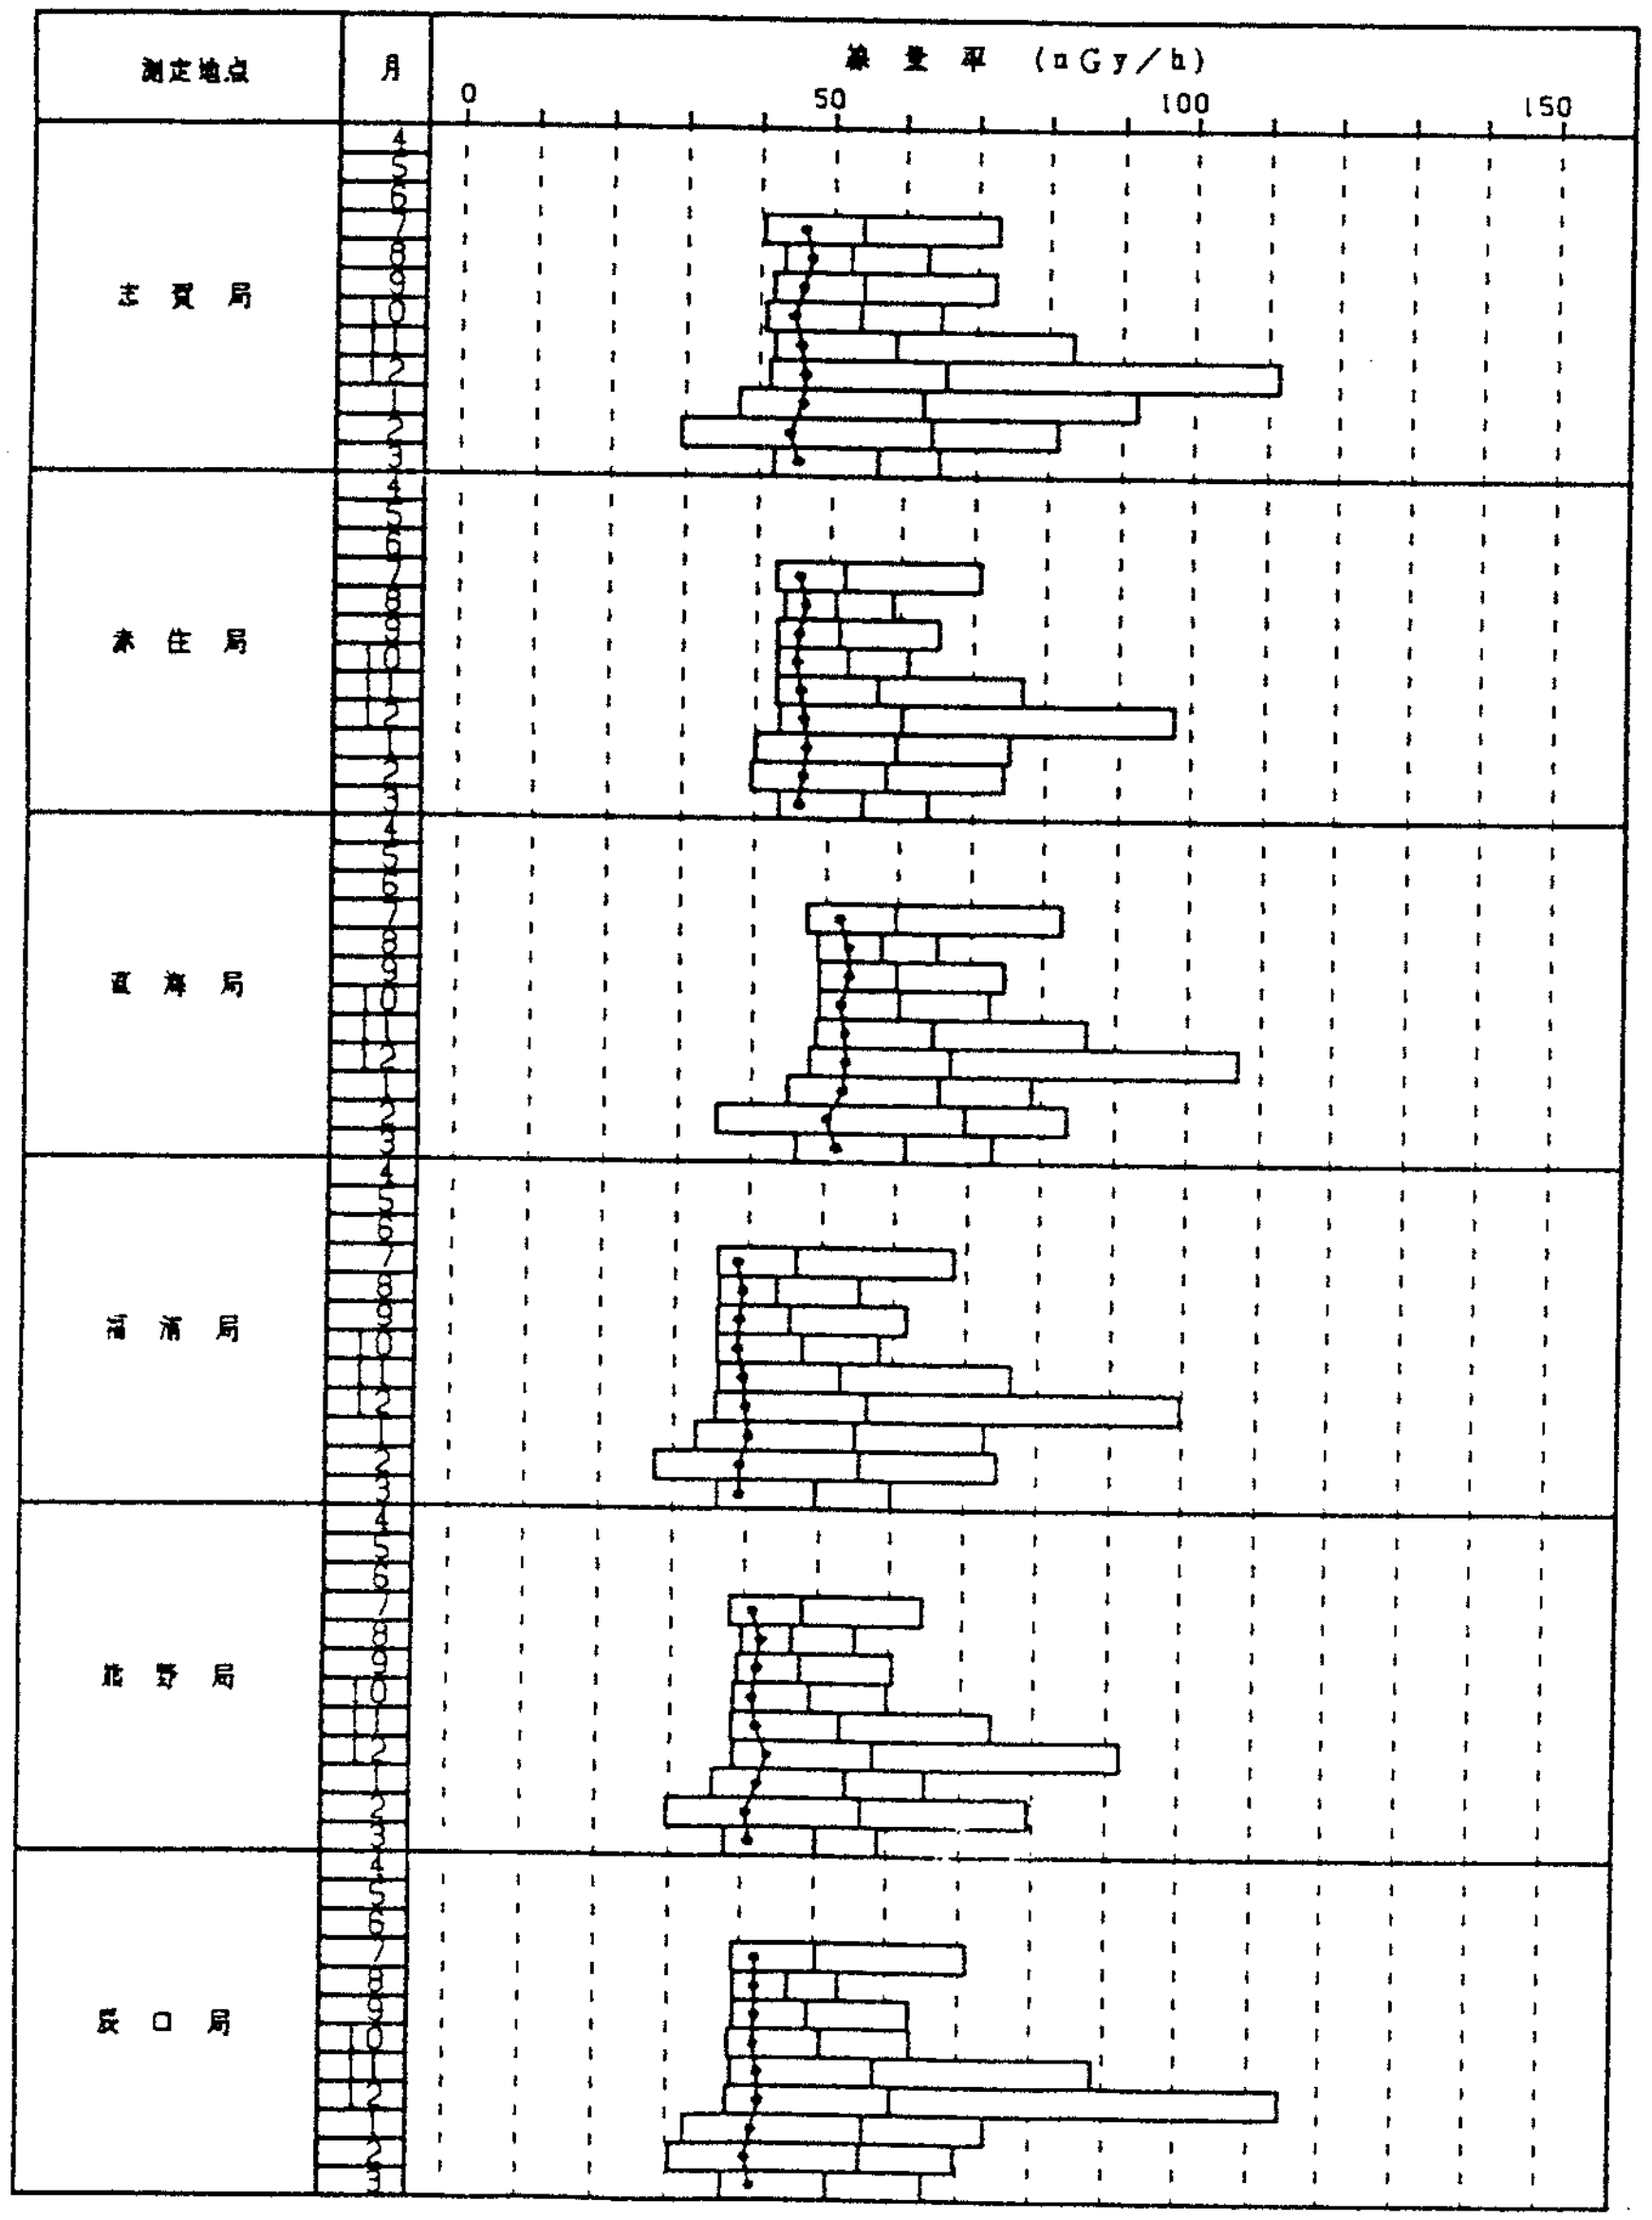

平成３年度

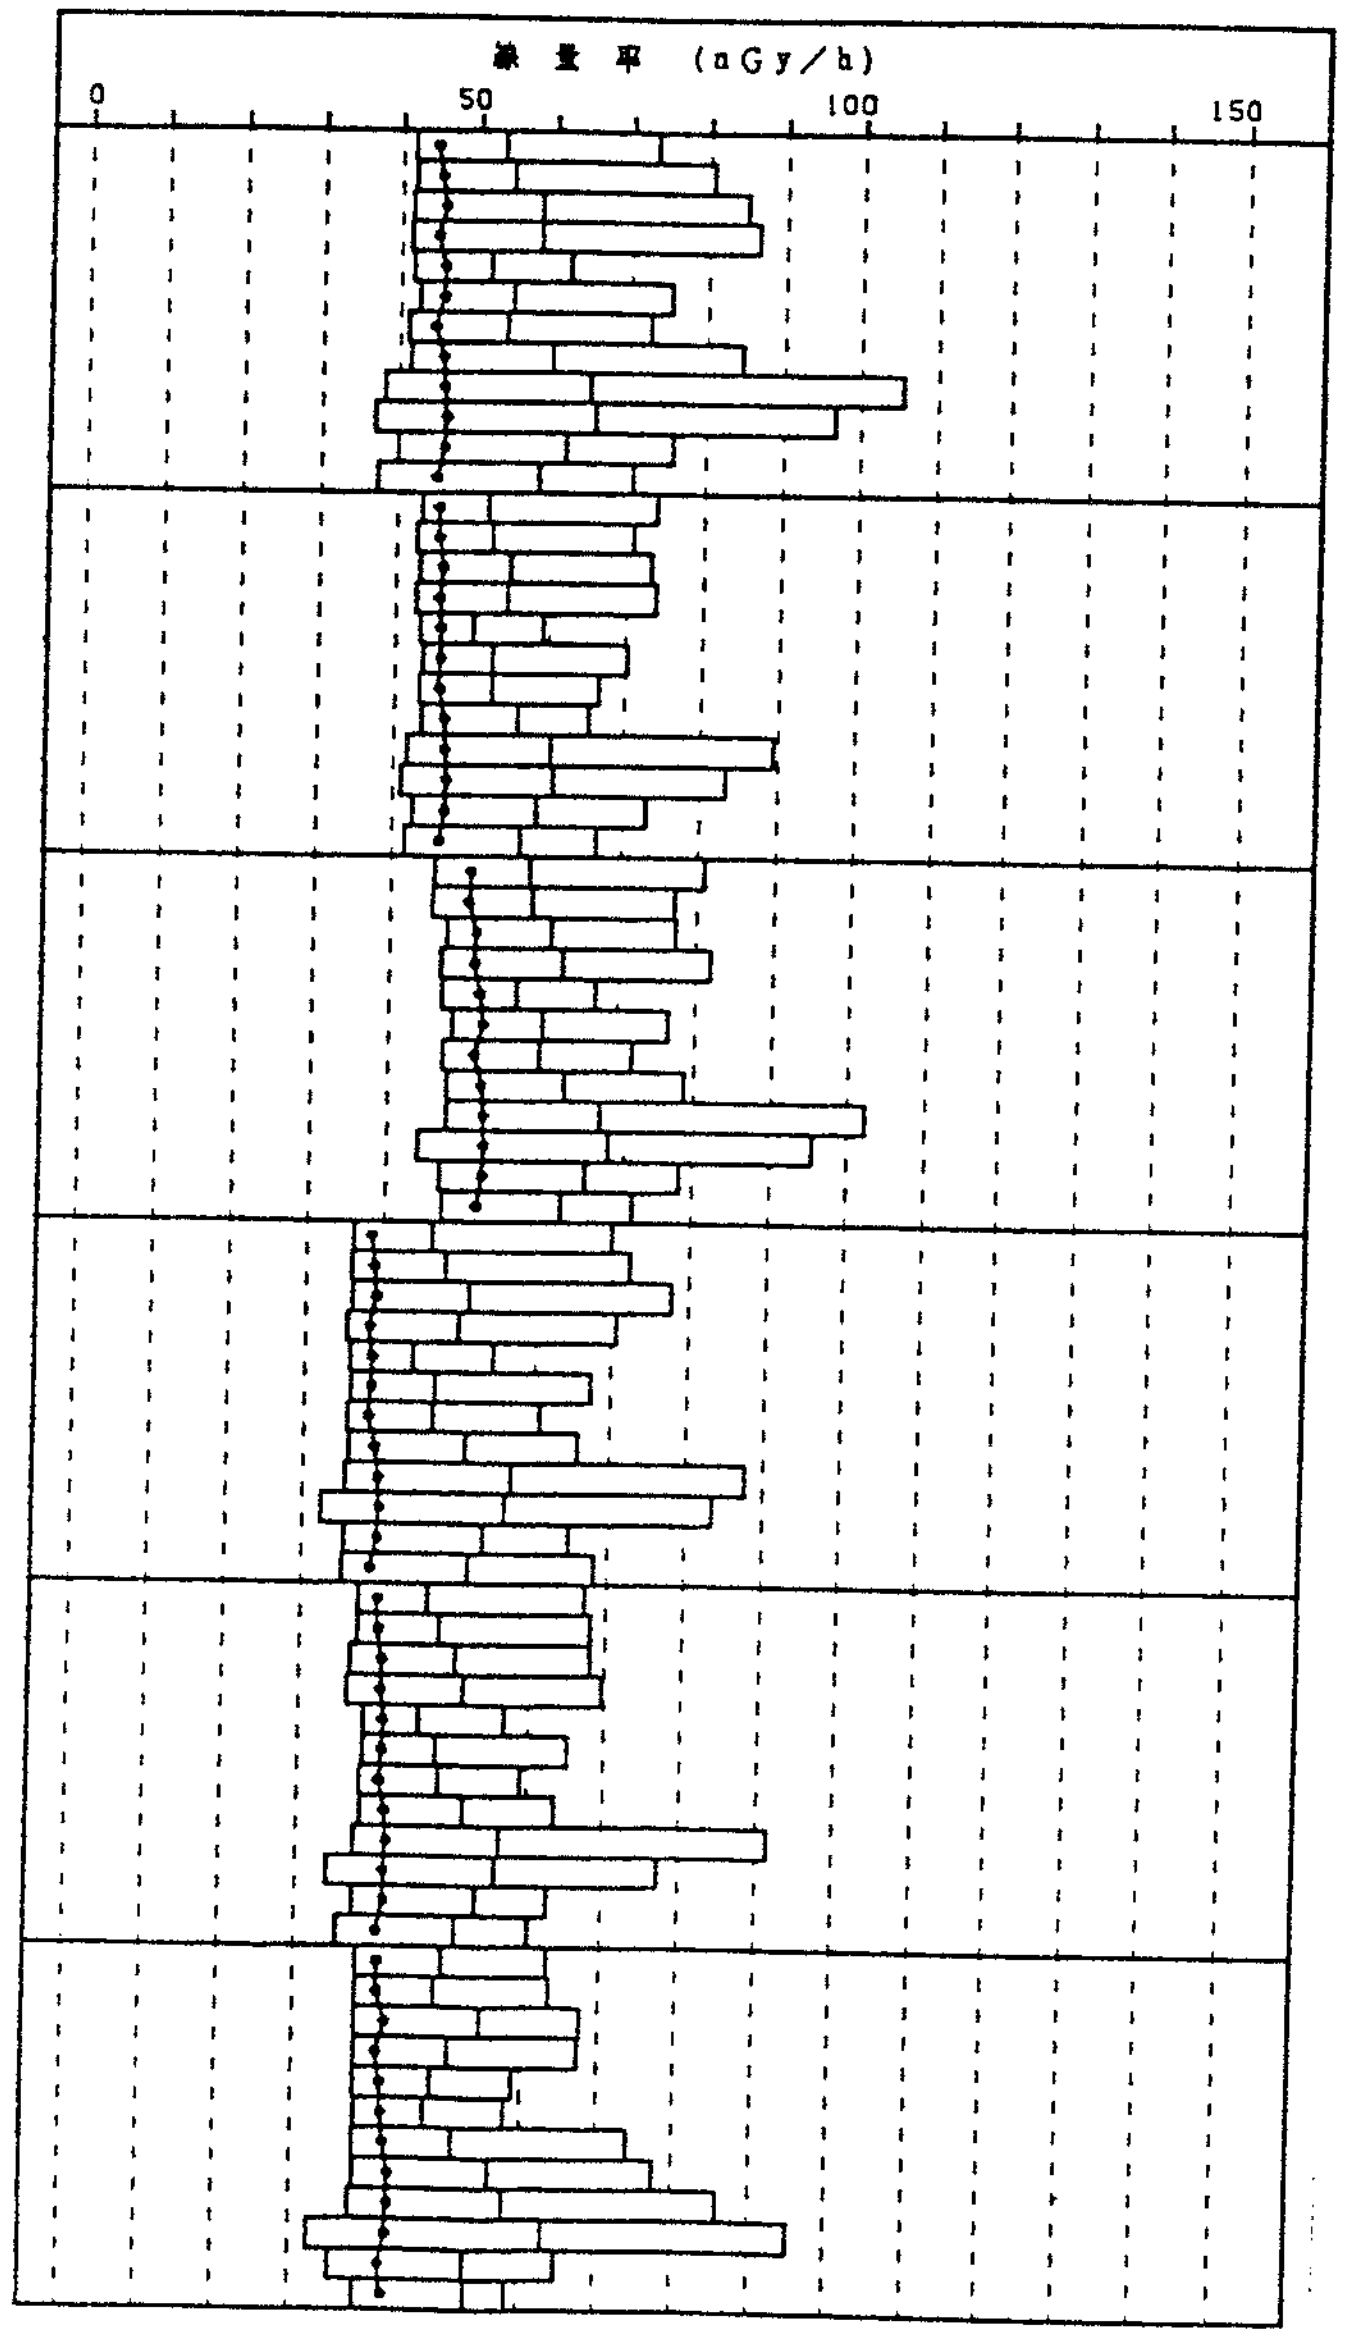

平成４年度

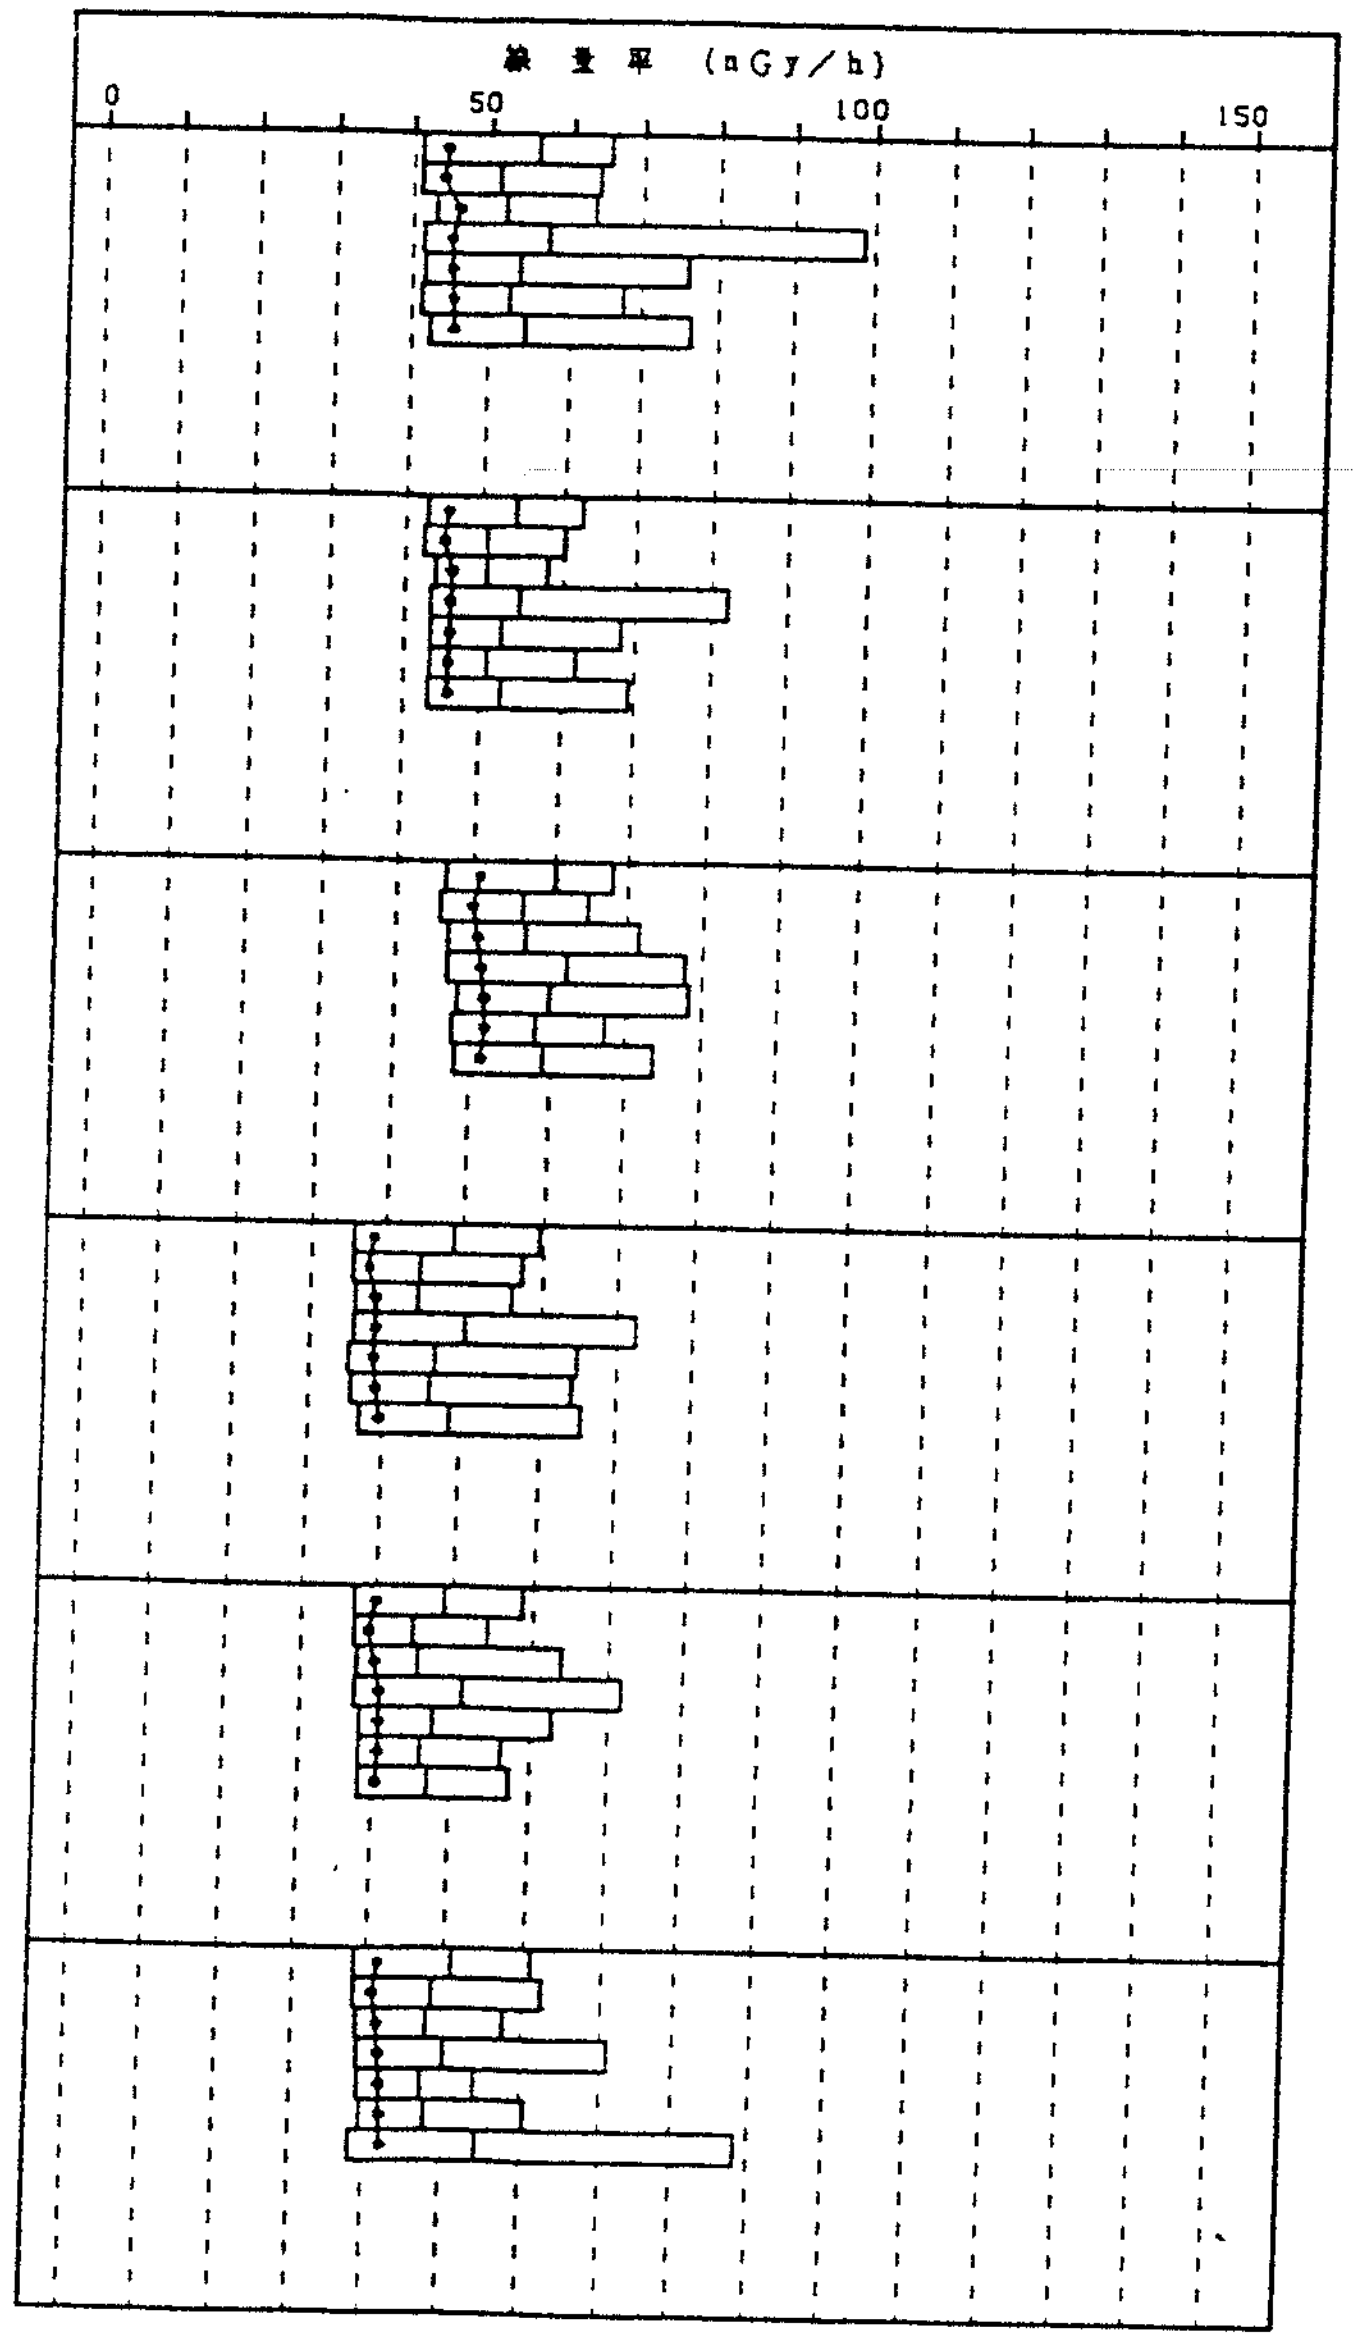



線量率の変動状況

平成２年度

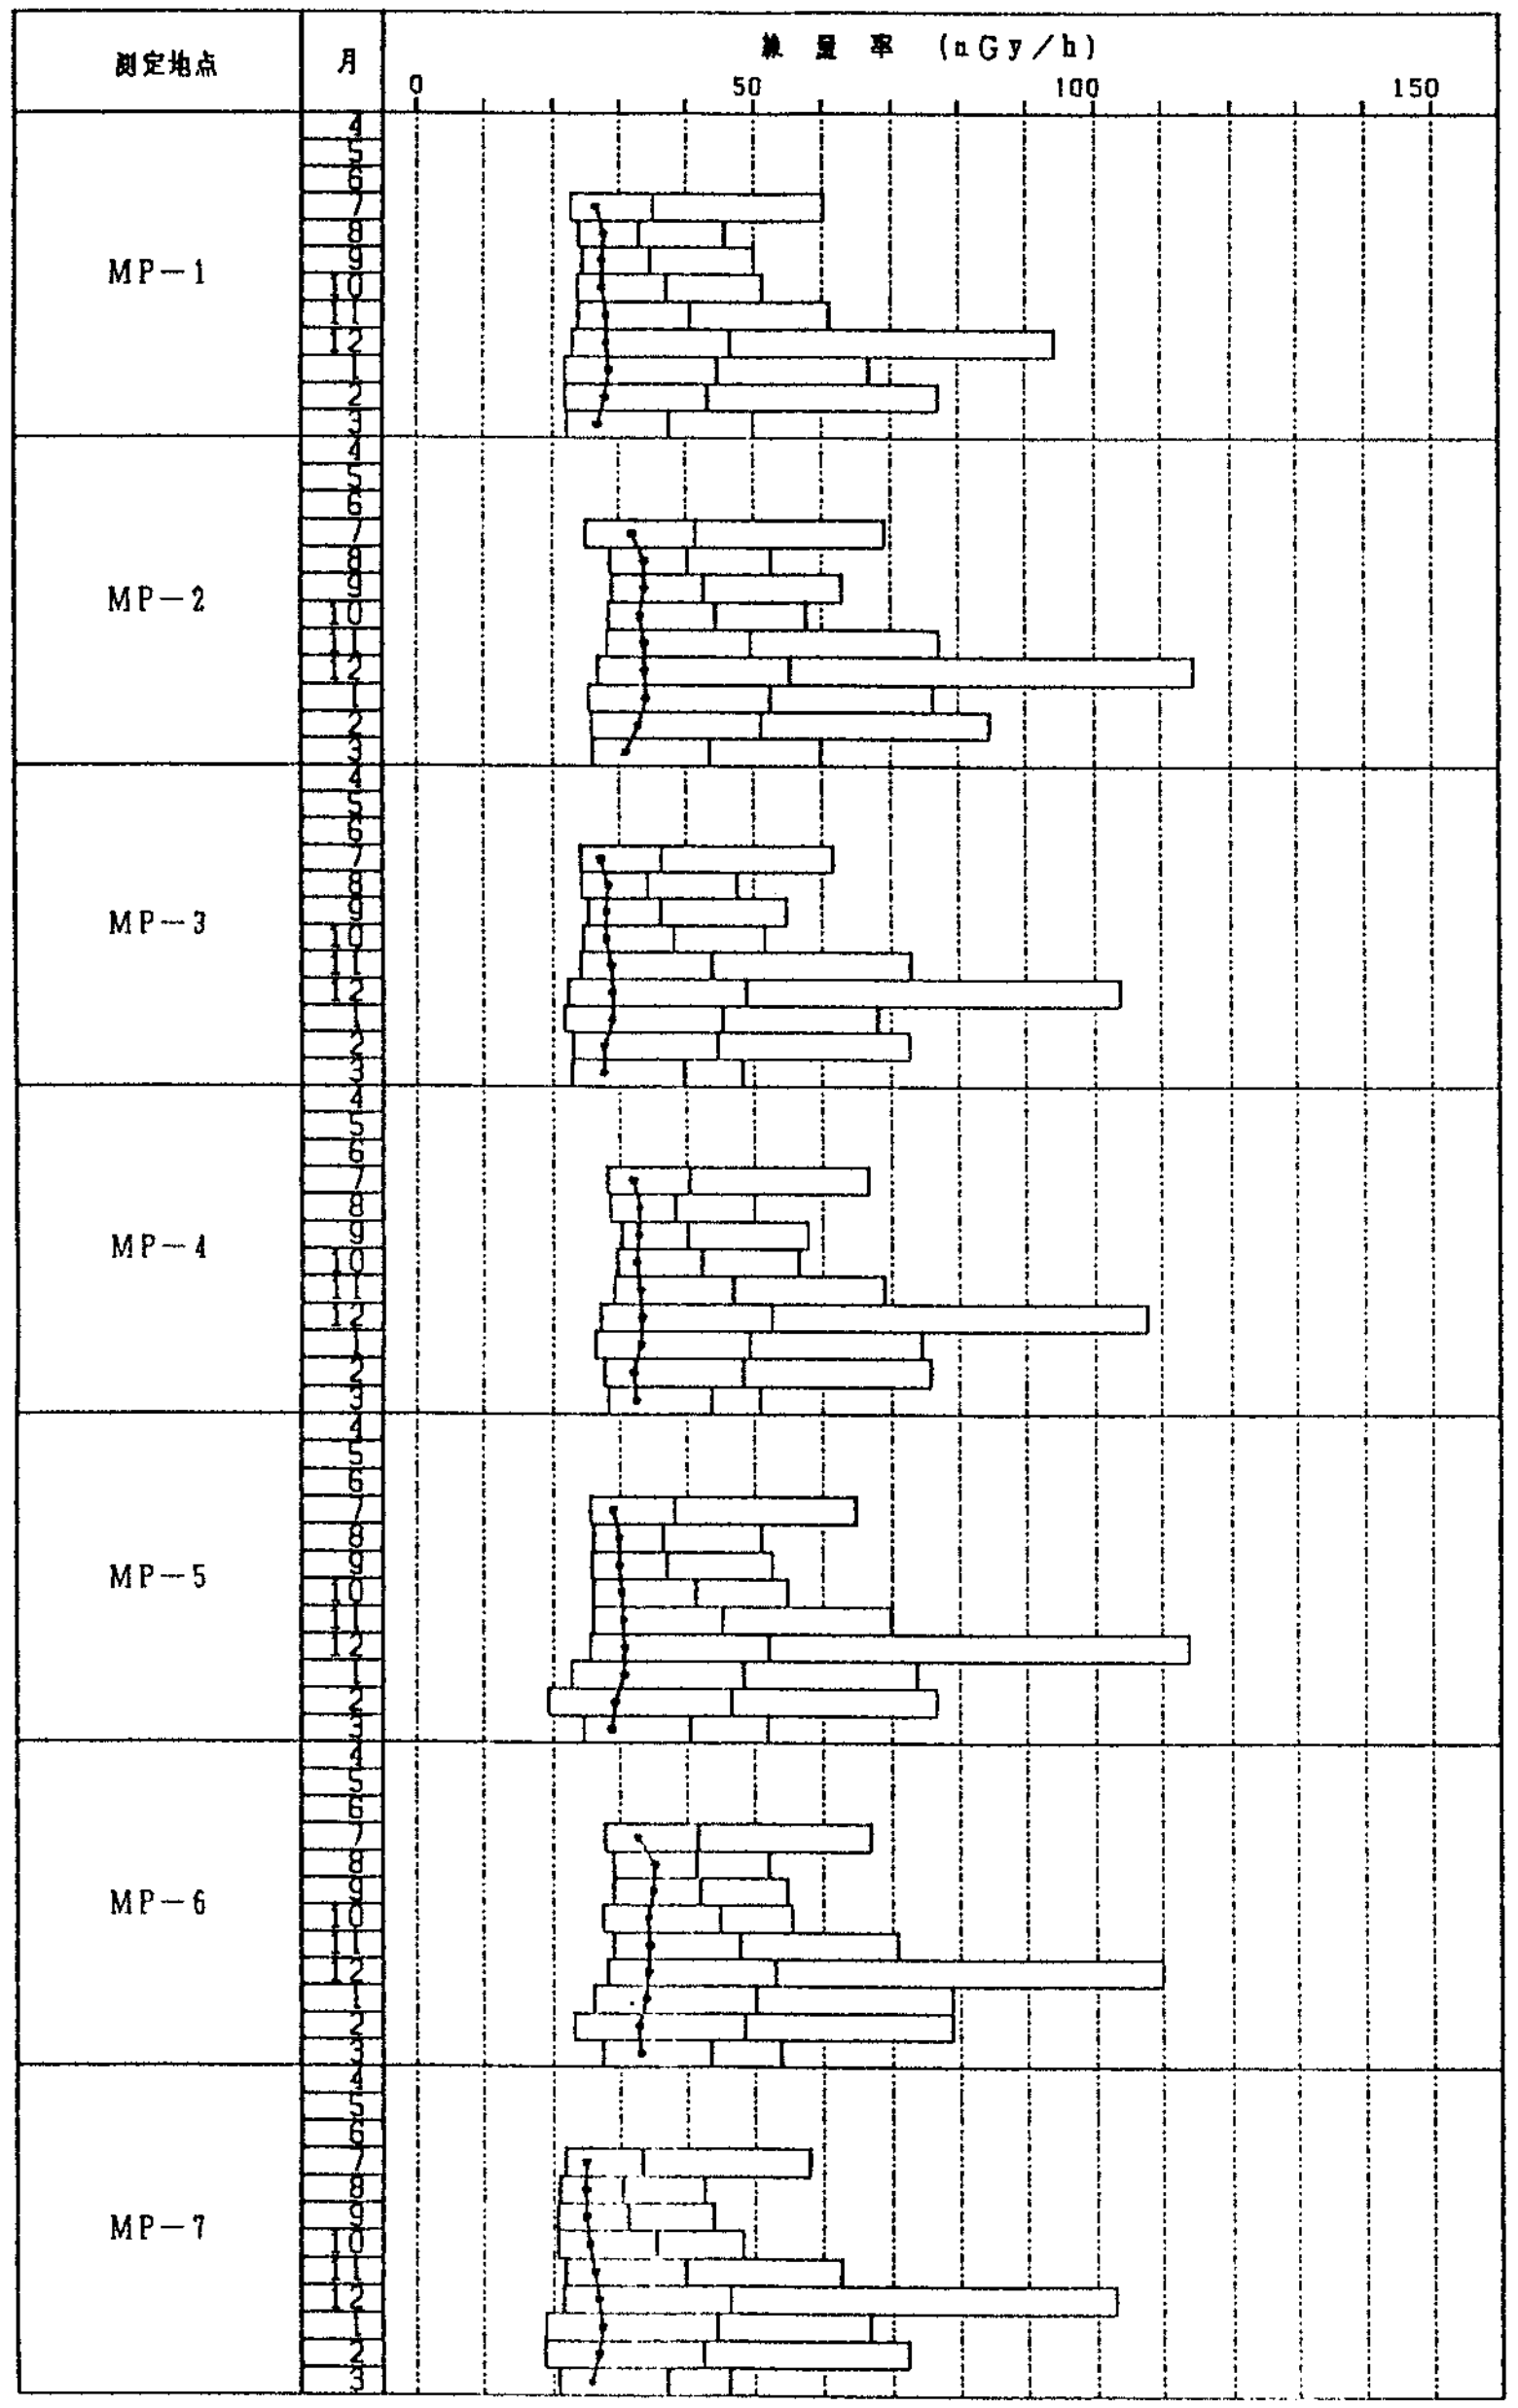

平成３年度

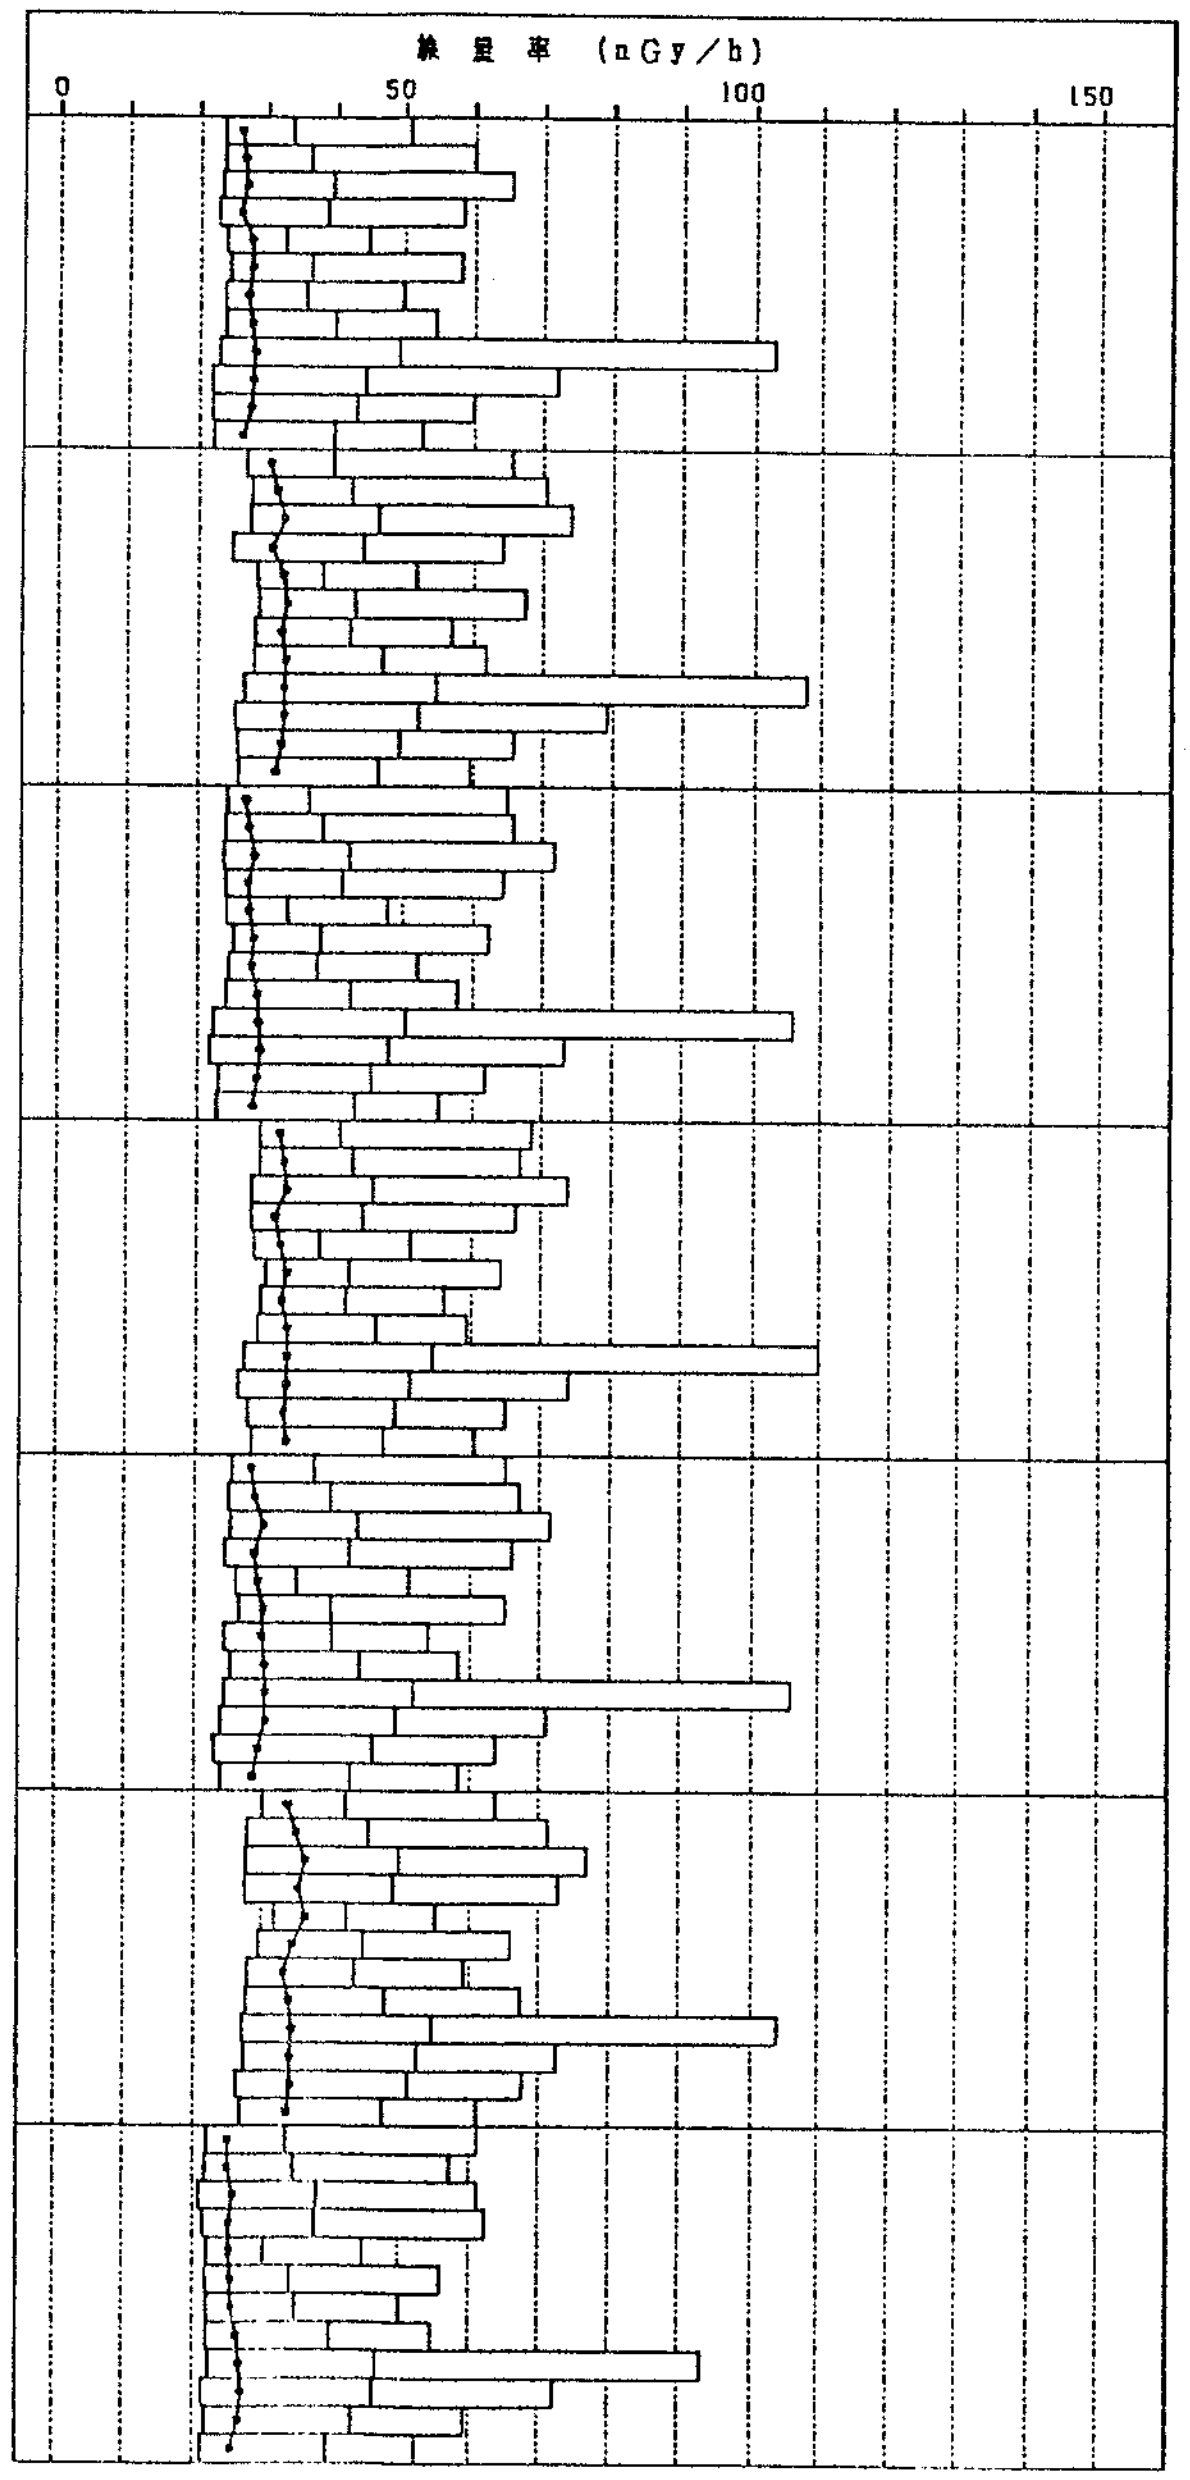

平成４年度

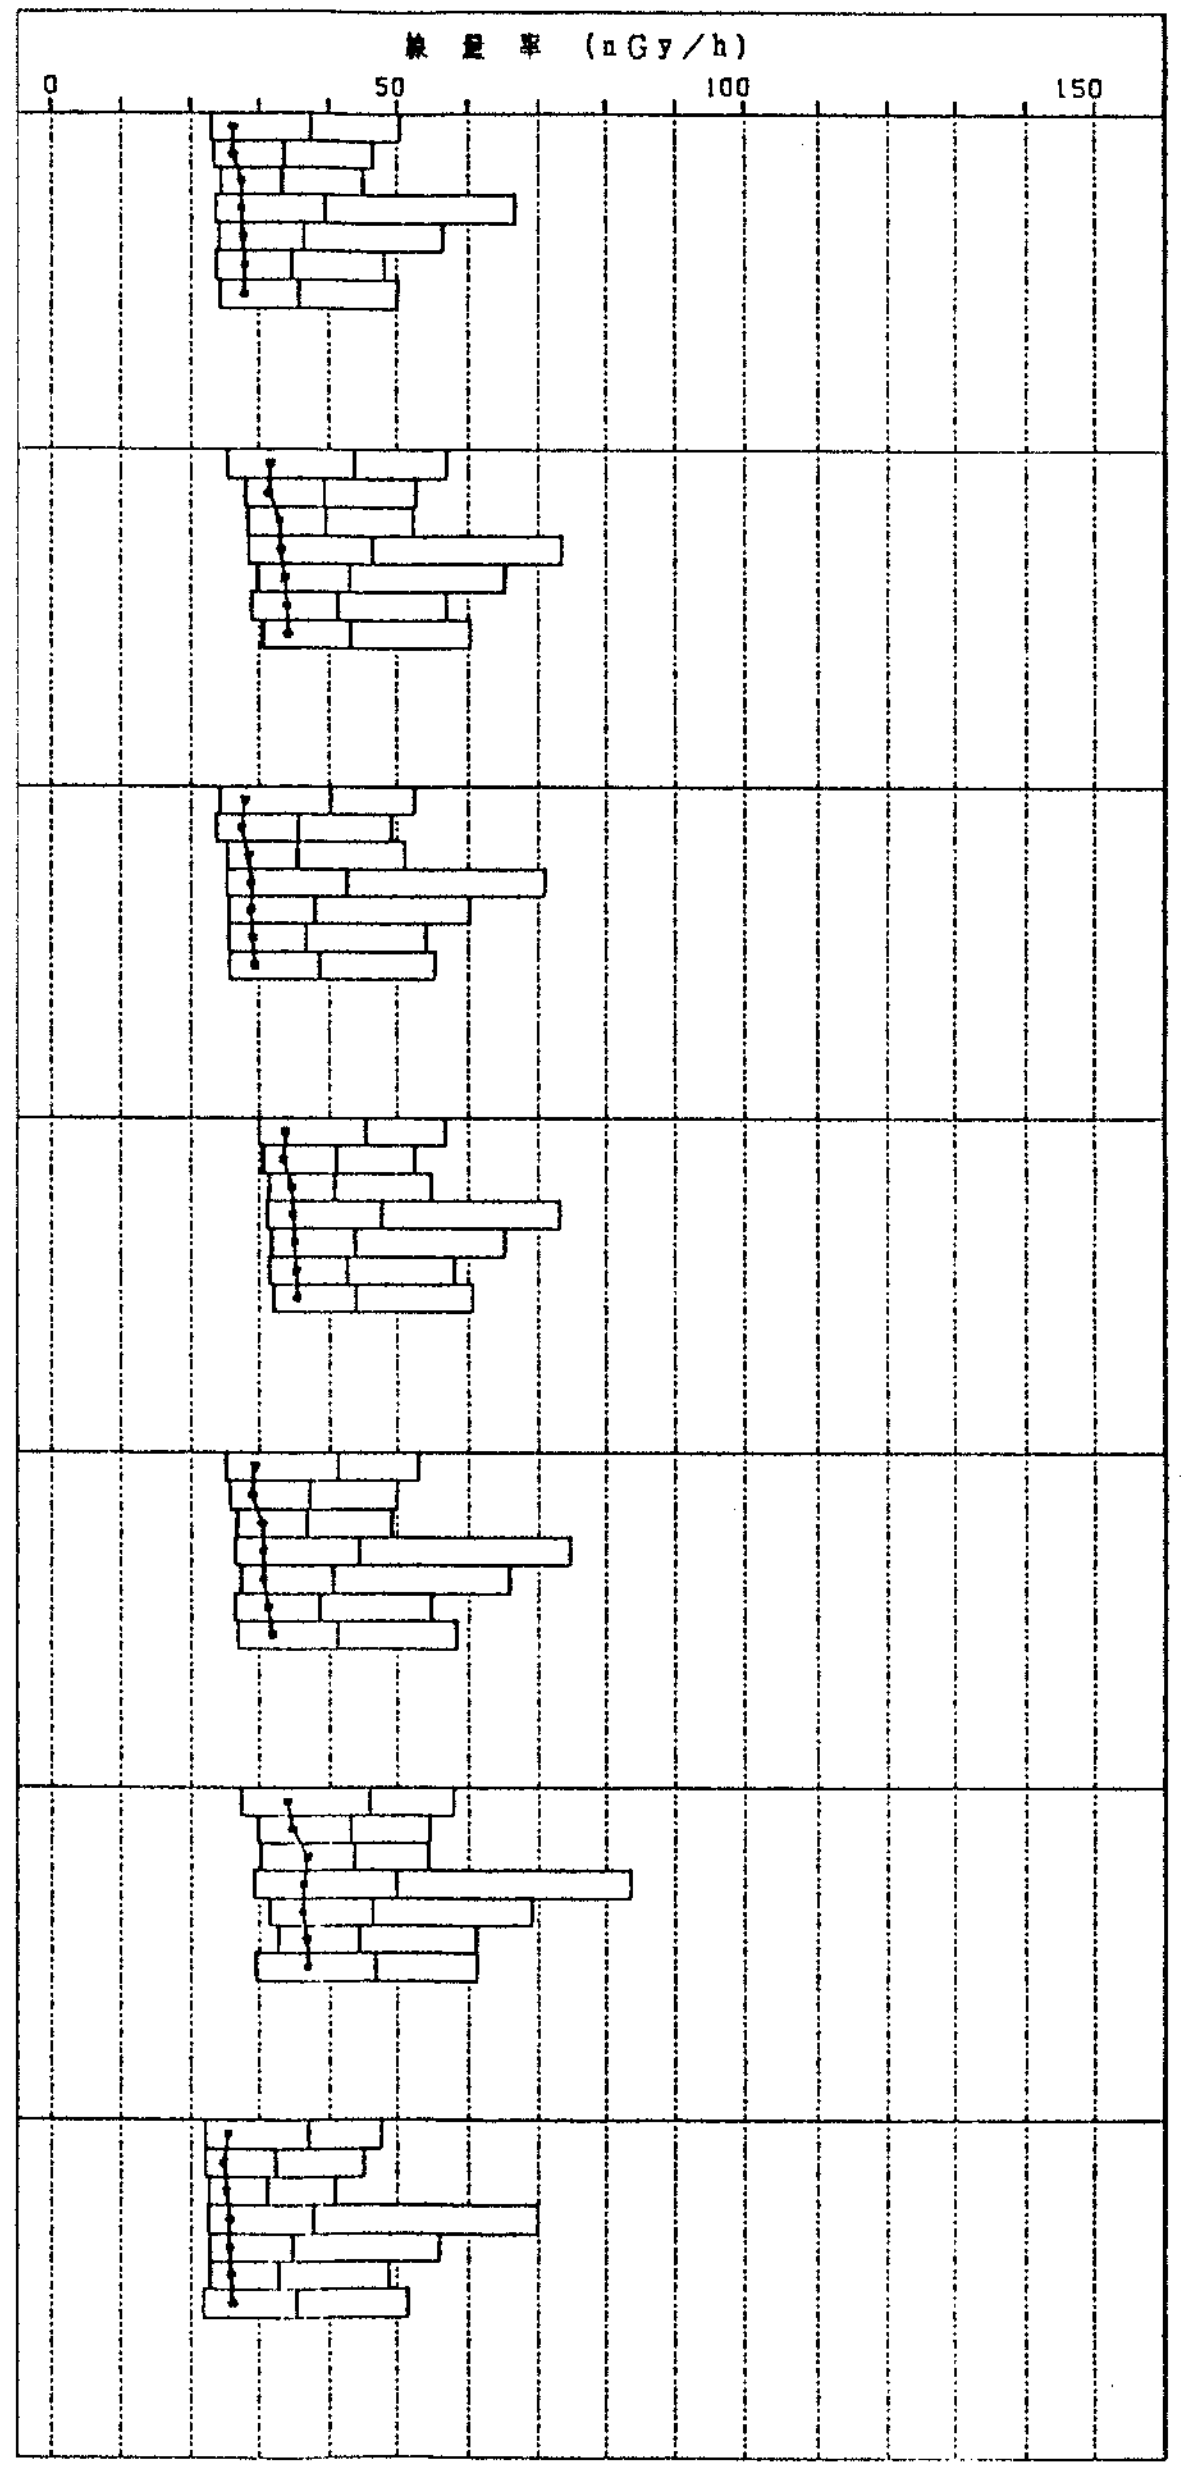



線 量 率 の 出 現 頻 度

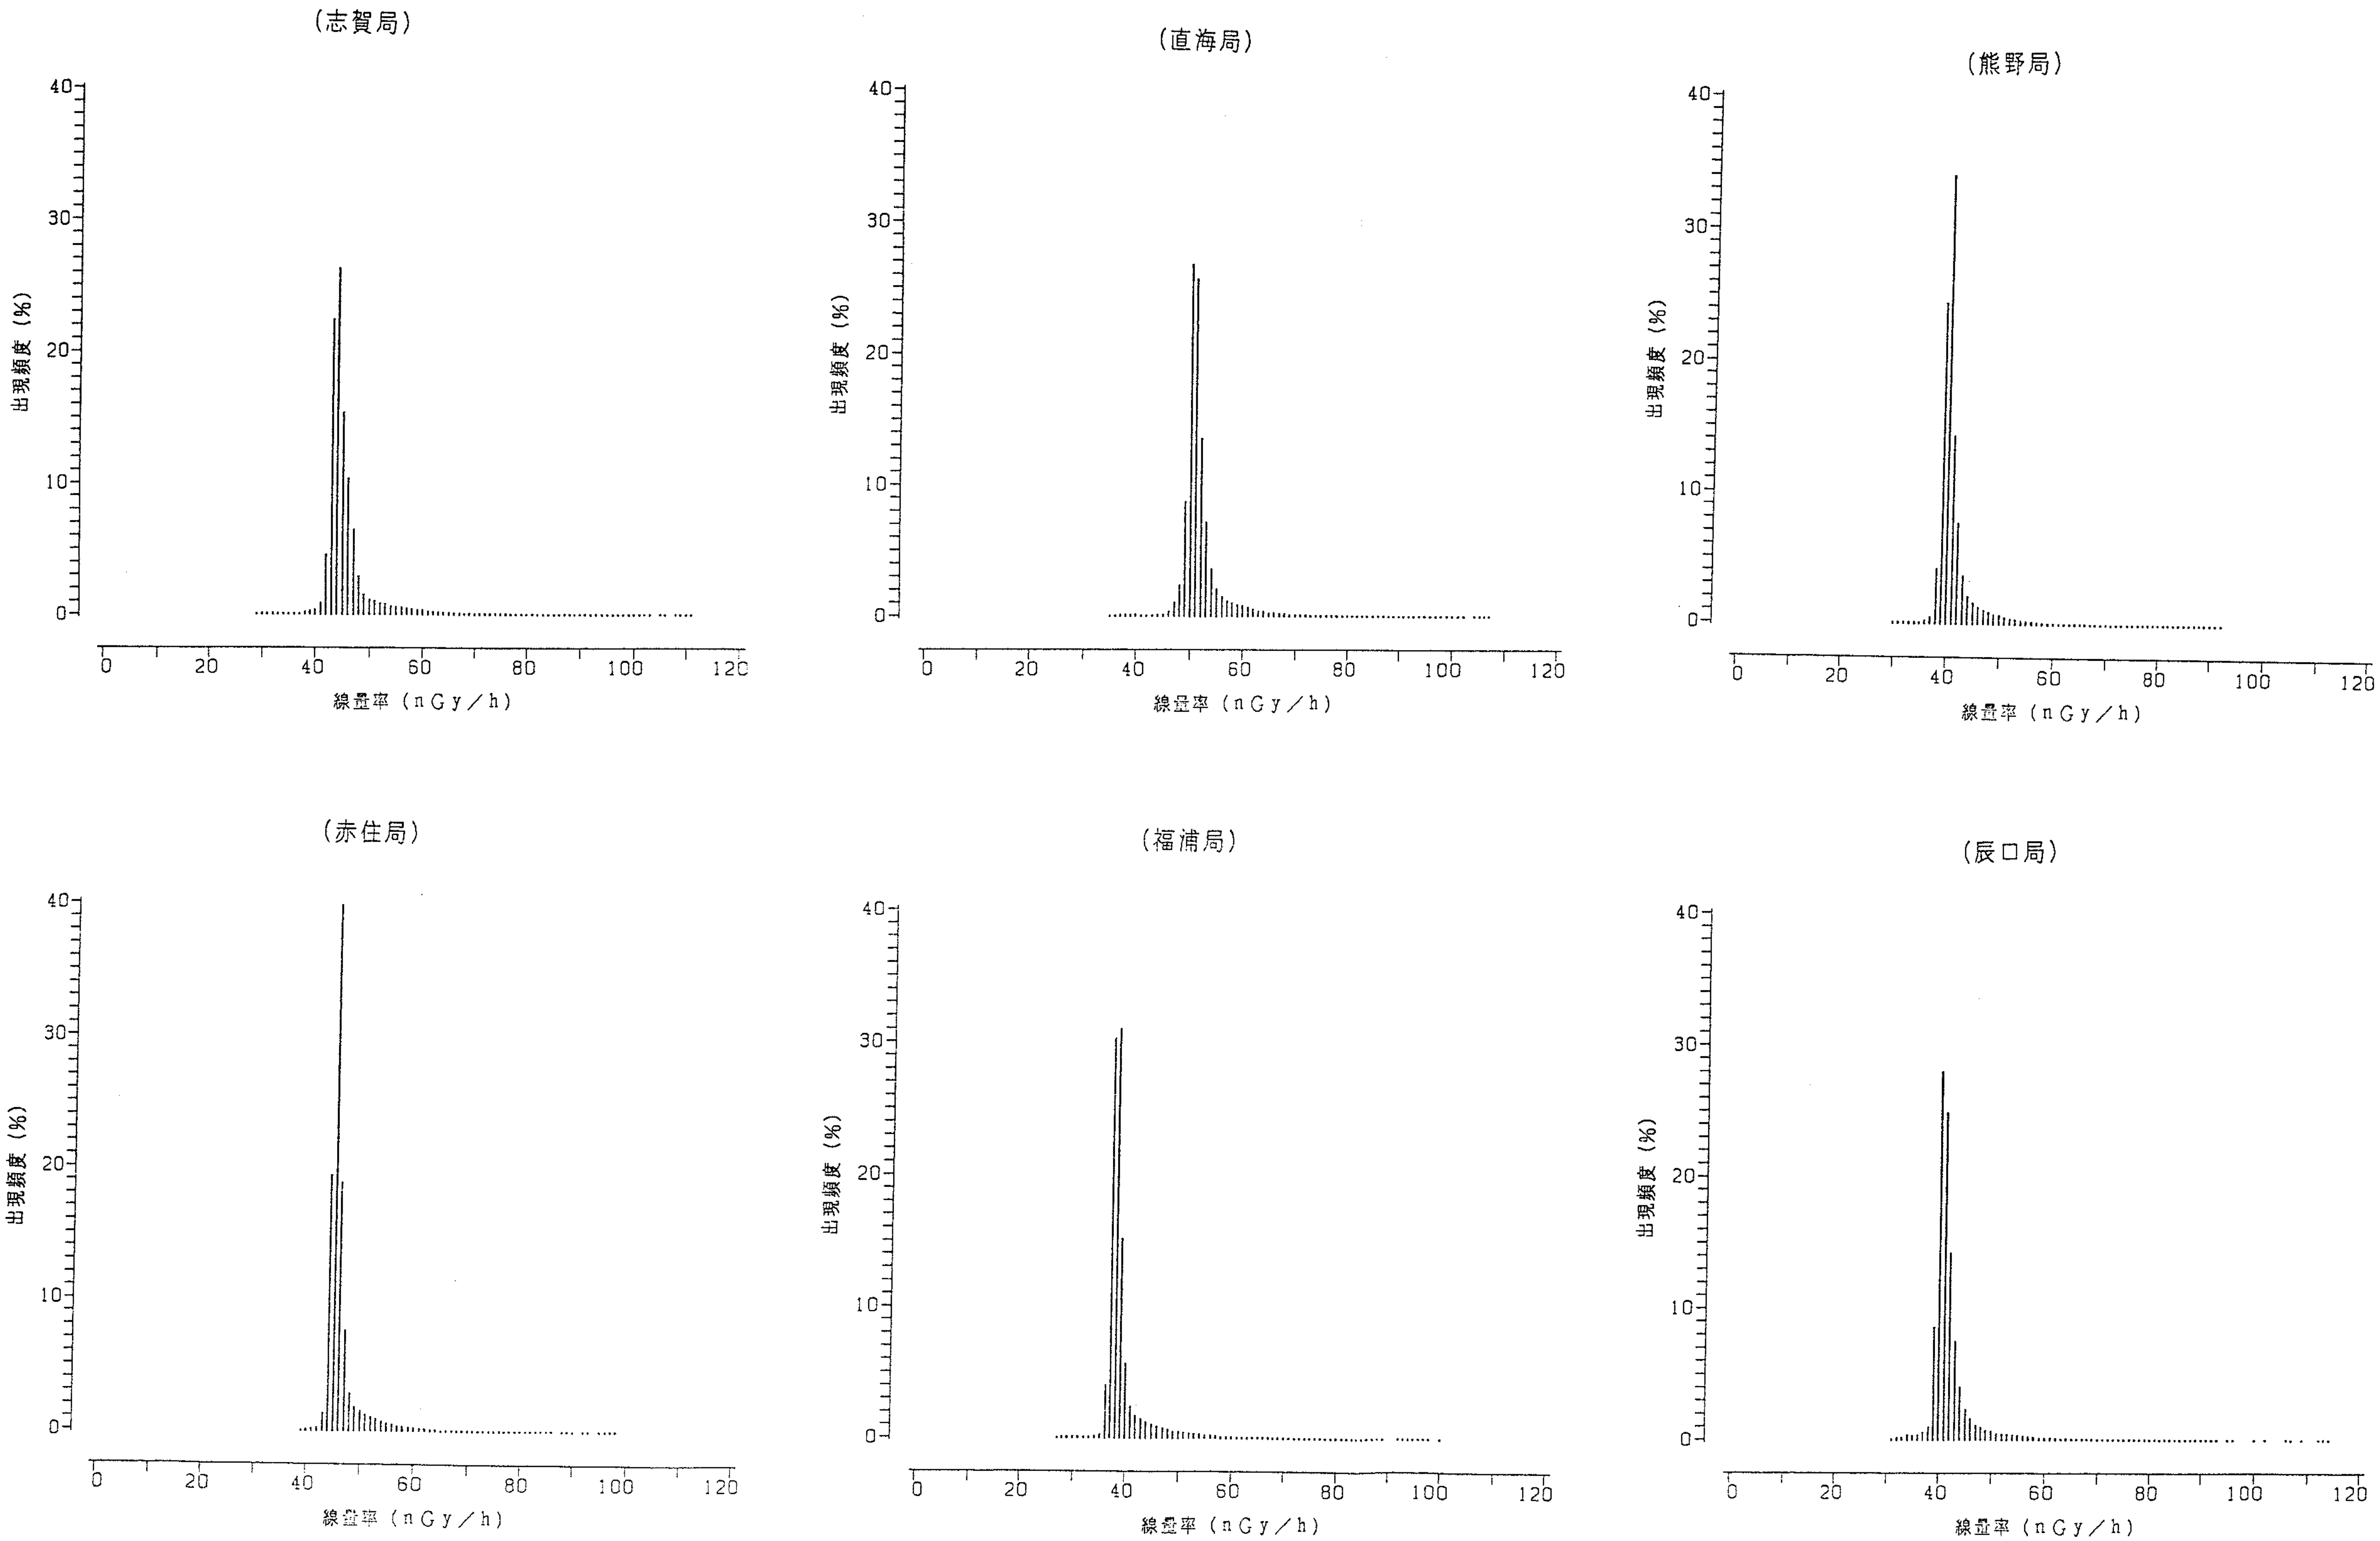

(志賀局)
(直海局)
(熊野局)
(赤住局)
(福浦局)
(辰口局)
出現頻度 (%)
0
10
20
30
40
0
20
40
60
80
100
120
線量率 (nGy/h)

線量率の出現頻度

観測局　:MP1

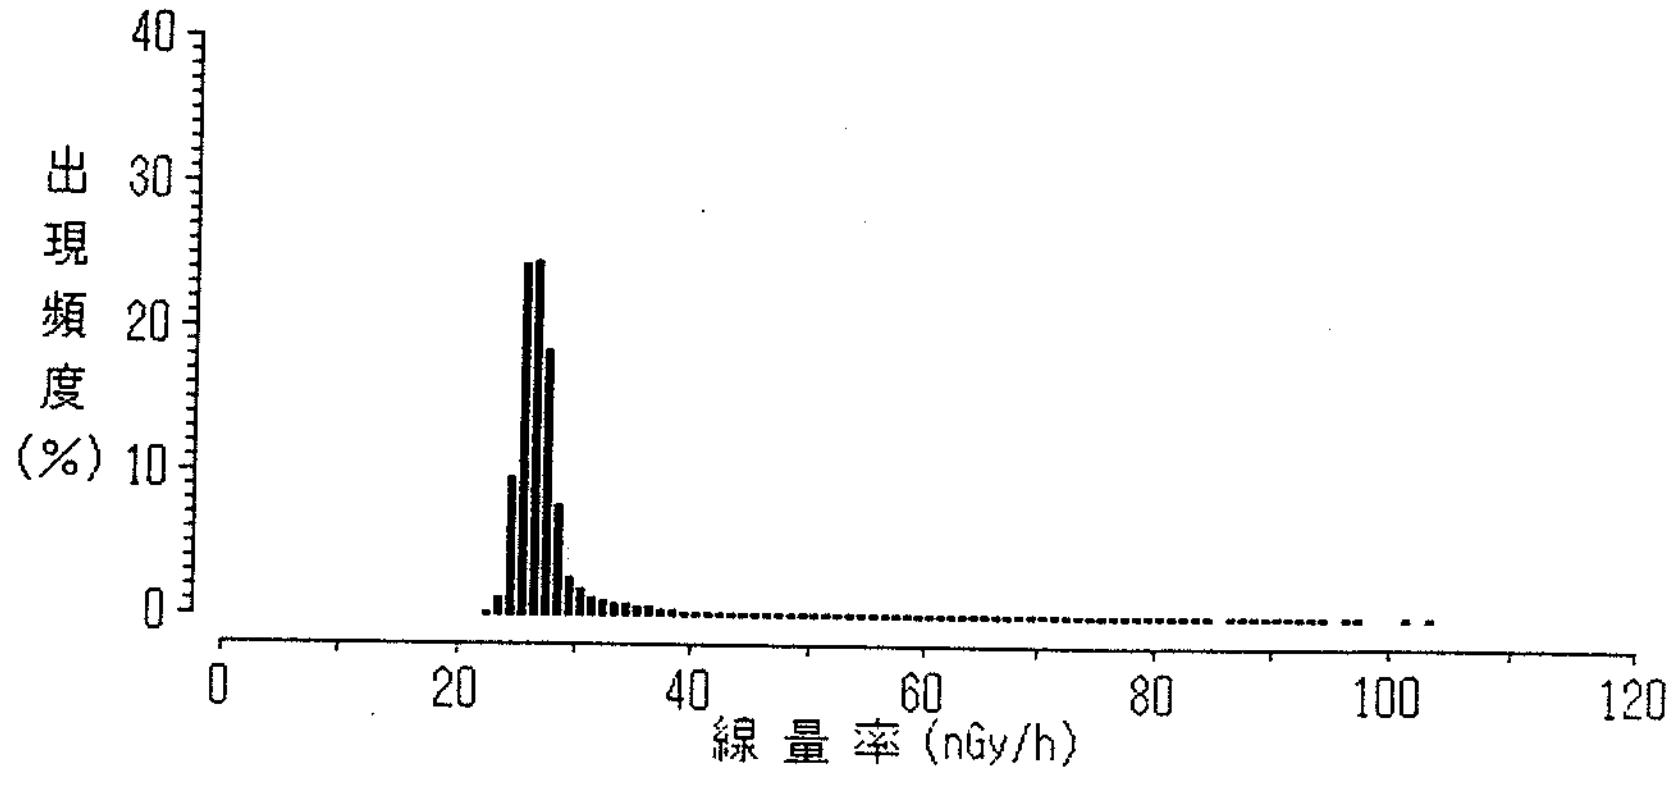

観測局　:MP4

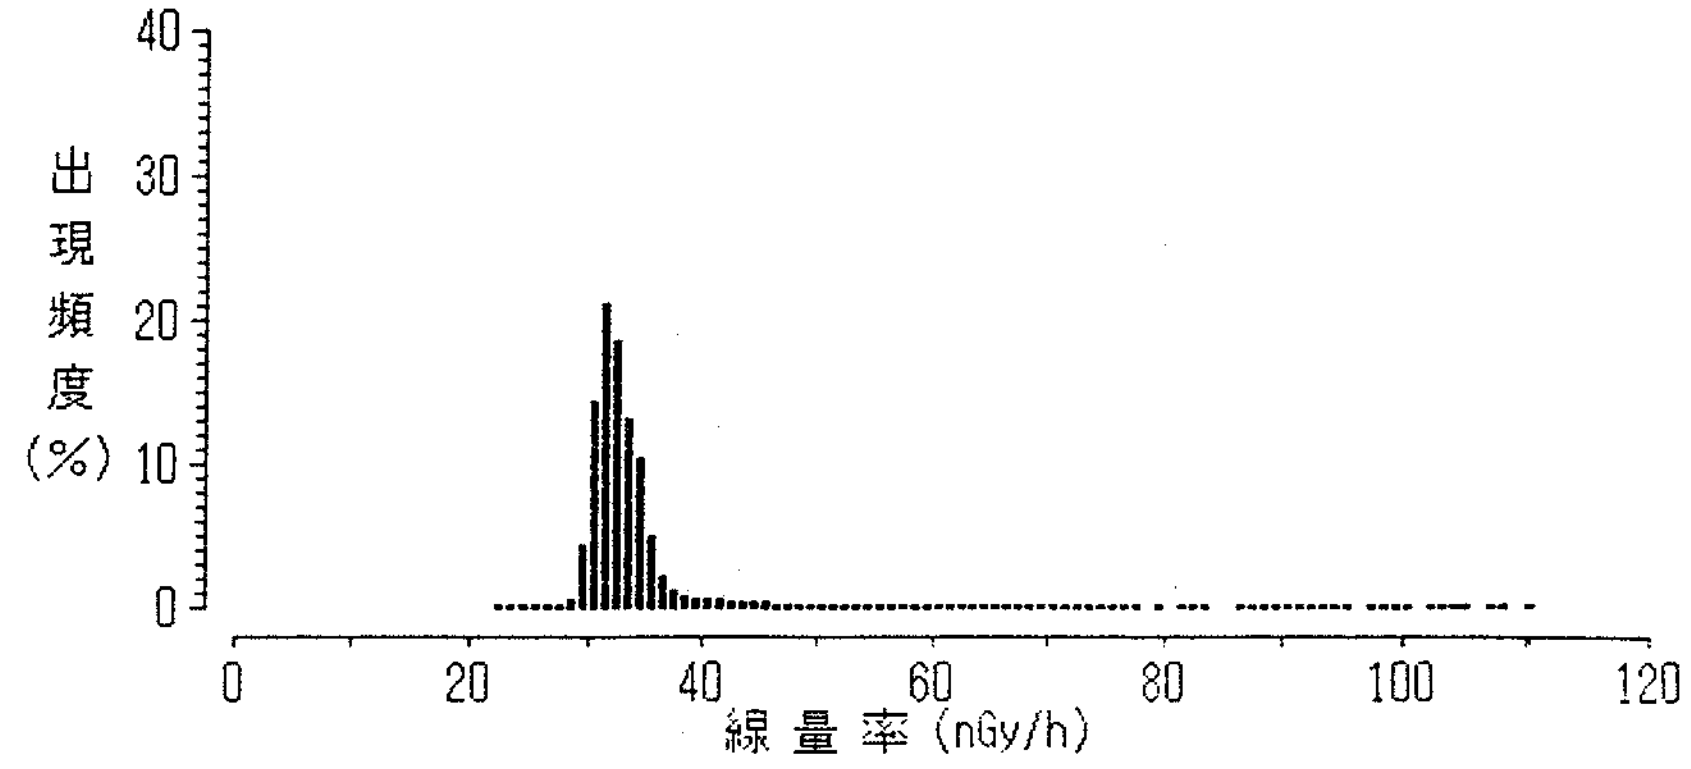

観測局　:MP7

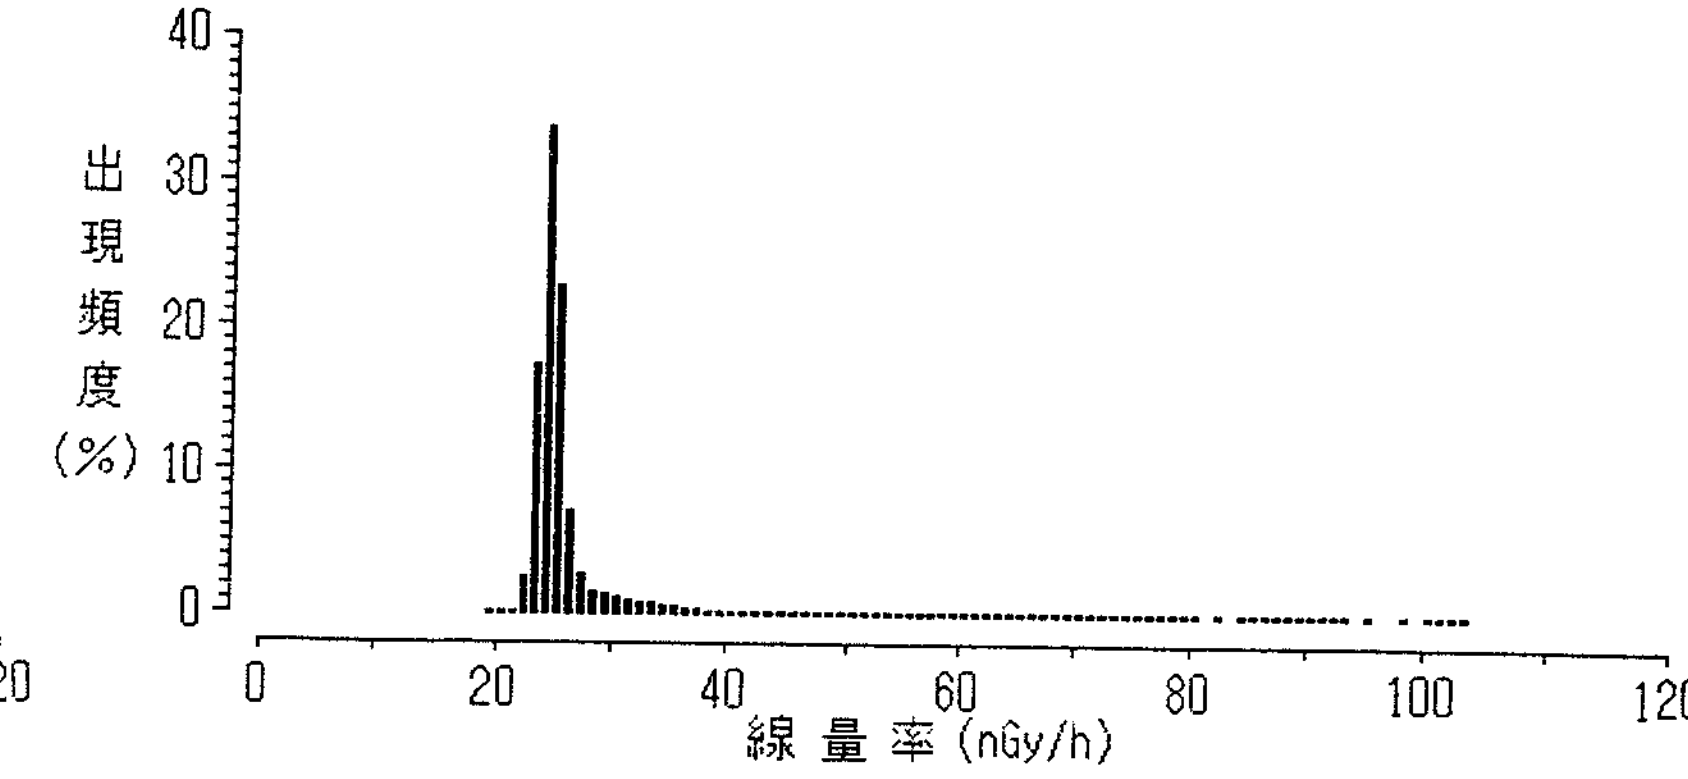

観測局　:MP2

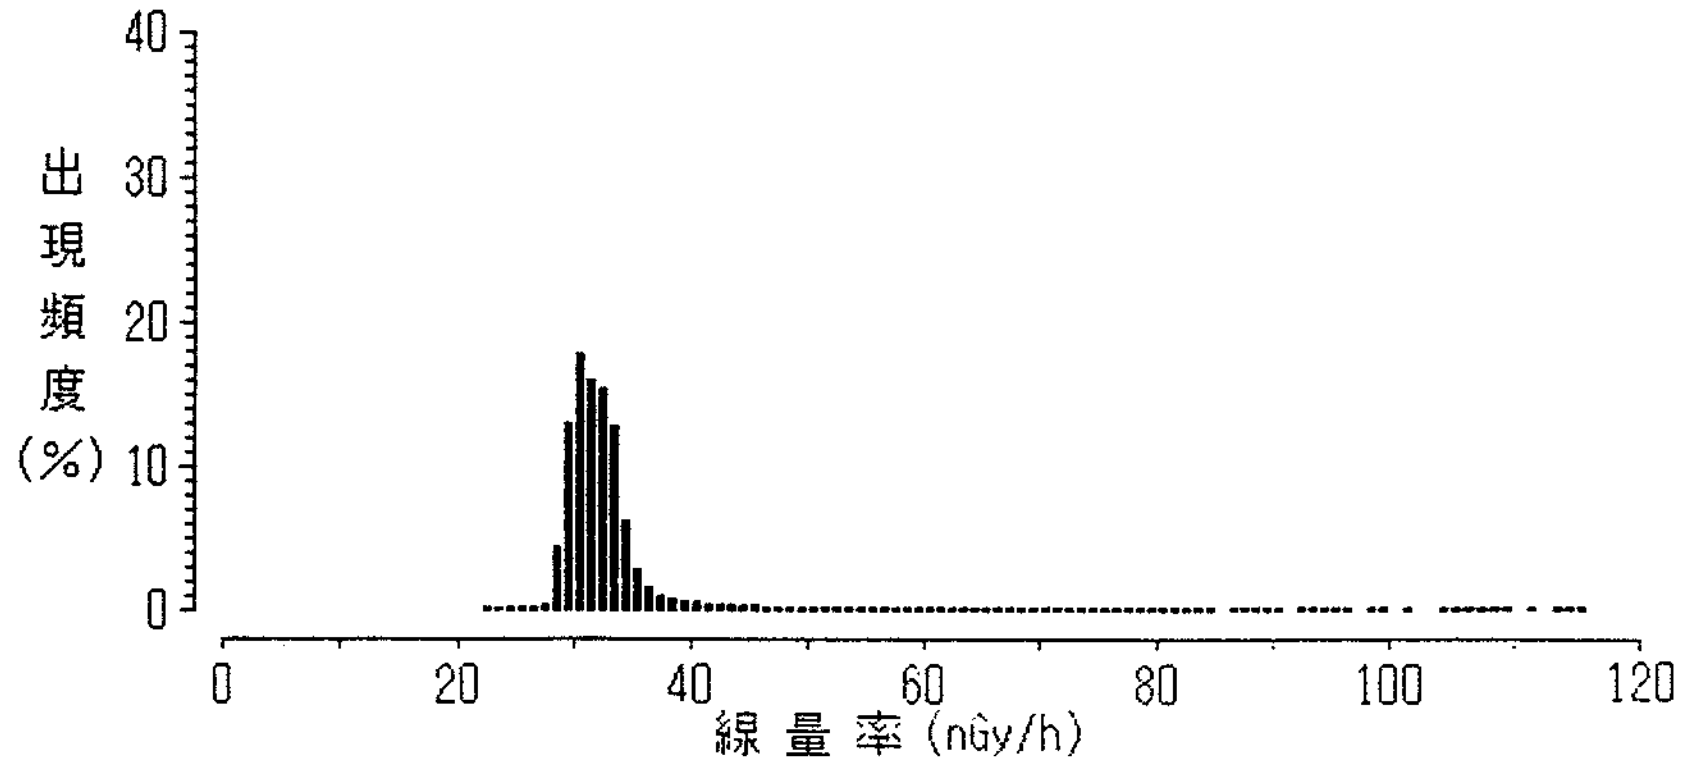

観測局　:MP5

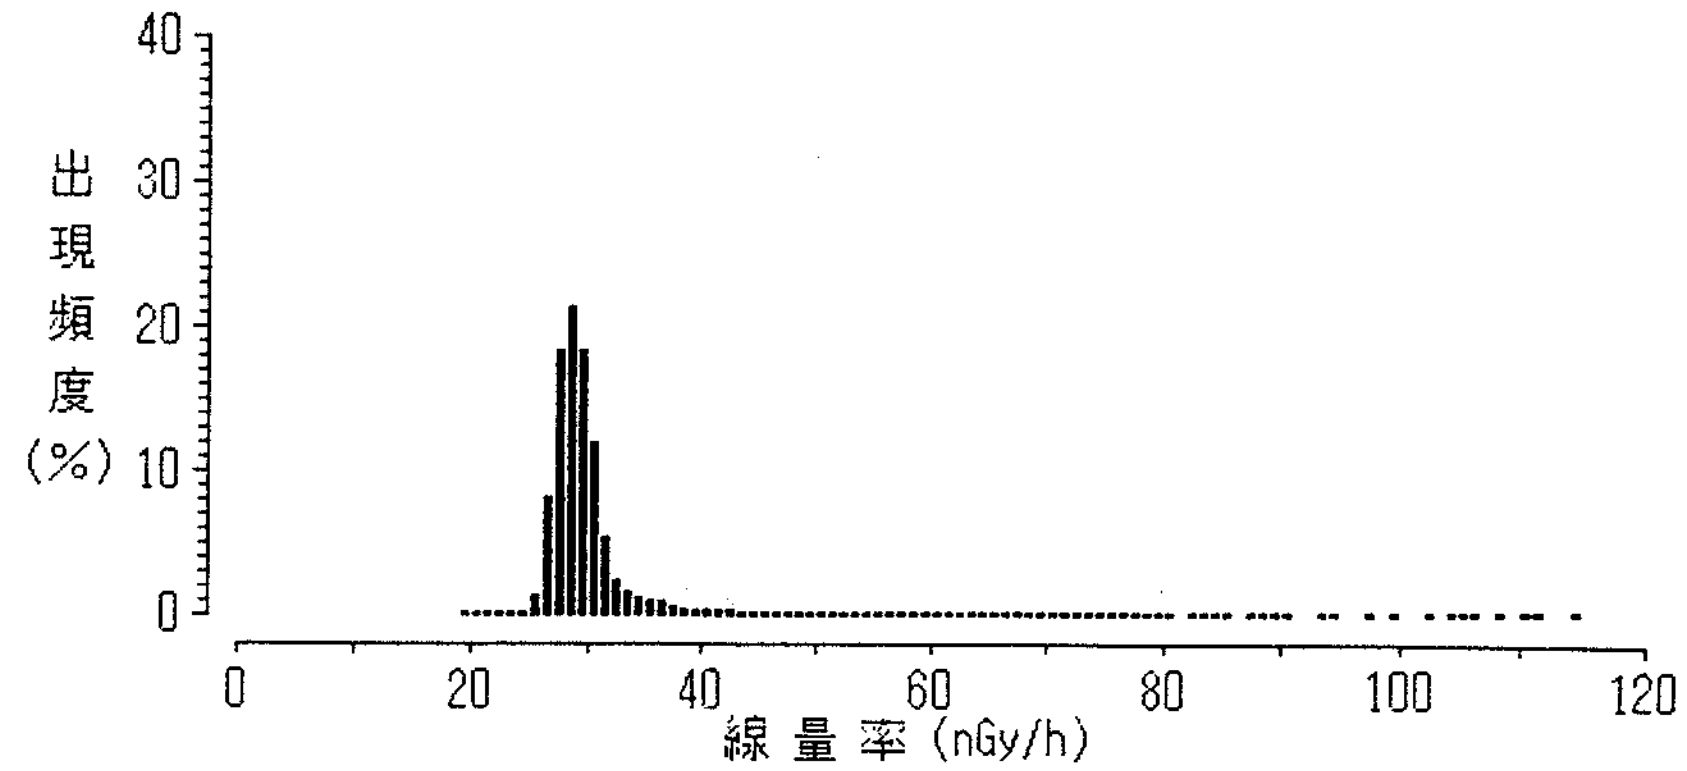

観測局　:MP3

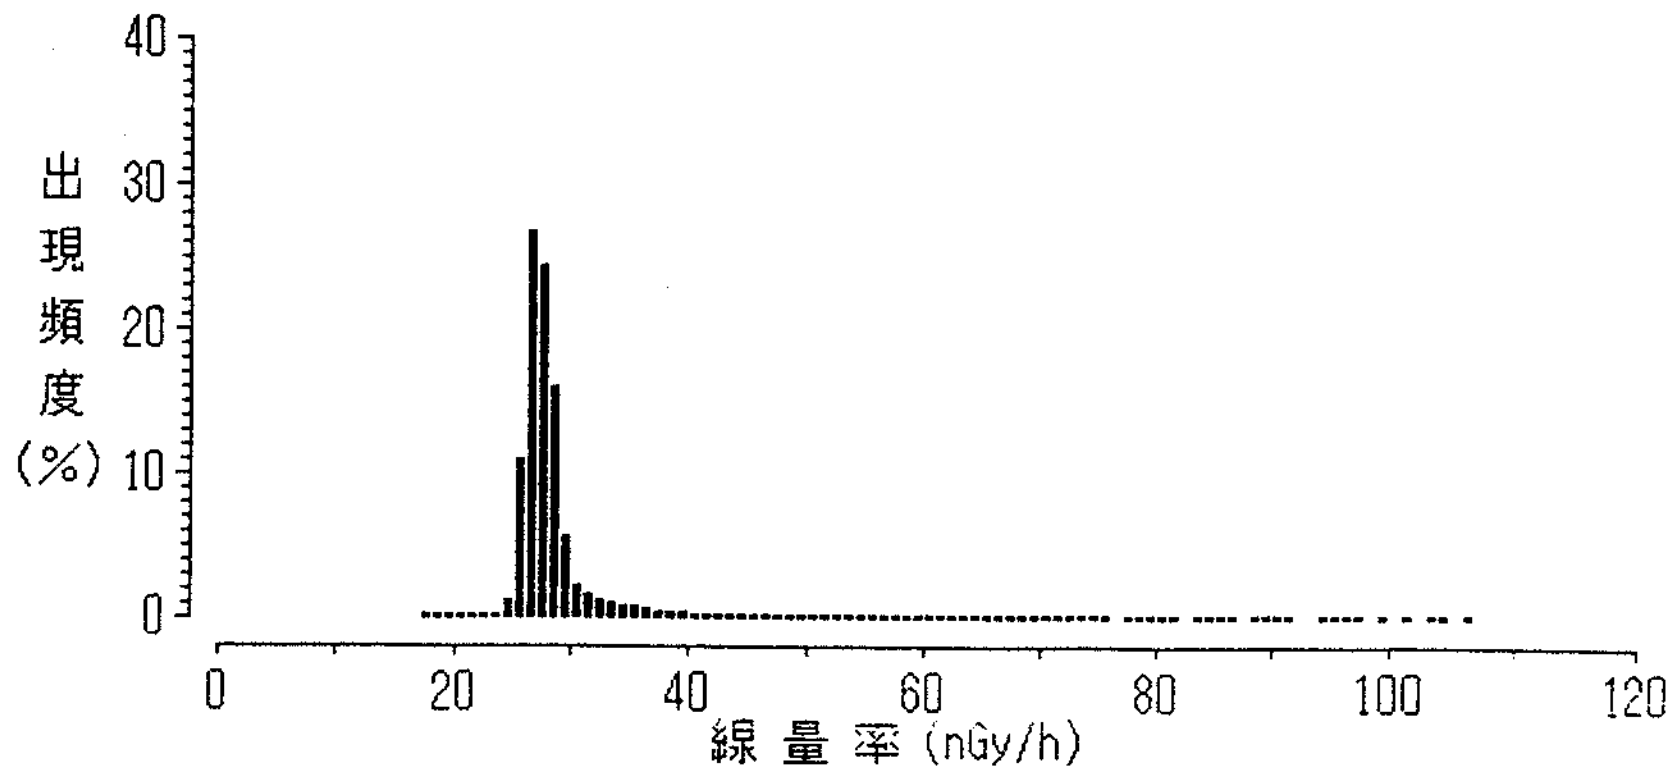

観測局　:MP6

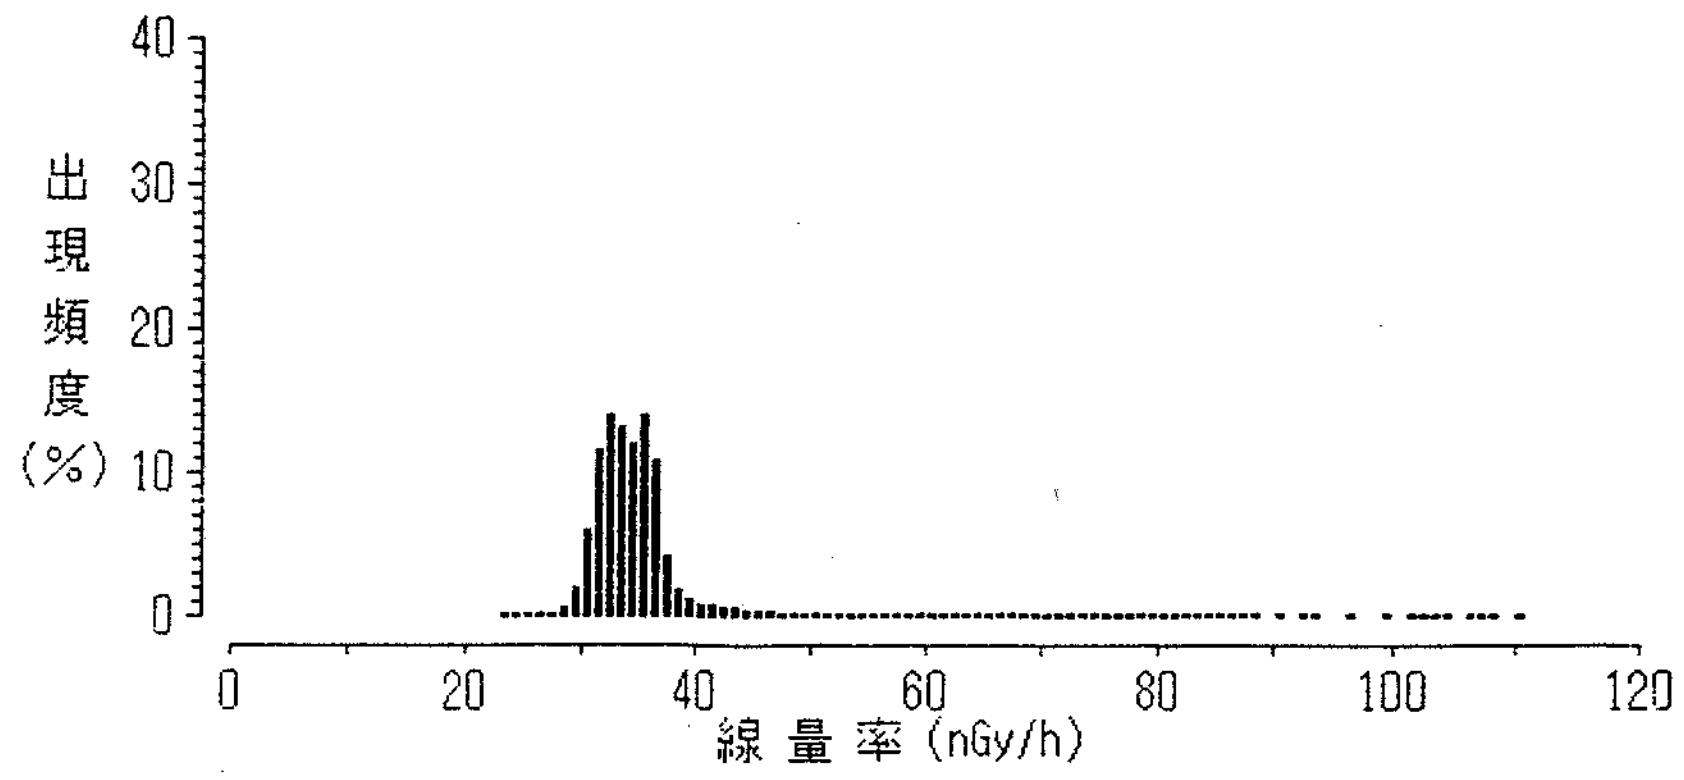

線量率と降水量の関係（志賀局）

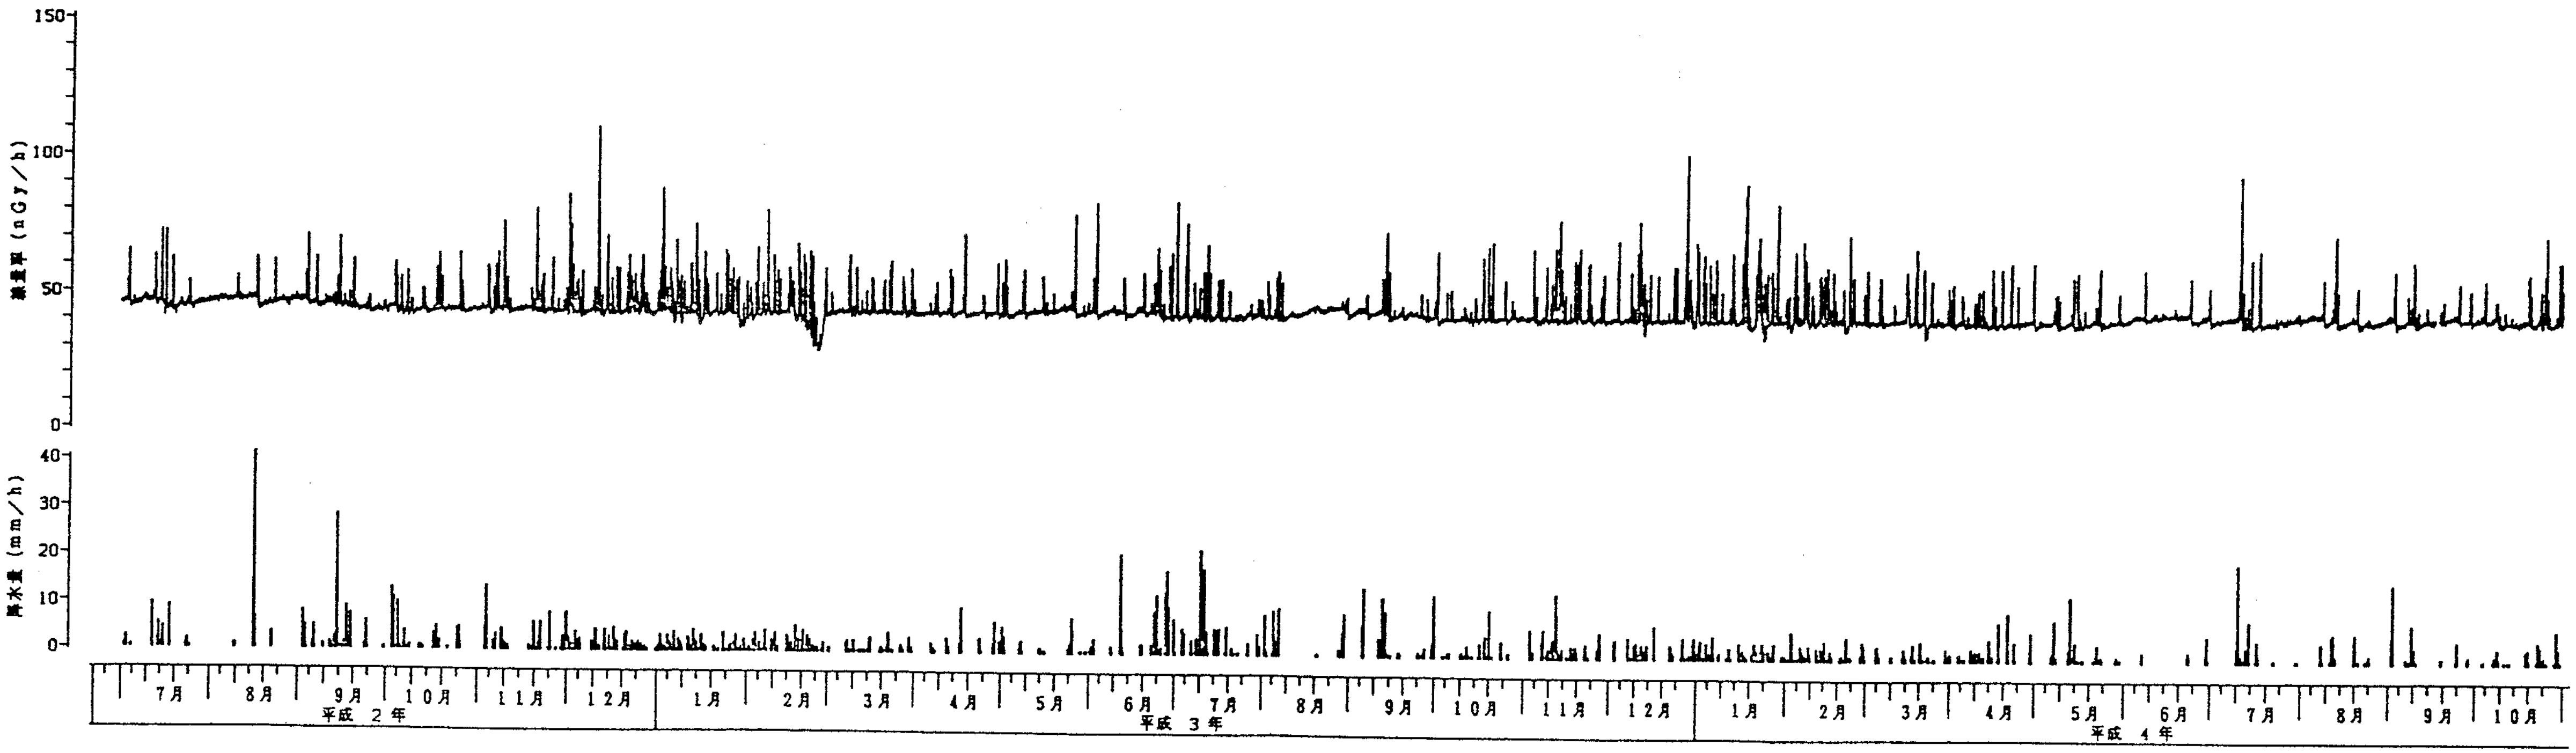

(2) 積算線量

石川県実施分

測定地点		平成2年度			
		第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期
		2. 6.26 ～ 2. 9.28	2. 9.28 ～ 2.12.26	2.12.26 ～ 3. 3.18	3. 3.18 ～ 3. 6.25
志賀町	① 若葉台	0.10	0.10	0.11	0.10
	② 直海	0.15	0.16	0.16	0.15
	③ 代田	0.12	0.12	0.12	0.11
	④ 徳田	0.12	0.13	0.13	0.12
	⑤ 赤住	0.15	0.15	0.16	0.14
	⑥ 大笹	0.13	0.13	0.13	0.12
	⑦ 志賀	0.14	0.14	0.15	0.13
	⑧ 上野	0.13	0.13	0.14	0.12
	⑨ 高浜町	0.14	0.14	0.15	0.13
	⑩ 倉垣	0.14	0.14	0.14	0.13
	⑪ 二所宮	0.13	0.13	0.14	0.12
	⑫ 岩田	0.14	0.13	0.14	0.14
富来町	⑬ 大福寺	0.12	0.13	0.13	0.12
	⑭ 赤崎	0.14	0.14	0.15	0.13
	⑮ 大西	0.11	0.11	0.12	0.11
	⑯ 里本江	0.13	0.14	0.14	0.13

（注）測定位置：地上1．5m

単位：mGy／91日（換算値）

平成3年度			平成4年度		測定値範囲
第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	
3. 6.25 ～3. 9.19	3. 9.19 ～3.12.18	3.12.18 ～4. 3.24	4. 3.24 ～4. 6.23	4. 6.23 ～4. 9.29	
0．10	0．10	0．11	0．10	0．10	0.10～0.11
0．15	0．15	0．16	0．14	0．14	0.14～0.16
0．12	0．11	0．14	0．11	0．11	0.11～0.14
0．12	0．12	0．13	0．11	0．12	0.11～0.13
0．13	0．14	0．15	0．14	0．13	0.13～0.16
0．12	0．13	0．14	0．12	0．13	0.12～0.14
0．13	0．13	0．14	0．13	0．13	0.13～0.15
0．12	0．13	0．13	0．12	0．13	0.12～0.14
0．14	0．13	0．14	0．13	0．14	0.13～0.15
0．13	0．13	0．14	0．12	0．13	0.12～0.14
0．13	0．13	0．14	0．12	0．12	0.12～0.14
0．12	0．13	0．14	0．12	0．13	0.12～0.14
0．12	0．13	0．13	0．11	0．12	0.11～0.13
0．13	0．13	0．14	0．13	0．13	0.13～0.15
0．10	0．11	0．12	0．11	0．11	0.10～0.12
0．12	0．14	0．14	0．13	0．13	0.12～0.14

(2) 積算線量（つづき）

石川県実施分

測定地点		平成２年度 第２四半期 2. 6.26 〜 2. 9.28	平成２年度 第３四半期 2. 9.28 〜 2.12.26	平成２年度 第４四半期 2.12.26 〜 3. 3.18	第１四半期 3. 3.18 〜 3. 6.25
富来町	⑰ 風無	０．１３	０．１４	０．１４	０．１３
	⑱ 生神	０．１１	０．１１	０．１２	０．１１
	⑲ 熊野	０．１４	０．１４	０．１４	０．１３
	⑳ 福浦	０．１３	０．１２	０．１３	０．１２
羽咋市	㉑ 柴垣町	０．１４	０．１５	０．１５	０．１４
	㉒ 旭町	０．１５	０．１５	０．１７	０．１４
田鶴浜町	㉓ 大津	０．１４	０．１３	０．１４	０．１２
	㉔ 田鶴浜	０．１４	０．１３	０．１４	０．１３
鳥屋町	㉕ 瀬戸	０．１４	０．１４	０．１４	０．１３
	㉖ 羽坂	０．１４	０．１４	０．１５	０．１３
中島町	㉗ 中島	０．１２	０．１２	０．１３	０．１１
	㉘ 豊田町	０．１４	０．１３	０．１４	０．１２
鹿西町	㉙ 上後山	０．１４	０．１４	０．１４	０．１４
	㉚ 能登部上	０．１５	０．１５	０．１５	０．１４
辰口町	㉛ 辰口（比較対照地点）	０．１２	０．１２	０．１２	０．１２

（注）測定位置：地上１．５ｍ

単位：mGy／91日（換算値）

平成3年度			平成4年度		測定値範囲
第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	
3. 6.25 ～3. 9.19	3. 9.19 ～3.12.18	3.12.18 ～4. 3.24	4. 3.24 ～4. 6.23	4. 6.23 ～4. 9.29	
0.13	0.13	0.14	0.12	0.12	0.12～0.14
0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10～0.12
0.13	0.13	0.14	0.12	0.12	0.12～0.14
0.11	0.12	0.13	0.11	0.12	0.11～0.13
0.13	0.13	0.15	0.13	0.13	0.13～0.15
0.14	0.15	0.16	0.13	0.14	0.13～0.17
0.12	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12～0.14
0.13	0.13	0.14	0.12	0.13	0.12～0.14
0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13～0.14
0.13	0.13	0.15	0.13	0.13	0.13～0.15
0.11	0.11	0.13	0.11	0.11	0.11～0.13
0.12	0.13	0.14	0.12	0.13	0.12～0.14
0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13～0.14
0.14	0.16	0.16	0.13	0.14	0.13～0.16
0.12	0.12	0.13	0.11	0.12	0.11～0.13

(2) 積算線量（つづき）

北陸電力実施分

測定地点		平成2年度 第2四半期 2. 6.26 ～ 2. 9.28	平成2年度 第3四半期 2. 9.28 ～ 2.12.26	平成2年度 第4四半期 2.12.26 ～ 3. 3.18	第1四半期 3. 3.18 ～ 3. 6.25
志賀町	① 若葉台	0．12	0．12	0．13	0．12
	② 五里峠	0．16	0．16	0．16	0．16
	③ 赤住（祢々）	0．16	0．17	0．17	0．16
	④ 赤住（公民館）	0．14	0．15	0．15	0．14
	⑤ 赤住（江野）	0．17	0．17	0．18	0．17
	⑥ 百浦	0．14	0．14	0．15	0．14
	⑦ 高浜	0．18	0．18	0．19	0．18
富来町	⑧ 高田	0．16	0．16	0．18	0．16
	⑨ 谷神	0．15	0．16	0．15	0．15
	⑩ 牛下	0．16	0．17	0．18	0．17
	⑪ 和光台	0．13	0．13	0．14	0．13
	⑫ 福浦港	0．12	0．12	0．12	0．12
羽咋市	⑬ 石野町（比較対照地点）	0．17	0．17	0．18	0．17
金沢市	⑭ 山の上町（比較対照地点）	0．17	0．18	0．18	0．18

（注）測定位置：地上1．5m

単位：mGy／91日（換算値）

平成3年度			平成4年度		測定値範囲
第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	
3. 6.25 ～ 3. 9.19	3. 9.19 ～ 3.12.18	3.12.18 ～ 4. 3.24	4. 3.24 ～ 4. 6.23	4. 6.23 ～ 4. 9.29	
0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12～0.13
0.16	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16～0.18
0.16	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16～0.18
0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14～0.15
0.17	0.18	0.18	0.16	0.17	0.16～0.18
0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14～0.15
0.19	0.18	0.19	0.17	0.18	0.17～0.19
0.16	0.17	0.17	0.15	0.16	0.15～0.18
0.15	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15～0.16
0.17	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16～0.18
0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13～0.14
0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12～0.13
0.17	0.18	0.18	0.16	0.17	0.16～0.18
0.17	0.18	0.18	0.16	0.17	0.16～0.18

2．環境試料中の放射能

(1) 大気中放射性物質

a．大気浮遊じん（全アルファ放射能）

石川県実施分　　　　　　　　　　　　　　単位：Ｂｑ／m^3

測定地点	測定年月	最高値	最低値	平均値
志　賀　局	3年　1月	2．7	0．3	1．0
	2月	2．7	0．1	0．9
	3月	3．0	0．2	1．1
	4月	2．5	0．2	0．9
	5月	4．4	0．1	1．0
	6月	5．1	0．1	1．0
	7月	2．4	0．0	0．7
	8月	4．2	0．1	0．9
	9月	5．1	0．1	1．1
	１０月	4．2	0．1	1．0
	１１月	3．0	0．2	1．0
	１２月	2．4	0．2	0．9
	4年　1月	2．3	0．1	0．8
	2月	1．8	0．1	0．7
	3月	3．6	0．0	0．8
	4月	3．9	0．1	0．9
	5月	3．3	0．1	0．7
	6月	3．6	0．1	1．0
	7月	3．4	0．0	0．9
	8月	4．1	0．1	1．1
	9月	4．2	0．0	1．1
	１０月	6．7	0．1	1．1
	期　間	6．7	0．0	0．9

（注）吸引口高さ：地上2．２ｍ
全アルファ放射能は平成2年7月～１２月までは装置不備により測定せず。

(1) 大気中放射性物質（つづき）

b．大気浮遊じん（全ベータ放射能）

石川県実施分　　　　　　　　　　　　　　　　単位：Ｂｑ／m^3

測定地点	測定年月	最高値	最低値	平均値
志　賀　局	3年　1月	4．7	0．5	1．8
	2月	4．7	0．2	1．6
	3月	5．0	0．4	2．0
	4月	4．7	0．5	1．7
	5月	9．0	0．3	1．9
	6月	9．6	0．2	1．9
	7月	4．4	0．0	1．3
	8月	7．8	0．1	1．7
	9月	8．5	0．1	2．0
	10月	7．3	0．2	1．9
	11月	5．0	0．3	1．8
	12月	4．4	0．3	1．6
	4年　1月	4．0	0．3	1．4
	2月	3．4	0．2	1．2
	3月	6．1	0．0	1．4
	4月	6．8	0．1	1．6
	5月	6．2	0．1	1．2
	6月	6．3	0．2	1．7
	7月	5．5	0．1	1．6
	8月	7．2	0．1	2．1
	9月	7．9	0．1	2．1
	10月	12．0	0．2	2．0
	期　間	12．0	0．0	1．7

（注）吸引口高さ：地上２．２ｍ
全ベータ放射能は平成２年７月～１２月までは装置不備により測定せず。

(1) 大気中放射性物質（つづき）

b．大気浮遊じん（全ベータ放射能）（つづき）

北陸電力実施分　単位：Ｂｑ／m^3

測定地点	測定年月	最高値	最低値	平均値
ＭＰ－２	２年　７月	１２．２	０．６	３．３
	８月	１１．４	０．３	３．４
	９月	８．２	０．３	２．６
	１０月	８．１	０．７	２．６
	１１月	８．８	０．４	３．５
	１２月	８．０	０．４	２．２
	３年　１月	８．０	０．３	２．６
	２月	５．５	０．５	２．４
	３月	８．０	０．８	２．９
	４月	５．７	０．７	２．３
	５月	８．５	０．２	２．５
	６月	８．３	０．４	２．９
	７月	６．２	０．２	１．７
	８月	９．９	０．３	２．３
	９月	９．４	０．３	２．４
	１０月	５．６	０．４	２．２
	１１月	５．３	０．５	２．２
	１２月	５．５	０．５	２．３
	４年　１月	６．６	０．７	２．６
	２月	５．８	０．６	２．５
	３月	１２．７	０．１	２．７
	４月	７．６	０．２	２．６
	５月	７．１	０．４	２．０
	６月	９．６	０．６	３．１
	７月	８．４	０．２	２．８
	８月	８．５	０．３	２．８
	９月	８．５	０．３	２．７
	１０月	８．７	０．４	２．６
	期　間	１２．７	０．１	２．６

（注）吸引口高さ：地上２．５ｍ

(1) 大気中放射性物質（つづき）

b．大気浮遊じん（全ベータ放射能）（つづき）

北陸電力実施分　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：Bq／m^3

測定地点	測定年月	最高値	最低値	平均値
MP－6	2年　7月	11．7	0．7	3．4
	8月	10．6	0．4	3．5
	9月	8．5	0．3	2．7
	10月	8．7	0．5	2．5
	11月	8．5	0．4	3．2
	12月	7．9	0．3	2．0
	3年　1月	6．7	0．3	2．3
	2月	5．5	0．5	2．1
	3月	6．4	0．8	2．7
	4月	7．0	0．8	2．6
	5月	10．6	0．2	2．7
	6月	10．8	0．3	3．0
	7月	6．1	0．2	1．9
	8月	11．5	0．4	2．3
	9月	11．0	0．3	2．4
	10月	5．8	0．2	2．2
	11月	5．3	0．5	2．2
	12月	5．2	0．5	2．4
	4年　1月	5．9	0．7	2．3
	2月	4．5	0．5	2．0
	3月	11．3	0．2	2．8
	4月	8．2	0．3	2．6
	5月	7．9	0．4	2．1
	6月	10．3	0．6	3．2
	7月	8．0	0．3	2．8
	8月	9．0	0．3	2．8
	9月	9．1	0．3	2．8
	10月	8．3	0．4	2．6
	期　間	11．7	0．2	2．6

（注）吸引口高さ：地上2．5m

(1) 大気中放射性物質（つづき）

c．放射性ヨウ素

石川県実施分　　　　　　　　　　単位：mBq／m³

測定地点	測定年月日	空気吸引量 (m^3/回)	I－131
志 賀 局	2. 7.19	0．5	N D
	2. 9.10	0．5	N D
	2.12.17	0．5	N D
	3. 1.28	0．5	N D
	3. 2.25	0．5	N D
	3. 3.25	0．5	N D
	3. 4.23	0．5	N D
	3. 5.22	0．5	N D
	3. 6.28	0．5	N D
	3. 7.16	0．5	N D
	3. 8.13	0．5	N D
	3. 9.10	0．5	N D
	3.10.22	0．5	N D
	3.11.14	0．5	N D
	3.12.19	0．5	N D
	4. 1.30	0．5	N D
	4. 2.20	0．5	N D
	4. 3.28	0．5	N D
	4. 4.28	0．5	N D
	4. 5.30	0．5	N D
	4. 6. 9	0．5	N D
	4. 7.29	0．5	N D
	4. 8.26	0．5	N D
	4. 9.29	0．5	N D
	4.10.29	0．5	N D

（注）NDは検出下限値未満である。
測定年月日毎に３０回実施。
（１回毎に１０分間捕集、１０分間測定）

(2) 核種分析（機器分析）

a．降下物（雨水ちり）

採取地点	採取期間	人　工　放			
		Cr-51	Mn-54	Fe-59	
志賀町安部屋（志賀局）石川県実施分	2. 7. 1 ～ 2. 8. 2	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	
	2. 8. 2 ～ 2. 9. 3	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	
	2. 9. 3 ～ 2.10. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	
	2.10. 1 ～ 2.11. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	
	2.11. 1 ～ 2.12. 3	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	
	2.12. 3 ～ 3. 1. 7	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	
	3. 1. 7 ～ 3. 2. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	
	3. 2. 1 ～ 3. 3. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	
	3. 3. 1 ～ 3. 4. 2	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	
	3. 4. 2 ～ 3. 5. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	
	3. 5. 1 ～ 3. 6. 3	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	
	3. 6. 3 ～ 3. 7. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	
	3. 7. 1 ～ 3. 8. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	
	3. 8. 1 ～ 3. 9. 2	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	
	3. 9. 2 ～ 3.10. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	
	3.10. 1 ～ 3.11. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	
	3.11. 1 ～ 3.11.29	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	
	3.11.29 ～ 3.12.25	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	
	3.12.25 ～ 4. 1.31	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	
	4. 1.31 ～ 4. 2.28	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	
	4. 2.28 ～ 4. 3.30	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	
	4. 3.30 ～ 4. 4.28	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	
	4. 4.28 ～ 4. 6. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	
	4. 6. 1 ～ 4. 7. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	
	4. 7. 1 ～ 4. 7.31	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	
	4. 7.31 ～ 4. 8.31	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	
	4. 8.31 ～ 4. 9.30	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	
	4. 9.30 ～ 4.10.30	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
　　　ＮＤは検出下限値未満である。

単位：Ｂｑ／m^2・月（30日換算値）

射 性 核 種				天然放射性核種	
Co-58	Co-60	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	32.7± 0.7	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	49.6± 0.8	1.6 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	152 ± 2	1.9 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	202 ± 2	2.5 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	353 ± 2	3.9 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	539 ± 3	4.2 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	503 ± 3	3.0 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	408 ± 2	3.7 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	200 ± 2	1.0 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	128 ± 1	0.9 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	81 ± 1	1.8 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	253 ± 2	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	157 ± 1	1.4 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	72.4± 0.8	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	108 ± 1	2.6 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	199 ± 2	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	51 ± 3	2.0 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	331 ± 2	1.6 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	571 ± 3	4.1 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	457 ± 3	2.6 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	180 ± 2	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	243 ± 2	2.4 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	179 ± 2	1.1 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	75 ± 1	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	172 ± 2	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	168 ± 2	1.6 ± 0.5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	88 ± 1	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	151 ± 1	0.9 ± 0.3

(2) 核種分析（機器分析）（つづき）

a．降下物（雨水ちり）

採取地点	採取期間	人工放		
		Cr-51	Mn-54	Fe-59
富来町福浦港（福浦局）石川県実施分	2. 7. 1 ～ 2. 8. 2	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	2. 8. 2 ～ 2. 9. 3	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	2. 9. 3 ～ 2.10. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	2.10. 1 ～ 2.11. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	2.11. 1 ～ 2.12. 3	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	2.12. 3 ～ 3. 1. 7	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 1. 7 ～ 3. 2. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 2. 1 ～ 3. 3. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 3. 1 ～ 3. 4. 2	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 4. 2 ～ 3. 5. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 5. 1 ～ 3. 6. 3	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 6. 3 ～ 3. 7. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 7. 1 ～ 3. 8. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 8. 1 ～ 3. 9. 2	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 9. 2 ～ 3.10. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3.10. 1 ～ 3.11. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3.11. 1 ～ 3.11.29	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3.11.29 ～ 3.12.25	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3.12.25 ～ 4. 1.31	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 1.31 ～ 4. 2.28	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 2.28 ～ 4. 3.30	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 3.30 ～ 4. 4.28	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 4.28 ～ 4. 6. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 6. 1 ～ 4. 7. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 7. 1 ～ 4. 7.31	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 7.31 ～ 4. 8.31	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 8.31 ～ 4. 9.30	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 9.30 ～ 4.10.30	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
ＮＤは検出下限値未満である。

単位：Ｂｑ／ｍ²・月（30日換算値）

射	性	核	種	天然放射性核種	
Co-58	Co-60	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	44.3± 0.7	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	46.7± 0.9	2.3 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	136 ± 1	1.5 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	159 ± 2	2.5 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	346 ± 2	6.0 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	472 ± 3	6.3 ± 0.5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	420 ± 3	3.6 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	460 ± 3	7.0 ± 0.6
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	182 ± 2	1.3 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	112 ± 1	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	74.1± 0.9	1.7 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	241 ± 2	1.5 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	130 ± 1	1.9 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	48.2± 0.8	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	92 ± 1	7.8 ± 0.5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	176 ± 1	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	405 ± 2	2.0 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	269 ± 2	1.3 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	526 ± 2	5.1 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	472 ± 3	3.4 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	213 ± 2	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	112 ± 1	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	172 ± 2	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	64.8± 0.9	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	172 ± 2	1.1 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	170 ± 2	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	114 ± 1	1.3 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	172 ± 2	Ｎ Ｄ

⑵ 核種分析（機器分析）（つづき）

a．降下物（雨水ちり）（つづき）

採取地点	採取期間	人　　工　　放		
		Cr-51	Mn-54	Fe-59
金沢市三馬（衛生公害研究所）石川県実施分（比較対照地点）	2. 7. 1 ～ 2. 7.31	LTD	LTD	LTD
	2. 7.31 ～ 2. 9. 4	LTD	LTD	LTD
	2. 9. 4 ～ 2.10. 2	LTD	LTD	LTD
	2.10. 2 ～ 2.10.31	LTD	LTD	LTD
	2.10.31 ～ 2.12. 4	LTD	LTD	LTD
	2.12. 4 ～ 3. 1. 4	LTD	LTD	LTD
	3. 1. 4 ～ 3. 2. 1	LTD	LTD	LTD
	3. 2. 1 ～ 3. 2.28	LTD	LTD	LTD
	3. 2.28 ～ 3. 4. 2	LTD	LTD	LTD
	3. 4. 2 ～ 3. 5. 1	LTD	LTD	LTD
	3. 5. 1 ～ 3. 6. 3	LTD	LTD	LTD
	3. 6. 3 ～ 3. 7. 1	LTD	LTD	LTD
	3. 7. 1 ～ 3. 8. 1	LTD	LTD	LTD
	3. 8. 1 ～ 3. 9. 2	LTD	LTD	LTD
	3. 9. 2 ～ 3. 9.30	LTD	LTD	LTD
	3. 9.30 ～ 3.10.30	LTD	LTD	LTD
	3.10.30 ～ 3.11.30	LTD	LTD	LTD
	3.11.30 ～ 3.12.26	LTD	LTD	LTD
	3.12.26 ～ 4. 1.30	LTD	LTD	LTD
	4. 1.30 ～ 4. 2.28	LTD	LTD	LTD
	4. 2.28 ～ 4. 3.25	LTD	LTD	LTD
金沢市太陽が丘（保健環境ｾﾝﾀｰ）（比較対照地点）	4. 3.25 ～ 4. 4.28	LTD	LTD	LTD
	4. 4.28 ～ 4. 6. 1	LTD	LTD	LTD
	4. 6. 1 ～ 4. 7. 1	LTD	LTD	LTD
	4. 7. 1 ～ 4. 8. 4	LTD	LTD	LTD
	4. 8. 4 ～ 4. 8.31	LTD	LTD	LTD
	4. 8.31 ～ 4. 9.30	LTD	LTD	LTD
	4. 9.30 ～ 4.10.30	LTD	LTD	LTD

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
　　　ＮＤは検出下限値未満である。
　　　県衛生公害研究所の県保健環境センターへの名称変更と移転に伴い、県の

単位：Ｂｑ／m²・月（30日換算値）

射	性	核	種	天然放射性核種	
Co-58	Co-60	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	12.9± 0.5	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	75.8± 0.9	3.0 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	197 ± 2	2.6 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	248 ± 2	1.9 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	551 ± 3	3.0 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	1059± 4	6.6 ± 0.5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	577 ± 3	2.9 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	588 ± 3	5.2 ± 0.5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	331 ± 2	2.2 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	126 ± 2	3.3 ± 0.5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	105 ± 1	2.3 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	39 ± 2	1.5 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	187 ± 2	1.5 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	62.0± 0.8	1.3 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.20±0.04	93 ± 1	8.8 ± 0.6
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	367 ± 3	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	62 ± 3	2.8 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	240 ± 2	1.4 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	625 ± 3	3.2 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	515 ± 3	2.1 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	360 ± 2	2.0 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	315 ± 2	2.9 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	367 ± 2	3.4 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	152 ± 2	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	117 ± 1	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	119 ± 2	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	102 ± 1	3.3 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	365 ± 3	1.7 ± 0.4

比較対照地点の変更があった。

(2) 核種分析（機器分析）（つづき）

a．降下物（雨水ちり）（つづき）

採取地点	採取期間	人　　工　　放		
		Cr-51	Mn-54	Fe-59
発電所敷地内 北陸電力実施分	2. 7. 2 ～ 2. 8. 2	LTD	LTD	LTD
	2. 8. 2 ～ 2. 9. 4	LTD	LTD	LTD
	2. 9. 4 ～ 2.10. 2	LTD	LTD	LTD
	2.10. 2 ～ 2.11. 1	LTD	LTD	LTD
	2.11. 1 ～ 2.12. 3	LTD	LTD	LTD
	2.12. 3 ～ 3. 1. 7	LTD	LTD	LTD
	3. 1. 7 ～ 3. 2. 4	LTD	LTD	LTD
	3. 2. 4 ～ 3. 3. 4	LTD	LTD	LTD
	3. 3. 4 ～ 3. 4. 1	LTD	LTD	LTD
	3. 4. 1 ～ 3. 5. 7	LTD	LTD	LTD
	3. 5. 7 ～ 3. 6. 3	LTD	LTD	LTD
	3. 6. 3 ～ 3. 7. 2	LTD	LTD	LTD
	3. 7. 2 ～ 3. 8. 2	LTD	LTD	LTD
	3. 8. 2 ～ 3. 9. 2	LTD	LTD	LTD
	3. 9. 2 ～ 3.10. 1	LTD	LTD	LTD
	3.10. 1 ～ 3.11. 5	LTD	LTD	LTD
	3.11. 5 ～ 3.12. 2	LTD	LTD	LTD
	3.12. 2 ～ 4. 1. 7	LTD	LTD	LTD
	4. 1. 7 ～ 4. 2. 3	LTD	LTD	LTD
	4. 2. 3 ～ 4. 3. 2	LTD	LTD	LTD
	4. 3. 2 ～ 4. 4. 2	LTD	LTD	LTD
	4. 4. 2 ～ 4. 5. 6	LTD	LTD	LTD
	4. 5. 6 ～ 4. 6. 2	LTD	LTD	LTD
	4. 6. 2 ～ 4. 7. 2	LTD	LTD	LTD
	4. 7. 2 ～ 4. 8. 5	LTD	LTD	LTD
	4. 8. 5 ～ 4. 9. 1	LTD	LTD	LTD
	4. 9. 1 ～ 4.10. 1	LTD	LTD	LTD
	4.10. 1 ～ 4.10.31	LTD	LTD	LTD

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
　　　ＮＤは検出下限値未満である。

単位：Ｂｑ／m²・月（30日換算値）

射性核種				天然放射性核種	
Co-58	Co-60	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	63.8± 0.8	10.7± 0.5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	61.9± 0.8	6.8 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	160 ± 1	3.5 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	199 ± 2	1.1 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	367 ± 2	4.9 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	531 ± 2	5.9 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	499 ± 2	3.1 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	419 ± 2	5.5 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	233 ± 1	1.8 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	120 ± 1	1.4 ± 0.2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	80.3± 0.9	2.0 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	266 ± 2	2.0 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	126 ± 1	1.3 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	42.1± 0.6	1.2 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	178 ± 1	2.1 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	211 ± 1	1.6 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	420 ± 2	2.2 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	516 ± 2	3.6 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	519 ± 2	3.0 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	490 ± 2	3.3 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	194 ± 1	0.9 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	213 ± 1	1.8 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	168 ± 1	1.1 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	86.7± 0.9	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	165 ± 1	1.4 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	108 ± 1	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	108 ± 1	1.4 ± 0.2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	271 ± 1	1.8 ± 0.2

(2) 核種分析（機器分析）（つづき）

a．降下物（雨水ちり）（つづき）

採取地点	採取期間	人工放		
		Cr-51	Mn-54	Fe-59
富来町福浦港 北陸電力実施分	2. 7. 2 ～ 2. 8. 2	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	2. 8. 2 ～ 2. 9. 4	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	2. 9. 4 ～ 2.10. 2	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	2.10. 2 ～ 2.11. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	2.11. 1 ～ 2.12. 3	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	2.12. 3 ～ 3. 1. 7	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 1. 7 ～ 3. 2. 4	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 2. 4 ～ 3. 3. 4	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 3. 4 ～ 3. 4. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 4. 1 ～ 3. 5. 7	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 5. 7 ～ 3. 6. 3	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 6. 3 ～ 3. 7. 2	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 7. 2 ～ 3. 8. 2	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 8. 2 ～ 3. 9. 2	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 9. 2 ～ 3.10. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3.10. 1 ～ 3.11. 5	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3.11. 5 ～ 3.12. 2	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3.12. 2 ～ 4. 1. 7	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 1. 7 ～ 4. 2. 3	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 2. 3 ～ 4. 3. 2	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 3. 2 ～ 4. 4. 2	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 4. 2 ～ 4. 5. 6	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 5. 6 ～ 4. 6. 2	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 6. 2 ～ 4. 7. 2	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 7. 2 ～ 4. 8. 5	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 8. 5 ～ 4. 9. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 9. 1 ～ 4.10. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4.10. 1 ～ 4.10.31	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
　　　ＮＤは検出下限値未満である。

単位：Ｂｑ／m^2・月（30日換算値）

射性核種				天然放射性核種	
Co-58	Co-60	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	68.7± 0.8	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	52.5± 0.7	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	164 ± 1	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	181 ± 1	1.2 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	350 ± 2	5.8 ± 0.5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	544 ± 2	7.5 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	517 ± 2	3.4 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	374 ± 2	5.9 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	211 ± 1	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	97.5± 0.8	0.9 ± 0.2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	76.8± 0.9	1.3 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	234 ± 2	1.2 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	104 ± 1	1.8 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	38.6± 0.6	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	84.8± 0.9	5.0 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	181 ± 1	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	417 ± 2	2.5 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	425 ± 2	3.5 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	563 ± 2	3.5 ± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	497 ± 2	3.7 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	224 ± 1	1.1 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	175 ± 1	1.7 ± 0.2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	158 ± 1	1.0 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	70.2± 0.8	0.8 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	142 ± 1	0.9 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	87 ± 1	1.8 ± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	105 ± 1	1.2 ± 0.2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	276 ± 1	1.5 ± 0.2

(2) 核種分析（機器分析）（つづき）

b．大気中放射性物質（大気浮遊じん）

採取地点	採取期間	人工放		
		Cr-51	Mn-54	Fe-59
志賀町安部屋（志賀局）石川県実施分（ダストサンプラー法）	2. 7. 6 ～ 2. 8. 2	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	2. 8. 2 ～ 2. 9. 3	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	2. 9. 3 ～ 2.10. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	2.10. 1 ～ 2.11. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	2.11. 1 ～ 2.12. 3	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	2.12. 3 ～ 3. 1. 7	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 1. 7 ～ 3. 2. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 2. 1 ～ 3. 3. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 3. 1 ～ 3. 4. 2	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 4. 2 ～ 3. 5. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 5. 1 ～ 3. 6. 3	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 6. 3 ～ 3. 7. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 7. 1 ～ 3. 8. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 8. 1 ～ 3. 9. 2	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 9. 2 ～ 3.10. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3.10. 1 ～ 3.11. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3.11. 1 ～ 3.11.29	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3.11.29 ～ 3.12.25	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3.12.25 ～ 4. 1.31	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 1.31 ～ 4. 2.28	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 2.28 ～ 4. 3.30	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 3.30 ～ 4. 4.28	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 4.28 ～ 4. 6. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 6. 1 ～ 4. 7. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 7. 1 ～ 4. 7.31	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 7.31 ～ 4. 8.31	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 8.31 ～ 4. 9.30	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 9.30 ～ 4.10.30	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
　　　ＮＤは検出下限値未満である。

単位：ｍＢｑ／ｍ^3

射	性	核	種	天然放射性核種	
Co-58	Co-60	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	1.7 ±0.1	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	1.77±0.07	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	2.26±0.09	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	2.87±0.07	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	1.88±0.09	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.17±0.06	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	2.22±0.09	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.3 ±0.1	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	6.6 ±0.2	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	6.5 ± 0.1	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	4.9 ± 0.1	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	2.8 ± 0.1	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	1.88±0.08	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	1.88±0.09	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	4.3 ± 0.2	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	5.5 ± 0.2	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	5.9 ± 0.1	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	6.2 ± 0.2	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	4.7 ± 0.1	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	4.8 ± 0.1	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	5.3 ± 0.1	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	5.7 ± 0.1	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	4.7 ± 0.1	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	4.1 ± 0.1	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.5 ± 0.1	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	2.9 ± 0.1	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	4.6 ± 0.1	Ｎ Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	6.3 ± 0.1	Ｎ Ｄ

(2) 核種分析（機器分析）（つづき）

b．大気中放射性物質（大気浮遊じん）（つづき）

採取地点	採取期間	人工放		
		Cr-51	Mn-54	Fe-59
富来町福浦港 （福浦局） 石川県実施分 （ハイボリウムエアサンプラー法）	2. 7. 2 ～ 2. 7. 6	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	2. 8. 2 ～ 2. 8. 7	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	2. 9. 3 ～ 2. 9.10	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	2.10. 1 ～ 2.10. 5	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	2.11. 1 ～ 2.11. 5	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	2.12. 3 ～ 2.12. 7	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 1. 7 ～ 3. 1.14	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 2. 1 ～ 3. 2. 5	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 3. 1 ～ 3. 3.14	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 4. 2 ～ 3. 4.16	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 4.16 ～ 3. 5. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 5. 1 ～ 3. 5.16	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 5.16 ～ 3. 6. 3	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 6. 3 ～ 3. 6.17	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 6.17 ～ 3. 7. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 7. 1 ～ 3. 7.16	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 7.16 ～ 3. 8. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 8. 1 ～ 3. 8.16	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 8.16 ～ 3. 9. 2	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 9. 2 ～ 3. 9.17	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 9.17 ～ 3.10. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3.10. 1 ～ 3.10.16	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3.10.16 ～ 3.11. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3.11. 1 ～ 3.11.15	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3.11.15 ～ 3.11.29	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3.11.29 ～ 3.12.13	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3.12.13 ～ 3.12.25	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
　　　ＮＤは検出下限値未満である。

単位：mBq／m³

射性核種				天然放射性核種	
Co-58	Co-60	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40
LTD	LTD	LTD	LTD	2.15±0.03	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	3.78±0.03	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	4.76±0.04	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	3.52±0.04	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	4.51±0.04	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	3.72±0.04	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	3.80±0.04	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	4.41±0.04	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	5.54±0.04	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	4.25±0.04	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	5.67±0.04	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	4.30±0.03	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	3.77±0.03	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	2.88±0.03	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	2.31±0.03	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	2.67±0.03	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	1.47±0.02	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	1.55±0.02	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	2.32±0.02	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	4.68±0.04	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	3.17±0.04	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	4.60±0.04	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	5.56±0.04	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	5.21±0.04	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	4.83±0.03	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	5.40±0.04	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	5.13±0.05	N D

(2) 核種分析（機器分析）（つづき）

b．大気中放射性物質（大気浮遊じん）（つづき）

採取地点	採取期間	人　　工　　放		
		Cr-51	Mn-54	Fe-59
富来町福浦港（福浦局）石川県実施部分（ﾊｲﾎﾞﾘｳﾑｴｱｻﾝﾌﾟﾗｰ法）	3.12.25 ～ 4. 1.13	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 1.13 ～ 4. 1.31	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 1.31 ～ 4. 2.14	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 2.14 ～ 4. 2.28	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 2.28 ～ 4. 3.16	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 3.16 ～ 4. 3.30	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 3.30 ～ 4. 4.16	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 4.16 ～ 4. 4.28	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 4.28 ～ 4. 5.15	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 5.15 ～ 4. 6. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 6. 1 ～ 4. 6.16	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 6.16 ～ 4. 7. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 7. 1 ～ 4. 7.15	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 7.15 ～ 4. 7.31	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 7.31 ～ 4. 8.17	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 8.17 ～ 4. 8.31	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 8.31 ～ 4. 9.16	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 9.16 ～ 4. 9.30	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4. 9.30 ～ 4.10.14	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	4.10.14 ～ 4.10.30	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
　　　ＮＤは検出下限値未満である。

単位：ｍＢｑ／ｍ^3

射	性	核	種	天然放射性核種	
Co-58	Co-60	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	5.15±0.04	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	5.91±0.04	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	5.08±0.04	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	5.41±0.04	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	6.98±0.04	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	5.69±0.04	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	5.71±0.04	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	5.44±0.05	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	5.24±0.04	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	5.10±0.04	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	4.50±0.04	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	4.01±0.03	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	4.40±0.04	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	1.80±0.02	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.23±0.04	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.69±0.02	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	4.08±0.02	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	2.42±0.03	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	5.31±0.04	Ｎ　Ｄ
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	1.51±0.02	Ｎ　Ｄ

(2) 核種分析（機器分析）（つづき）

b．大気中放射性物質（大気浮遊じん）（つづき）

採取地点	採取期間	人　工　放		
		Cr-51	Mn-54	Fe-59
金沢市三馬（衛生公害研究所）石川県実施分（ﾊｲﾎﾞﾘｳﾑｴｱｻﾝﾌﾟﾗｰ法）（比較対照地点）	2. 7. 2 ～ 2. 7. 6	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	2. 8. 2 ～ 2. 8. 7	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	2. 9. 3 ～ 2. 9.10	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	2.10. 1 ～ 2.10. 5	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	2.11. 1 ～ 2.11. 5	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	2.12. 3 ～ 2.12. 7	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 1. 7 ～ 3. 1.14	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 2. 1 ～ 3. 2. 5	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 3. 1 ～ 3. 3.14	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 4. 2 ～ 3. 4.16	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 4.16 ～ 3. 5. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 5. 1 ～ 3. 5.16	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 5.16 ～ 3. 6. 3	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 6. 3 ～ 3. 6.17	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 6.17 ～ 3. 7. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 7. 1 ～ 3. 7.16	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 7.16 ～ 3. 8. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 8. 1 ～ 3. 8.16	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 8.16 ～ 3. 9. 2	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 9. 2 ～ 3. 9.17	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3. 9.17 ～ 3.10. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3.10. 1 ～ 3.10.16	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3.10.16 ～ 3.11. 8	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3.11. 8 ～ 3.11.16	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3.11.16 ～ 3.11.30	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3.11.30 ～ 3.12.13	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	3.12.13 ～ 3.12.26	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
　　　ＮＤは検出下限値未満である。

単位：mBq／m³

射性核種				天然放射性核種	
Co-58	Co-60	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40
LTD	LTD	LTD	LTD	2.09±0.03	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	3.62±0.03	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	2.98±0.03	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	3.17±0.04	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	4.86±0.04	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	4.65±0.05	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	3.53±0.03	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	4.49±0.04	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	5.07±0.04	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	4.45±0.04	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	5.98±0.04	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	4.67±0.04	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	3.64±0.03	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	2.81±0.03	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	2.12±0.03	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	2.24±0.03	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	1.45±0.02	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	1.47±0.02	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	1.77±0.02	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	3.73±0.03	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	3.57±0.04	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	3.65±0.03	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	4.60±0.03	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	3.86±0.05	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	4.55±0.03	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	4.32±0.04	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	4.67±0.04	ND

⑵　核種分析（機器分析）（つづき）

b．大気中放射性物質（大気浮遊じん）（つづき）

採取地点	採取期間	人　工　放		
		Cr-51	Mn-54	Fe-59
金沢市三馬（衛生公害研究所）石川県実施分（ハイボリウムエアサンプラー法）（比較対照地点）	3.12.26 ～ 4. 1.17	LTD	LTD	LTD
	4. 1.17 ～ 4. 1.30	LTD	LTD	LTD
	4. 1.30 ～ 4. 2.14	LTD	LTD	LTD
	4. 2.14 ～ 4. 3. 2	LTD	LTD	LTD
	4. 3. 2 ～ 4. 3.19	LTD	LTD	LTD
	4. 3.25 ～ 4. 4. 6	LTD	LTD	LTD
金沢市太陽が丘（保健環境センター）石川県実施分（ハイボリウムエアサンプラー法）（比較対照地点）	4. 4. 6 ～ 4. 4.16	LTD	LTD	LTD
	4. 4.16 ～ 4. 4.28	――	――	――
	4. 4.28 ～ 4. 5.15	LTD	LTD	LTD
	4. 5.15 ～ 4. 6. 1	LTD	LTD	LTD
	4. 6. 1 ～ 4. 6.18	LTD	LTD	LTD
	4. 6.18 ～ 4. 7. 1	LTD	LTD	LTD
	4. 7. 1 ～ 4. 7.15	LTD	LTD	LTD
	4. 7.15 ～ 4. 8. 4	LTD	LTD	LTD
	4. 8. 4 ～ 4. 8.17	LTD	LTD	LTD
	4. 8.17 ～ 4. 8.31	LTD	LTD	LTD
	4. 8.31 ～ 4. 9.16	LTD	LTD	LTD
	4. 9.16 ～ 4. 9.30	LTD	LTD	LTD
	4. 9.30 ～ 4.10.14	LTD	LTD	LTD
	4.10.14 ～ 4.10.30	LTD	LTD	LTD

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
ＮＤは検出下限値未満である。
4. 4.16 ～ 4. 4.28は、機器故障のため欠測。
県衛生公害研究所の県保健環境センターへの名称変更と移転に伴い、県の

単位：mBq／m³

射	性	核	種	天然放射性核種	
Co-58	Co-60	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40
LTD	LTD	LTD	LTD	3.72±0.03	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	2.61±0.02	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	4.54±0.04	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	5.57±0.04	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	6.88±0.04	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	5.29±0.04	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	4.08±0.04	ND
——	——	——	——	——	——
LTD	LTD	LTD	LTD	4.36±0.04	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	3.74±0.03	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	4.60±0.04	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	4.21±0.04	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	4.23±0.04	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	2.03±0.02	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	2.87±0.04	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	1.97±0.03	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	3.31±0.03	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	4.49±0.04	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	4.05±0.04	ND
LTD	LTD	LTD	LTD	4.71±0.04	ND

比較対照地点の変更があった。

(2) 核種分析（機器分析）（つづき）

b．大気中放射性物質（大気浮遊じん）（つづき）

採取地点	採取期間	人工放		
		Cr-51	Mn-54	Fe-59
MP－2 北陸電力実施分 （ダストサンプラー法）	2. 7. 1 ～ 2. 7.31	LTD	LTD	LTD
	2. 8. 1 ～ 2. 8.31	LTD	LTD	LTD
	2. 9. 1 ～ 2. 9.30	LTD	LTD	LTD
	2.10. 1 ～ 2.10.31	LTD	LTD	LTD
	2.11. 1 ～ 2.11.30	LTD	LTD	LTD
	2.12. 1 ～ 2.12.31	LTD	LTD	LTD
	3. 1. 1 ～ 3. 1.31	LTD	LTD	LTD
	3. 2. 1 ～ 3. 2.28	LTD	LTD	LTD
	3. 3. 1 ～ 3. 3.31	LTD	LTD	LTD
	3. 4. 1 ～ 3. 4.30	LTD	LTD	LTD
	3. 5. 1 ～ 3. 5.31	LTD	LTD	LTD
	3. 6. 1 ～ 3. 6.30	LTD	LTD	LTD
	3. 7. 1 ～ 3. 7.31	LTD	LTD	LTD
	3. 8. 1 ～ 3. 8.31	LTD	LTD	LTD
	3. 9. 1 ～ 3. 9.30	LTD	LTD	LTD
	3.10. 1 ～ 3.10.31	LTD	LTD	LTD
	3.11. 1 ～ 3.11.30	LTD	LTD	LTD
	3.12. 1 ～ 3.12.31	LTD	LTD	LTD
	4. 1. 1 ～ 4. 1.31	LTD	LTD	LTD
	4. 2. 1 ～ 4. 2.29	LTD	LTD	LTD
	4. 3. 1 ～ 4. 3.31	LTD	LTD	LTD
	4. 4. 1 ～ 4. 4.30	LTD	LTD	LTD
	4. 5. 1 ～ 4. 5.31	LTD	LTD	LTD
	4. 6. 1 ～ 4. 6.30	LTD	LTD	LTD
	4. 7. 1 ～ 4. 7.31	LTD	LTD	LTD
	4. 8. 1 ～ 4. 8.31	LTD	LTD	LTD
	4. 9. 1 ～ 4. 9.30	LTD	LTD	LTD
	4.10. 1 ～ 4.10.31	LTD	LTD	LTD

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
　　　ＮＤは検出下限値未満である。

単位：ｍＢｑ／ｍ³

射性核種				天然放射性核種	
Co-58	Co-60	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40
LTD	LTD	LTD	LTD	2.09±0.07	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	2.97±0.06	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	3.92±0.06	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	5.25±0.06	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	4.80±0.06	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	5.97±0.06	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	4.62±0.06	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	4.91±0.06	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	6.35±0.07	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	5.02±0.06	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	4.48±0.06	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	2.06±0.04	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	1.80±0.04	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	1.94±0.05	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	4.49±0.06	0.25±0.05
LTD	LTD	LTD	LTD	4.68±0.05	0.11±0.04
LTD	LTD	LTD	LTD	5.48±0.06	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	5.66±0.07	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	5.96±0.06	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	5.35±0.06	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	6.43±0.08	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	5.87±0.07	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	4.03±0.05	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	4.35±0.05	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	3.03±0.05	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	2.02±0.04	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	3.76±0.05	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	4.47±0.06	N D

(2) 核種分析（機器分析）（つづき）

b．大気中放射性物質（大気浮遊じん）（つづき）

採取地点	採取期間	人工放		
		Cr-51	Mn-54	Fe-59
MP－6 北陸電力実施分 （ダストサンプラー法）	2. 7. 1 ～ 2. 7.31	LTD	LTD	LTD
	2. 8. 1 ～ 2. 8.31	LTD	LTD	LTD
	2. 9. 1 ～ 2. 9.30	LTD	LTD	LTD
	2.10. 1 ～ 2.10.31	LTD	LTD	LTD
	2.11. 1 ～ 2.11.30	LTD	LTD	LTD
	2.12. 1 ～ 2.12.31	LTD	LTD	LTD
	3. 1. 1 ～ 3. 1.31	LTD	LTD	LTD
	3. 2. 1 ～ 3. 2.28	LTD	LTD	LTD
	3. 3. 1 ～ 3. 3.31	LTD	LTD	LTD
	3. 4. 1 ～ 3. 4.30	LTD	LTD	LTD
	3. 5. 1 ～ 3. 5.31	LTD	LTD	LTD
	3. 6. 1 ～ 3. 6.30	LTD	LTD	LTD
	3. 7. 1 ～ 3. 7.31	LTD	LTD	LTD
	3. 8. 1 ～ 3. 8.31	LTD	LTD	LTD
	3. 9. 1 ～ 3. 9.30	LTD	LTD	LTD
	3.10. 1 ～ 3.10.31	LTD	LTD	LTD
	3.11. 1 ～ 3.11.30	LTD	LTD	LTD
	3.12. 1 ～ 3.12.31	LTD	LTD	LTD
	4. 1. 1 ～ 4. 1.31	LTD	LTD	LTD
	4. 2. 1 ～ 4. 2.29	LTD	LTD	LTD
	4. 3. 1 ～ 4. 3.31	LTD	LTD	LTD
	4. 4. 1 ～ 4. 4.30	LTD	LTD	LTD
	4. 5. 1 ～ 4. 5.31	LTD	LTD	LTD
	4. 6. 1 ～ 4. 6.30	LTD	LTD	LTD
	4. 7. 1 ～ 4. 7.31	LTD	LTD	LTD
	4. 8. 1 ～ 4. 8.31	LTD	LTD	LTD
	4. 9. 1 ～ 4. 9.30	LTD	LTD	LTD
	4.10. 1 ～ 4.10.31	LTD	LTD	LTD

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
　　　ＮＤは検出下限値未満である。

単位：mBq／m³

射性核種				天然放射性核種	
Co-58	Co-60	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40
LTD	LTD	LTD	LTD	2.11±0.07	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	2.77±0.06	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	3.98±0.06	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	5.75±0.07	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	4.83±0.06	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	5.93±0.06	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	4.41±0.06	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	5.04±0.07	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	6.41±0.07	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	5.02±0.06	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	4.55±0.06	0.13±0.04
LTD	LTD	LTD	LTD	3.03±0.05	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	1.85±0.04	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	1.75±0.04	0.16±0.05
LTD	LTD	LTD	LTD	4.27±0.06	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	4.74±0.06	0.16±0.04
LTD	LTD	LTD	LTD	5.00±0.06	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	5.22±0.07	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	5.88±0.06	0.16±0.05
LTD	LTD	LTD	LTD	4.62±0.07	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	5.91±0.07	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	5.42±0.07	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	4.03±0.05	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	3.57±0.05	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	2.79±0.05	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	2.28±0.05	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	4.29±0.06	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	4.11±0.06	N D

⑵ 核種分析（機器分析）（つづき）

c．陸水

測定試料		採取地点	採取年月日	人工放		
				Cr-51	Mn-54	Fe-59
水道水	県	志賀町高浜	2. 7. 2	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			2.10. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			3. 1. 7	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			3. 4. 5	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			3. 7.16	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			3.10.16	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			4. 1.13	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			4. 4.22	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			4. 7.15	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			4.10.14	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		富来町地頭	2. 7. 2	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			2.10. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			3. 1. 7	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			3. 4. 5	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			3. 7.16	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			3.10.16	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			4. 1.13	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			4. 4.22	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			4. 7.15	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			4.10.14	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
　　　ＮＤは検出下限値未満である。
　　　県は石川県実施分である。

単位：mBq／ℓ

射性核種				天然放射性核種	
Co-58	Co-60	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	70 ± 10
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	64 ± 9
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	73 ± 9
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	50 ± 10
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	50 ± 10
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	60 ± 10
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	58 ± 9
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	52 ± 10
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	50 ± 10
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	90 ± 10
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	40 ± 10
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	40 ± 9
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	42 ± 7
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	44 ± 8
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	45 ± 8
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	36 ± 8
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	34 ± 10
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	30 ± 9
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	30 ± 10

⑵ 核種分析（機器分析）（つづき）

c．陸水（つづき）

測定試料		採取地点	採取年月日	人工放		
				Cr-51	Mn-54	Fe-59
水道水	電	志賀町若葉台（能登中核工業団地）	2. 8. 7	LTD	LTD	LTD
			2.10.11	LTD	LTD	LTD
			3. 1.21	LTD	LTD	LTD
			3. 4.15	LTD	LTD	LTD
			3. 7.15	LTD	LTD	LTD
			3.10.15	LTD	LTD	LTD
			4. 1.20	LTD	LTD	LTD
			4. 4. 6	LTD	LTD	LTD
			4. 7.20	LTD	LTD	LTD
			4.10. 5	LTD	LTD	LTD
河川水	電	大坪川	2. 8. 7	LTD	LTD	LTD
			2.10.11	LTD	LTD	LTD
			3. 1.14	LTD	LTD	LTD
			3. 4.15	LTD	LTD	LTD
			3. 7.15	LTD	LTD	LTD
			3.10.15	LTD	LTD	LTD
			4. 1.20	LTD	LTD	LTD
			4. 4. 6	LTD	LTD	LTD
			4. 7.20	LTD	LTD	LTD
			4.10. 5	LTD	LTD	LTD

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
ＮＤは検出下限値未満である。
電は北陸電力実施分である。

単位：mBq／ℓ

射	性	核	種	天然放射性核種	
Co-58	Co-60	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	200 ± 10
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	240 ± 10
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	190 ± 10
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	210 ± 10
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	190 ± 10
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	170 ± 10
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	160 ± 10
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	200 ± 10
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	180 ± 10
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	185 ± 10
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	39 ± 9
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	43 ± 9
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	43 ± 8
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	53 ± 7
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	N D
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	62 ± 9
LTD	LTD	LTD	LTD	53 ± 6	60 ± 9
LTD	LTD	LTD	LTD	21 ± 5	49 ± 7
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	74 ± 7
LTD	LTD	LTD	LTD	N D	62 ± 8

(2) 核種分析（機器分析）（つづき）

d．土壌

採取地点		深さ(cm)	採取年月日	人工放		
				Cr-51	Mn-54	Fe-59
県	志賀町若葉台	0～5	2. 7.23	LTD	LTD	LTD
			3. 7. 8	LTD	LTD	LTD
			4. 7.22	LTD	LTD	LTD
		5～25	2. 7.23	LTD	LTD	LTD
			3. 7. 8	LTD	LTD	LTD
			4. 7.22	LTD	LTD	LTD
	志賀町直海	0～5	2. 7.23	LTD	LTD	LTD
			3. 7.19	LTD	LTD	LTD
			4. 7.22	LTD	LTD	LTD
		5～25	2. 7.23	LTD	LTD	LTD
			3. 7.19	LTD	LTD	LTD
			4. 7.22	LTD	LTD	LTD
電	発電所敷地内	0～5	2. 8. 9	LTD	LTD	LTD
			2.11.14	LTD	LTD	LTD
			3. 2. 7	LTD	LTD	LTD
			3. 5. 9	LTD	LTD	LTD
			3. 8.19	LTD	LTD	LTD
			3.11. 7	LTD	LTD	LTD
			4. 2. 5	LTD	LTD	LTD
			4. 5.19	LTD	LTD	LTD
			4. 8. 6	LTD	LTD	LTD
	志賀町赤住	0～5	2. 8. 9	LTD	LTD	LTD
			2.11.14	LTD	LTD	LTD
			3. 2. 7	LTD	LTD	LTD
			3. 5. 9	LTD	LTD	LTD
			3. 8.19	LTD	LTD	LTD
			3.11. 7	LTD	LTD	LTD
			4. 2. 5	LTD	LTD	LTD
			4. 5.19	LTD	LTD	LTD
			4. 8. 6	LTD	LTD	LTD

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
ＮＤは検出下限値未満である。
県は石川県実施分、電は北陸電力実施分である。

単位：Ｂｑ／ｋｇ乾土

射性核種				天然放射性核種	
Co-58	Co-60	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ Ｄ	48 ± 6
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	11 ± 2	53 ± 4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ Ｄ	43 ± 4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ Ｄ	41 ± 5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ Ｄ	40 ± 4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ Ｄ	44 ± 4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	104 ± 1	Ｎ Ｄ	430 ± 10
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	121 ± 1	Ｎ Ｄ	390 ± 10
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	120 ± 1	Ｎ Ｄ	400 ± 10
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	29.8± 0.8	Ｎ Ｄ	470 ± 10
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	22.7± 0.7	Ｎ Ｄ	440 ± 10
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.7± 0.9	Ｎ Ｄ	600 ± 10
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	71.4± 0.8	ＮＤ	331 ± 7
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	65.7± 0.7	ＮＤ	319 ± 6
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	59.4± 0.8	15 ± 3	319 ± 7
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	78.4± 0.8	Ｎ Ｄ	308 ± 7
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	67.7± 0.8	Ｎ Ｄ	291 ± 6
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	63.3± 0.7	Ｎ Ｄ	311 ± 6
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	42.7± 0.6	12 ± 2	300 ± 6
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	70.0± 0.7	10 ± 2	327 ± 6
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	87.6± 0.8	14 ± 3	309 ± 6
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	58.5± 0.8	ＮＤ	429 ± 9
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	41.7± 0.6	ＮＤ	444 ± 8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	37.7± 0.6	9 ± 3	430 ± 7
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	83.2± 0.8	Ｎ Ｄ	424 ± 7
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	14.7± 0.4	9 ± 2	299 ± 6
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	21.9± 0.5	Ｎ Ｄ	405 ± 7
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	15.4± 0.4	10 ± 2	359 ± 6
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.1± 0.3	10 ± 2	229 ± 6
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	4.1± 0.3	25 ± 3	226 ± 6

(2) 核種分析（機器分析）（つづき）

e．指標植物（松葉）

採取地点		種類	採取年月日	人工放		
				Cr-51	Mn-54	Fe-59
県	志賀町若葉台	1年葉	2. 8.22	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			2.11. 6	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			3. 2.20	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		2年葉	3. 5. 7	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		1年葉	3. 8.26	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			3.11. 8	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			4. 2.12	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		2年葉	4. 5.12	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		1年葉	4. 8.18	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	富来町三明	1年葉	2. 9. 3	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			2.11. 6	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			3. 2.20	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		2年葉	3. 5. 7	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		1年葉	3. 8.26	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			3.11. 8	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			4. 2.12	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		2年葉	4. 5.12	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		1年葉	4. 8.18	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
電	発電所敷地内	1年葉	2. 8. 9	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			2.11.14	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			3. 2. 7	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		2年葉	3. 5. 9	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		1年葉	3. 8.30	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			3.11. 7	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			4. 2. 5	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		2年葉	4. 5.19	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		1年葉	4. 8. 6	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	志賀町赤住	1年葉	2. 8. 9	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			2.11.14	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			3. 2. 7	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		2年葉	3. 5. 9	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		1年葉	3. 8.19	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			3.11. 7	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			4. 2. 5	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		2年葉	4. 5.19	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		1年葉	4. 8. 6	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
ＮＤは検出下限値未満である。
県は石川県実施分、電は北陸電力実施分である。

単位：Ｂｑ／ｋｇ生

射	性	核	種	天然放射性核種	
Co-58	Co-60	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	13.2± 0.3	94.1± 0.9
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	33.0± 0.3	79.2± 0.8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	27.3± 0.4	65.0± 0.8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	16.8± 0.3	60.1± 0.7
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	8.0± 0.2	83.7± 0.6
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	34.3± 0.3	71.5± 0.6
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	33.7± 0.4	74.0± 0.7
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	37.3± 0.5	58.7± 0.8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	13.3± 0.3	80.4± 0.8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	5.1± 0.1	101.0±0.8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	23.0± 0.3	80.8± 0.8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	57.0± 0.6	60.2± 0.8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	2.8± 0.5	48.5± 0.7
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	7.4± 0.2	52.8± 0.7
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	2.6± 0.3	84.0± 0.8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	8.0± 0.9	61.0± 0.6
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	37.1± 0.5	72 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	9.2± 0.3	100 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	4.6± 0.1	110 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.34±0.01	36.4± 0.2	86.9± 0.5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.62±0.01	38.9± 0.3	72.1± 0.5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.27±0.01	21.4± 0.2	75.3± 0.5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.25±0.01	8.7± 0.1	65.7± 0.5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.71±0.01	32.6± 0.2	82.9± 0.5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.65±0.02	34.3± 0.3	75.3± 0.6
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.41±0.01	40.4± 0.3	73.5± 0.5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.59±0.02	10.3± 0.2	90.2± 0.6
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.58±0.01	3.7± 0.1	110 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.43±0.01	41.6± 0.3	93.3± 0.6
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.34±0.01	41.7± 0.3	66.4± 0.5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.48±0.01	28.8± 0.2	77.5± 0.5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.41±0.02	15.6± 0.2	96.1± 0.7
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.33±0.01	33.9± 0.3	69.8± 0.5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.22±0.01	39.5± 0.3	68.3± 0.6
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.22±0.01	49.4± 0.3	77.0± 0.5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.31±0.01	13.1± 0.2	98.6± 0.6

(2) 核種分析（機器分析）（つづき）

f．農畜産物

測定試料		採取地点	採取年月日	人　　工　　放		
				Cr-51	Mn-54	Fe-59
牛乳	県	志賀町安部屋	2. 8. 7	LTD	LTD	LTD
			2.11. 6	LTD	LTD	LTD
			3. 2. 5	LTD	LTD	LTD
			3. 5.22	LTD	LTD	LTD
			3. 8. 7	LTD	LTD	LTD
			3.11.25	LTD	LTD	LTD
			4. 2.14	LTD	LTD	LTD
			4. 5.13	LTD	LTD	LTD
			4. 8.19	LTD	LTD	LTD
	電		2. 8. 7	LTD	LTD	LTD
			2.11.22	LTD	LTD	LTD
			3. 2.13	LTD	LTD	LTD
			3. 5. 9	LTD	LTD	LTD
			3. 8. 7	LTD	LTD	LTD
			3.11.15	LTD	LTD	LTD
			4. 2.18	LTD	LTD	LTD
			4. 5.13	LTD	LTD	LTD
			4. 8.19	LTD	LTD	LTD
精米	県	志賀町直海	2.10. 5	LTD	LTD	LTD
			3.10.25	LTD	LTD	LTD
			4.10.28	LTD	LTD	LTD
		富来町貝田	2.10. 8	LTD	LTD	LTD
			3.10.21	LTD	LTD	LTD
			4.10.22	LTD	LTD	LTD
	電	志賀町赤住	2.10. 8	LTD	LTD	LTD
			3.10.15	LTD	LTD	LTD
			4.10. 7	LTD	LTD	LTD
		志賀町直海	2.10. 8	LTD	LTD	LTD
			3.10.22	LTD	LTD	LTD
			4.10. 7	LTD	LTD	LTD

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
ＮＤは検出下限値未満である。
県は石川県実施分、電は北陸電力実施分である。

単位：牛乳はＢｑ／ℓ、精米はＢｑ／ｋｇ生

射	性	核	種	天然放射性核種	
Co-58	Co-60	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	49.1± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	52.8± 0.5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	52.6± 0.5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	45.0± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	48.2± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	50.9± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	47.5± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	47.9± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	46.0± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	50.6± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	53.8± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	57.8± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	54.2± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	56.4± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	51.0± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	52.7± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	52.8± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	49.9± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	27.9± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	23.4± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	32.2± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	23.7± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	27.6± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	35.0± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	32.9± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	27.5± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	33.9± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	32.3± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	32.5± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	29.0± 0.3

⑵ 核種分析（機器分析）（つづき）

f．農畜産物（つづき）

測定試料		採取地点	採取年月日	人　工　放		
				Cr-51	Mn-54	Fe-59
大　根（根）	県	志賀町赤住	2.11. 5	LTD	LTD	LTD
			3.11.15	LTD	LTD	LTD
			4.10.28	LTD	LTD	LTD
		志賀町直海	2.11. 5	LTD	LTD	LTD
			3.11.15	LTD	LTD	LTD
			4.10.28	LTD	LTD	LTD
		富来町福浦港	2.11. 5	LTD	LTD	LTD
			3.11.15	LTD	LTD	LTD
	電	志賀町五里峠	2.11.21	LTD	LTD	LTD
			3.12.11	LTD	LTD	LTD
白　菜	県	志賀町赤住	2.11.26	LTD	LTD	LTD
			3.11.25	LTD	LTD	LTD
		志賀町直海	2.11.26	LTD	LTD	LTD
			3.11.25	LTD	LTD	LTD
		富来町福浦港	2.11.26	LTD	LTD	LTD
			3.11.25	LTD	LTD	LTD
	電	志賀町赤住	2.11.26	LTD	LTD	LTD
			3.11.25	LTD	LTD	LTD
ｷｬﾍﾞﾂ	電	富来町牛下	2.11.13	LTD	LTD	LTD
			3.12. 2	LTD	LTD	LTD
スイカ	県	志賀町倉垣	2. 7.30	LTD	LTD	LTD
			3. 8. 5	LTD	LTD	LTD
			4. 7.31	LTD	LTD	LTD
	電	志賀町大津	2. 7.30	LTD	LTD	LTD
			3. 7.30	LTD	LTD	LTD
			4. 7.29	LTD	LTD	LTD
ころ柿（干柿）	県	志賀町矢田	2.12.18	LTD	LTD	LTD
			3.12.13	LTD	LTD	LTD
ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ	県	富来町貝田	2. 6. 1	LTD	LTD	LTD
			3. 5.22	LTD	LTD	LTD
			4. 5.20	LTD	LTD	LTD

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
　　　ＮＤは検出下限値未満である。
　　　県は石川県実施分、電は北陸電力実施分である。

単位：Ｂｑ／ｋｇ生

射	性	核	種	天然放射性核種	
Co-58	Co-60	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	66.1± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	59.6± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	68.0± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.18±0.05	73.9± 0.5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.12±0.04	59.2± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	62.9± 0.5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	78.5± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.14±0.04	85.6± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.29±0.03	66.0± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.40±0.02	57.9± 0.2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	1.01±0.05	63.0± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.70±0.06	74.9± 0.5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.45±0.04	56.7± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	1.35±0.06	71.0± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.18±0.03	63.4± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	1.21±0.08	92.4± 0.5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.74±0.04	55.9± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.57±0.07	90.6± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	69.3± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.13±0.04	84.5± 0.4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	37.8± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	67.2± 0.3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.06±0.02	38.0± 0.2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	33.3± 0.2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	21.1± 0.1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	39.1± 0.2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.20±0.04	Ｎ　Ｄ	207 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.25±0.03	Ｎ　Ｄ	196 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	71.3± 0.5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.12±0.04	74.0± 0.5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	59.7± 0.3

(2) 核種分析（機器分析）（つづき）

g．海水

採取地点		採取年月日	人工放		
			Cr-51	Mn-54	Fe-59
県	志賀町赤住（辰田）地先	2. 7.25		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 7.29		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 7.30		ＬＴＤ	ＬＴＤ
	志賀町赤住（宮の先）地先	2. 7.25		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 7.29		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 7.30		ＬＴＤ	ＬＴＤ
	富来町福浦港（吉良）地先	2. 7.25		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 7.29		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 7.30		ＬＴＤ	ＬＴＤ
電	放水口付近	2. 7.26		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		2.10.16		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 3.18		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 5.27		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 7.28		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3.10.17		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 3.23		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 5.27		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 8. 1		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4.10.21		ＬＴＤ	ＬＴＤ
	志賀町赤住（江野）地先	2. 7.26		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		2.10.16		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 3.18		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 5.27		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 7.27		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3.10.17		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 3.23		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 5.27		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 8. 1		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4.10.21		ＬＴＤ	ＬＴＤ
	富来町福浦港（丹和）地先	2. 7.26		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		2.10.16		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 3.18		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 5.27		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 7.28		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3.10.17		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 3.23		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 5.27		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 8. 1		ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4.10.21		ＬＴＤ	ＬＴＤ

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
県は石川県実施分、電は北陸電力実施分である。

単位：ｍＢｑ／ℓ

射性核種				天然放射性核種	
Co-58	Co-60	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.3 ± 0.5		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	2.4 ± 0.4		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	2.5 ± 0.5		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.2 ± 0.7		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.4 ± 0.5		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.1 ± 0.6		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.0 ± 0.6		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.6 ± 0.5		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.3 ± 0.7		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.6 ± 0.5		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	2.9 ± 0.5		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.2 ± 0.5		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	2.8 ± 0.5		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.5 ± 0.5		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.6 ± 0.5		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	4.3 ± 0.6		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	2.1 ± 0.5		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	2.8 ± 0.5		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.7 ± 0.5		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	2.4 ± 0.5		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.6 ± 0.6		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.2 ± 0.8		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.3 ± 0.5		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.1 ± 0.5		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.5 ± 0.5		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.0 ± 0.5		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.0 ± 0.5		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.8 ± 0.5		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.9 ± 0.5		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.1 ± 0.6		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	4.0 ± 0.5		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.2 ± 0.7		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.1 ± 0.5		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	2.4 ± 0.5		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.6 ± 0.5		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.1 ± 0.5		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	2.9 ± 0.5		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.5 ± 0.6		
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.0 ± 0.5		

⑵　核種分析（機器分析）（つづき）

h．海底土

採　取　地　点		採取年月日	人　工　放		
			Cr-51	Mn-54	Fe-59
県	志賀町赤住（辰田）地先	2. 7.25	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 7.29	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 7.30	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	志賀町赤住（宮の先）地先	2. 7.25	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 7.29	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 7.30	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	富来町福浦港（吉良）地先	2. 7.25	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 7.29	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 7.30	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
電	放水口付近	2. 7.28	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		2.10.20	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 3.21	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 5.29	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 7.28	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3.10.21	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 3.22	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 5.28	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 8. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4.10.20	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	志賀町赤住（江野）地先	2. 7.28	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		2.10.20	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 3.21	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 5.29	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 7.27	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3.10.21	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 3.22	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 5.28	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 7.27	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4.10.20	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	富来町福浦港（丹和）地先	2. 7.29	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		2.10.20	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 3.18	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 5.29	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 7.28	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3.10.21	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 3.22	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 5.28	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 7.27	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4.10.20	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
ＮＤは検出下限値未満である。
県は石川県実施分、電は北陸電力実施分である。

単位：Ｂｑ／ｋｇ乾土

射性核種				天然放射性核種	
Co-58	Co-60	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	690 ± 10
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	630 ± 10
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	20 ± 6	668 ± 14
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	700 ± 10
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	630 ± 10
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	650 ± 10
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	710 ± 10
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	670 ± 10
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	640 ± 10
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	752 ± 9
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	718 ± 8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	717 ± 9
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	692 ± 8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	684 ± 9
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	691 ± 8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	7 ± 2	732 ± 9
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	11 ± 2	739 ± 8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	8 ± 2	713 ± 9
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	5 ± 2	705 ± 8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	6 ± 2	725 ± 8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	670 ± 8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	737 ± 8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	732 ± 9
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	16 ± 2	713 ± 8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	690 ± 8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	7 ± 2	729 ± 9
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	10 ± 2	738 ± 9
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	733 ± 9
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	7 ± 2	716 ± 9
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	12 ± 2	760 ± 10
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	701 ± 8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	6 ± 2	709 ± 8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	683 ± 8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	10 ± 2	705 ± 8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	6 ± 2	720 ± 9
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	9 ± 2	733 ± 9
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	12 ± 2	755 ± 9
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	15 ± 2	697 ± 8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	6 ± 2	730 ± 9

(2) 核種分析（機器分析）（つづき）

i．指標海産物（ホンダワラ）

採　取　地　点		採取年月日	人　　　工　　　放		
			Cr-51	Mn-54	Fe-59
県	志賀町赤住（松戸）地先	2. 7.11	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		2.10.12	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 5.14	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 7. 3	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3.10.25	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 4.14	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 7. 6	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4.10. 7	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	志賀町百浦地先	2. 7.11	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		2.10.12	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 5.14	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 7. 3	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3.10.25	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 4.14	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 7. 6	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4.10. 7	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	富来町福浦港（水之間）地先	2. 7.10	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		2.10.11	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 5.21	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 7. 7	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3.10.24	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 4.28	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 7. 2	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4.10. 8	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	富来町福浦港（丹和）地先	2. 7.10	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		2.10.11	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 5.21	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 7. 7	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3.10.24	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 4.28	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 7. 2	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4.10. 8	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
　　　ＮＤは検出下限値未満である。
　　　県は石川県実施分である。

単位：Ｂｑ／ｋｇ生

射性核種				天然放射性核種	
Co-58	Co-60	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	261 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	2.1± 0.3	403 ± 3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	4.4± 0.4	291 ± 3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	7.3± 0.4	341 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.6± 0.4	331 ± 3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	14.5± 0.6	289 ± 3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	8.0± 0.4	197 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	8.0± 0.3	251 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.5± 0.3	393 ± 3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	4.2± 0.5	347 ± 3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	5.6± 0.5	275 ± 3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	1.2± 0.5	371 ± 3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	1.3± 0.3	274 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	4.9± 0.5	414 ± 3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	10.0± 0.5	189 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	9.8± 0.5	248 ± 3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.9± 0.2	281 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.30±0.05	6.8± 0.5	445 ± 3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.2± 0.3	268 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	1.7± 0.5	315 ± 3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.0± 0.3	332 ± 3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	6.4± 0.5	308 ± 3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	6.0± 0.5	345 ± 3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	2.0± 0.3	354 ± 3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	6.9± 0.4	312 ± 3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.20±0.06	3.0± 0.4	447 ± 4
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.7± 0.4	282 ± 3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	1.2± 0.5	406 ± 3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	2.7± 0.3	345 ± 3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.9± 0.3	348 ± 3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	5.5± 0.4	381 ± 3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	2.2± 0.3	402 ± 2

(2) 核種分析（機器分析）（つづき）

i．指標海産物（ホンダワラ）（つづき）

採　取　地　点		採取年月日	人　　　工　　　放		
			Cr-51	Mn-54	Fe-59
電	放水口付近	2. 7.27	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		2.10.12	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 3. 6	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 4.11	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 7.29	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3.10.25	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 3.10	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 4. 8	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 8. 4	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4.10. 7	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	志賀町赤住（江野）地先	2. 7.27	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		2.10.12	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 3. 6	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 4.11	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 7.29	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3.10.25	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 3.10	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 4. 8	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 8. 4	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4.10. 7	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	富来町福浦港（丹和）地先	2. 7.10	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		2.10.11	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 1.21	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 4.23	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3. 8. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		3.10.16	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 3.10	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 4.15	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4. 8. 3	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		4.10. 2	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
電は北陸電力実施分である。

単位：Ｂｑ／ｋｇ生

射	性	核	種	天然放射性核種	
Co-58	Co-60	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	1.6± 0.3	406 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	6.7± 0.5	365 ± 3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.3± 0.2	379 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	4.1± 0.3	337 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	7.5± 0.4	275 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	5.4± 0.3	399 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	6.2± 0.3	373 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	7.1± 0.3	346 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	1.3± 0.2	371 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	8.6± 0.3	255 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.2± 0.4	478 ± 3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	2.8± 0.4	445 ± 3
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	9.0± 0.3	364 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	9.1± 0.3	361 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	7.6± 0.4	359 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.8± 0.3	443 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	18.0± 0.5	341 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	13.1± 0.3	344 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	4.4± 0.4	310 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	5.9± 0.4	384 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	1.1± 0.3	402 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.1± 0.4	440 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	6.1± 0.3	452 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	1.3± 0.2	268 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.9± 0.2	416 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	1.7± 0.2	419 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	9.4± 0.4	396 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	3.5± 0.2	385 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	2.0± 0.3	383 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	2.2± 0.3	424 ± 2

⑵ 核種分析（機器分析）（つづき）

j．海産物

測定試料			採取地点	採取年月日	人工放		
					Cr-51	Mn-54	Fe-59
イワノリ		県	志賀町上野地先	2.12.18	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				4. 1.10	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			富来町吉良地先	2.12.20	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				3.12.18	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
ワカメ		県	志賀町赤住地先	3. 3.14	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				3. 4.26	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				4. 5. 8	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			富来町吉良地先	3. 3.25	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				3. 4.24	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				4. 4.28	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		電	志賀町赤住地先	3. 3.14	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				3. 4.11	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				4. 4.30	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
サザエ	県	肉	志賀町百浦地先	2. 9.10	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				3. 6.27	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				3. 9.18	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				4. 6.10	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				4. 9. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			富来町吉良地先	2. 9.17	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				3. 6.27	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				3. 9.13	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				4. 6.10	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				4. 9. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		内臓	志賀町百浦地先	2. 9.10	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				3. 6.27	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				3. 9.18	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				4. 6.10	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				4. 9. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
			富来町吉良地先	2. 9.17	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				3. 6.27	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				3. 9.13	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				4. 6.10	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				4. 9. 1	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
	電	肉	志賀町赤住地先	2. 7.20	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				3. 7.15	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				4. 7. 9	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
		内臓		2. 7.20	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				3. 7.15	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ
				4. 7. 9	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
　　　ＮＤは検出下限値未満である。
　　　県は石川県実施分、電は北陸電力実施分である。

単位：Ｂｑ／ｋｇ生

射	性	核	種	天然放射性核種	
Co-58	Co-60	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	1.3 ± 0.2	166 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	7.0 ± 0.3	266 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ Ｄ	226 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	1.1 ± 0.3	173 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ Ｄ	249 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.7 ± 0.2	167 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	1.5 ± 0.2	192 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.4 ± 0.1	164 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ Ｄ	154 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ Ｄ	158 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.9 ± 0.2	328 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	1.7 ± 0.2	267 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.8 ± 0.2	200 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.7 ± 0.2	85.3± 0.9
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.7 ± 0.1	76.2± 0.7
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.9 ± 0.2	76.6± 0.8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	1.0 ± 0.2	92 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.6 ± 0.1	86 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.7 ± 0.1	91.3± 0.9
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.6 ± 0.1	69.6± 0.7
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.7 ± 0.1	78.0± 0.8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ Ｄ	131 ± 2
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	1.1 ± 0.2	81 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	7.2 ± 0.3	69 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	8.7 ± 0.3	90 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.22±0.03	8.0 ± 0.3	61 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	13.1± 0.4	90 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	12.2± 0.3	78 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	7.0 ± 0.4	77 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	5.9 ± 0.3	87 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	8.6 ± 0.3	63.3± 0.9
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	1.3 ± 0.4	92 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	15.4± 0.4	65 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.8 ± 0.1	74.3± 0.5
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	2.0 ± 0.1	80.4± 0.6
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.66±0.08	83.1± 0.6
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	9.3 ± 0.3	69.7± 0.8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	11.0± 0.2	84.5± 0.8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	6.1 ± 0.2	94.2± 0.8

(2) 核種分析（機器分析）（つづき）

j．海産物（つづき）

測定試料			採取地点	採取年月日	人工放		
					Cr-51	Mn-54	Fe-59
チダイ	県	肉	志賀町沖	2. 9.10	LTD	LTD	LTD
				3. 9.18	LTD	LTD	LTD
				4. 9. 1	LTD	LTD	LTD
			富来町沖	2. 9.10	LTD	LTD	LTD
				3. 9.18	LTD	LTD	LTD
				4. 9. 8	LTD	LTD	LTD
マダイ	電	肉	志賀町沖	2. 7.16	LTD	LTD	LTD
				3. 7.10	LTD	LTD	LTD
				4. 7. 8	LTD	LTD	LTD
メバル	県	肉	志賀町沖	3. 3.20	LTD	LTD	LTD
				3. 4.26	LTD	LTD	LTD
				4. 4.22	LTD	LTD	LTD
			富来町沖	3. 3. 6	LTD	LTD	LTD
				3. 4.24	LTD	LTD	LTD
				4. 4.30	LTD	LTD	LTD
マガレイ	電	肉	志賀町沖	3. 3.13	LTD	LTD	LTD
				4. 3.11	LTD	LTD	LTD
ヒラメ	県	肉	志賀町沖	2.10.23	LTD	LTD	LTD
				3.10.16	LTD	LTD	LTD
				4.10.19	LTD	LTD	LTD
			富来町沖	2.10.19	LTD	LTD	LTD
				3.10.30	LTD	LTD	LTD
				4.10.14	LTD	LTD	LTD
	電	肉	志賀町沖	2.10.12	LTD	LTD	LTD
				3.10.17	LTD	LTD	LTD
				4.10. 8	LTD	LTD	LTD
キス	県	肉	志賀町沖	2. 9.10	LTD	LTD	LTD
				3. 8.26	LTD	LTD	LTD
				4. 6.10	LTD	LTD	LTD
			富来町沖	2. 9.25	LTD	LTD	LTD
				3. 8.12	LTD	LTD	LTD
				4. 6.10	LTD	LTD	LTD
マイワシ	電	肉	志賀町沖	3. 4.10	LTD	LTD	LTD
				3. 5.22	LTD	LTD	LTD
				4. 4.27	LTD	LTD	LTD

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
　　　ＮＤは検出下限値未満である。
　　　県は石川県実施分、電は北陸電力実施分である。

単位：Ｂｑ／ｋｇ生

射性核種				天然放射性核種	
Co-58	Co-60	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.20±0.03	Ｎ　Ｄ	133 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	113 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.24±0.02	Ｎ　Ｄ	129 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	127 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	101 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	132 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.20±0.01	Ｎ　Ｄ	140 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.23±0.01	Ｎ　Ｄ	139 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.20±0.01	Ｎ　Ｄ	138 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.23±0.01	Ｎ　Ｄ	98 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.23±0.01	Ｎ　Ｄ	92.0± 0.6
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.27±0.02	Ｎ　Ｄ	96.4± 0.8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.29±0.02	Ｎ　Ｄ	117 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.23±0.02	Ｎ　Ｄ	97.1± 0.8
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	88.1± 0.7
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	130 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	110 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.21±0.01	Ｎ　Ｄ	130 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	90.1± 0.6
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	132 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	125 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	117 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.29±0.02	Ｎ　Ｄ	159 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.20±0.01	Ｎ　Ｄ	148 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	154 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	135 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.23±0.02	Ｎ　Ｄ	130 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	101 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	102 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	129 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	103 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	87.2± 0.7
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	109 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	Ｎ　Ｄ	136 ± 1
ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	ＬＴＤ	0.33±0.09	115 ± 1

(2) 核種分析（機器分析）（つづき）

k．放射性ヨウ素

単位：牛乳はＢｑ／ℓ、他はＢｑ／ｋｇ生

<table>
<tr><th colspan="2">測定試料</th><th>採取地点</th><th>採取年月日</th><th>I-131</th></tr>
<tr><td rowspan="18">牛　乳</td><td rowspan="9">県</td><td rowspan="18">志賀町安部屋</td><td>2. 8. 7</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
<tr><td>2.11. 6</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
<tr><td>3. 2. 5</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
<tr><td>3. 5.22</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
<tr><td>3. 8. 7</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
<tr><td>3.11.25</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
<tr><td>4. 2.14</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
<tr><td>4. 5.13</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
<tr><td>4. 8.19</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
<tr><td rowspan="9">電</td><td>2. 8. 7</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
<tr><td>2.11.22</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
<tr><td>3. 2.13</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
<tr><td>3. 5. 9</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
<tr><td>3. 8. 7</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
<tr><td>3.11.15</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
<tr><td>4. 2.18</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
<tr><td>4. 5.13</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
<tr><td>4. 8.19</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
<tr><td rowspan="8">白　菜</td><td rowspan="6">県</td><td rowspan="2">志賀町赤住</td><td>2.11.26</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
<tr><td>3.11.25</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">志賀町直海</td><td>2.11.26</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
<tr><td>3.11.25</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">富来町福浦港</td><td>2.11.26</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
<tr><td>3.11.25</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">電</td><td rowspan="2">志賀町赤住</td><td>2.11.26</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
<tr><td>3.11.25</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ｷｬﾍﾞﾂ</td><td rowspan="2">電</td><td rowspan="2">富来町牛下</td><td>2.11.13</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
<tr><td>3.12. 2</td><td>ＬＴＤ</td></tr>
</table>

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
県は石川県実施分、電は北陸電力実施分である。

(2) 核種分析（機器分析）（つづき）

k．放射性ヨウ素（つづき）

単位：Ｂｑ／ｋｇ生

測定試料		採取地点	採取年月日	I-131
指標海産物（ホンダワラ）	県	志賀町赤住（松戸）地先	2. 7.11	ＬＴＤ
			2.10.12	ＬＴＤ
			3. 5.14	ＬＴＤ
			3. 7. 3	ＬＴＤ
			3.10.25	ＬＴＤ
			4. 4.14	ＬＴＤ
			4. 7. 6	ＬＴＤ
			4.10. 7	ＬＴＤ
		志賀町百浦地先	2. 7.11	ＬＴＤ
			2.10.12	ＬＴＤ
			3. 5.14	ＬＴＤ
			3. 7. 3	ＬＴＤ
			3.10.25	ＬＴＤ
			4. 4.14	ＬＴＤ
			4. 7. 6	ＬＴＤ
			4.10. 7	ＬＴＤ
		富来町福浦港（水之間）地先	2. 7.10	ＬＴＤ
			2.10.11	ＬＴＤ
			3. 5.21	ＬＴＤ
			3. 7. 7	ＬＴＤ
			3.10.24	ＬＴＤ
			4. 4.28	ＬＴＤ
			4. 7. 2	ＬＴＤ
			4.10. 8	ＬＴＤ
		富来町福浦港（丹和）地先	2. 7.10	ＬＴＤ
			2.10.11	ＬＴＤ
			3. 5.21	ＬＴＤ
			3. 7. 7	ＬＴＤ
			3.10.24	ＬＴＤ
			4. 4.28	ＬＴＤ
			4. 7. 2	ＬＴＤ
			4.10. 8	ＬＴＤ

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
県は石川県実施分である。

(2) 核種分析（機器分析）（つづき）

k．放射性ヨウ素（つづき）

単位：Ｂｑ／ｋｇ生

測定試料		採取地点	採取年月日	I-131
指標海産物（ホンダワラ）	電	放水口付近	2. 7.27	ＬＴＤ
			2.10.12	ＬＴＤ
			3. 3. 6	ＬＴＤ
			3. 4.11	ＬＴＤ
			3. 7.29	ＬＴＤ
			3.10.25	ＬＴＤ
			4. 3.10	ＬＴＤ
			4. 4. 8	ＬＴＤ
			4. 8. 4	ＬＴＤ
			4.10. 7	ＬＴＤ
		志賀町赤住（江野）地先	2. 7.27	ＬＴＤ
			2.10.12	ＬＴＤ
			3. 3. 6	ＬＴＤ
			3. 4.11	ＬＴＤ
			3. 7.29	ＬＴＤ
			3.10.25	ＬＴＤ
			4. 3.10	ＬＴＤ
			4. 4. 8	ＬＴＤ
			4. 8. 4	ＬＴＤ
			4.10. 7	ＬＴＤ
		富来町福浦港（丹和）地先	2. 7.10	ＬＴＤ
			2.10.11	ＬＴＤ
			3. 1.21	ＬＴＤ
			3. 4.23	ＬＴＤ
			3. 8. 1	ＬＴＤ
			3.10.16	ＬＴＤ
			4. 3.10	ＬＴＤ
			4. 4.15	ＬＴＤ
			4. 8. 3	ＬＴＤ
			4.10. 2	ＬＴＤ

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
電は北陸電力実施分である。

(2) 核種分析（機器分析）（つづき）

k．放射性ヨウ素（つづき）

単位：Ｂｑ／ｋｇ生

測定試料		採取地点	採取年月日	I-131
イワノリ	県	志賀町上野地先	2.12.18	ＬＴＤ
			4. 1.10	ＬＴＤ
		富来町吉良地先	2.12.20	ＬＴＤ
			3.12.18	ＬＴＤ
ワカメ	県	志賀町赤住地先	3. 3.14	ＬＴＤ
			3. 4.26	ＬＴＤ
			4. 5. 8	ＬＴＤ
		富来町吉良地先	3. 3.25	ＬＴＤ
			3. 4.24	ＬＴＤ
			4. 4.28	ＬＴＤ
	電	志賀町赤住地先	3. 3.14	ＬＴＤ
			3. 4.11	ＬＴＤ
			4. 4.30	ＬＴＤ

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
県は石川県実施分、電は北陸電力実施分である。

(3) 核種分析（放射化学分析）

a．放射性ストロンチウム

単位：土壌はＢｑ／ｋｇ乾土、牛乳はＢｑ／ℓ

測定試料			採取地点	採取年月日	Ｓｒ－９０
陸上試料	土壌	電	発電所敷地内	2. 8. 9	5.9 ± 0.3
				2.11.14	5.2 ± 0.3
				3. 2. 7	5.9 ± 0.3
				3. 5. 9	7.3 ± 0.3
				3. 8.19	9.5 ± 0.4
				3.11. 7	12.5 ± 0.4
				4. 2. 5	5.5 ± 0.3
				4. 5.19	4.9 ± 0.3
				4. 8. 6	7.6 ± 0.3
			志賀町赤住	2. 8. 9	5.8 ± 0.3
				2.11.14	2.3 ± 0.2
				3. 2. 7	5.9 ± 0.3
				3. 5. 9	5.4 ± 0.3
				3. 8.19	2.3 ± 0.2
				3.11. 7	5.2 ± 0.2
				4. 2. 5	1.9 ± 0.2
				4. 5.19	2.2 ± 0.2
				4. 8. 6	2.1 ± 0.2
	牛乳	県	志賀町安部屋	2. 8. 7	0.024±0.006
				2.11. 6	0.027±0.008
				3. 2. 5	0.027±0.007
				3. 5.22	0.027±0.009
				3. 8. 7	0.039±0.006
				3.11.25	0.026±0.005
				4. 2.14	0.035±0.006
				4. 5.13	0.032±0.005
				4. 8. 9	0.021±0.004

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
県は石川県実施分、電は北陸電力実施分である。

(3) 核種分析（放射化学分析）

a．放射性ストロンチウム（つづき）

単位：Ｂｑ／ｋｇ生

測定試料			採取地点	採取年月日	Ｓｒ－９０
陸上試料	精米	県	志賀町直海	2.10. 5	ＬＴＤ
				3.10.25	ＬＴＤ
				4.10.28	ＬＴＤ
			富来町貝田	2.10. 8	ＬＴＤ
				3.10.21	ＬＴＤ
				4.10.22	ＬＴＤ
	大根（根）	県	志賀町赤住	2.11. 5	0.15 ± 0.01
				3.11.15	0.14 ± 0.01
				4.10.28	0.186± 0.010
			志賀町直海	2.11. 5	0.11 ± 0.01
				3.11.15	ＬＴＤ
				4.10.28	ＬＴＤ
			富来町福浦港	2.11. 5	0.23 ± 0.02
				3.11.15	0.12 ± 0.01
		電	志賀町五里峠	2.11.21	0.73 ± 0.02
				3.12.11	0.06 ± 0.01
	白菜	県	志賀町赤住	2.11.26	0.17 ± 0.01
				3.11.25	0.14 ± 0.01
			志賀町直海	2.11.26	0.22 ± 0.01
				3.11.25	0.26 ± 0.02
			富来町福浦港	2.11.26	0.08 ± 0.01
				3.11.25	0.25 ± 0.02
	キャベツ	電	富来町牛下	2.11.13	0.23 ± 0.01
				3.12. 2	0.06 ± 0.01

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
県は石川県実施分、電は北陸電力実施分である。

(3) 核種分析（放射化学分析）

a．放射性ストロンチウム（つづき）

単位：Ｂｑ／ｋｇ乾土

測定試料			採取地点	採取年月日	Ｓｒ－９０
海洋試料	海底土	電	放水口付近	2. 7.28	ＬＴＤ
				2.10.20	ＬＴＤ
				3. 3.21	ＬＴＤ
				3. 5.29	ＬＴＤ
				3. 7.28	ＬＴＤ
				3.10.21	ＬＴＤ
				4. 3.22	ＬＴＤ
				4. 5.28	ＬＴＤ
				4. 8. 1	ＬＴＤ
				4.10.20	ＬＴＤ
			志賀町赤住（江野）地先	2. 7.28	ＬＴＤ
				2.10.20	ＬＴＤ
				3. 3.21	ＬＴＤ
				3. 5.29	ＬＴＤ
				3. 7.27	ＬＴＤ
				3.10.21	ＬＴＤ
				4. 3.22	ＬＴＤ
				4. 5.28	ＬＴＤ
				4. 7.27	ＬＴＤ
				4.10.20	ＬＴＤ
			富来町福浦港（丹和）地先	2. 7.29	ＬＴＤ
				2.10.20	ＬＴＤ
				3. 3.18	ＬＴＤ
				3. 5.29	ＬＴＤ
				3. 7.28	ＬＴＤ
				3.10.21	ＬＴＤ
				4. 3.22	ＬＴＤ
				4. 5.28	ＬＴＤ
				4. 7.27	ＬＴＤ
				4.10.20	ＬＴＤ

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
電は北陸電力実施分である。

(3) 核種分析（放射化学分析）

a．放射性ストロンチウム（つづき）

単位：Ｂｑ／ｋｇ生

測定試料				採取地点	採取年月日	Ｓｒ－９０
海洋試料	ワカメ		県	志賀町赤住地先	3. 3.14	ＬＴＤ
					3. 4.26	ＬＴＤ
					4. 5. 8	ＬＴＤ
				富来町吉良地先	3. 3.25	ＬＴＤ
					3. 4.24	ＬＴＤ
					4. 4.28	ＬＴＤ
	サザエ	県	肉	志賀町百浦地先	2. 9.10	ＬＴＤ
					3. 6.27	ＬＴＤ
					3. 9.18	ＬＴＤ
					4. 6.10	ＬＴＤ
					4. 9. 1	ＬＴＤ
				富来町吉良地先	2. 9.17	ＬＴＤ
					3. 6.27	ＬＴＤ
					3. 9.13	ＬＴＤ
					4. 6.10	ＬＴＤ
					4. 9. 1	ＬＴＤ
			内臓	志賀町百浦地先	2. 9.10	ＬＴＤ
					3. 6.27	ＬＴＤ
					3. 9.18	ＬＴＤ
					4. 6.10	ＬＴＤ
					4. 9. 1	ＬＴＤ
				富来町吉良地先	2. 9.17	ＬＴＤ
					3. 6.27	ＬＴＤ
					3. 9.13	ＬＴＤ
					4. 6.10	ＬＴＤ
					4. 9. 1	ＬＴＤ
	チダイ	県	肉	志賀町沖	2. 9.10	ＬＴＤ
					3. 9.18	ＬＴＤ
					4. 9. 1	ＬＴＤ
				富来町沖	2. 9.10	ＬＴＤ
					3. 9.18	ＬＴＤ
					4. 9. 8	ＬＴＤ
	メバル	県	肉	志賀町沖	3. 3.20	ＬＴＤ
					3. 4.26	ＬＴＤ
					4. 4.22	ＬＴＤ
				富来町沖	3. 3. 6	ＬＴＤ
					3. 4.24	ＬＴＤ
					4. 4.30	ＬＴＤ

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
県は石川県実施分、電は北陸電力実施分である。

(2) 核種分析（放射化学分析）

b．トリチウム

単位：Ｂｑ／ℓ

測定試料			採取地点	採取年月日	H－3
陸水	水道水	県	志賀町高浜	2. 7. 2	1.7 ± 0.2
				2.10. 1	1.8 ± 0.2
				3. 1. 7	1.6 ± 0.2
				3. 4. 5	1.4 ± 0.2
				3. 7.16	1.9 ± 0.2
				3.10.16	1.8 ± 0.2
				4. 1.13	1.5 ± 0.2
				4. 4.22	1.5 ± 0.2
				4. 7.15	1.5 ± 0.2
				4.10.14	1.4 ± 0.2
			富来町地頭	2. 7. 2	1.4 ± 0.2
				2.10. 1	1.2 ± 0.2
				3. 1. 7	1.2 ± 0.2
				3. 4. 5	1.2 ± 0.2
				3. 7.16	1.1 ± 0.2
				3.10.16	1.5 ± 0.2
				4. 1.13	1.2 ± 0.2
				4. 4.22	ＬＴＤ
				4. 7.15	ＬＴＤ
				4.10.14	ＬＴＤ
		電	志賀町若葉台（能登中核工業団地）	2. 8. 7	ＬＴＤ
				2.10.11	ＬＴＤ
				3. 1.21	ＬＴＤ
				3. 4.15	ＬＴＤ
				3. 7.15	ＬＴＤ
				3.10.15	ＬＴＤ
				4. 1.20	ＬＴＤ
				4. 4. 6	ＬＴＤ
				4. 7.20	ＬＴＤ
				4.10. 5	ＬＴＤ
	河川水	電	大坪川	2. 8. 7	ＬＴＤ
				2.10.11	1.1 ± 0.3
				3. 1.14	ＬＴＤ
				3. 4.15	ＬＴＤ
				3. 7.15	ＬＴＤ
				3.10.15	ＬＴＤ
				4. 1.20	1.5 ± 0.3
				4. 4. 6	ＬＴＤ
				4. 7.20	ＬＴＤ
				4.10. 5	ＬＴＤ

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
県は石川県実施分、電は北陸電力実施分である。

(2) 核種分析（放射化学分析）
b. トリチウム（つづき）

単位：Ｂｑ／ℓ

測定試料		採取地点	採取年月日	H－3
海水	県	志賀町赤住（辰田）地先	2. 7.25	ＬＴＤ
			3. 7.29	ＬＴＤ
			4. 7.30	ＬＴＤ
		志賀町赤住（宮の先）地先	2. 7.25	ＬＴＤ
			3. 7.29	ＬＴＤ
			4. 7.30	ＬＴＤ
		富来町福浦港（吉良）地先	2. 7.25	ＬＴＤ
			3. 7.29	ＬＴＤ
			4. 7.30	ＬＴＤ
	電	放水口付近	2. 7.26	ＬＴＤ
			2.10.16	ＬＴＤ
			3. 3.18	ＬＴＤ
			3. 5.27	ＬＴＤ
			3. 7.28	ＬＴＤ
			3.10.17	ＬＴＤ
			4. 3.23	ＬＴＤ
			4. 5.27	ＬＴＤ
			4. 8. 1	ＬＴＤ
			4.10.21	ＬＴＤ
		志賀町赤住（江野）地先	2. 7.26	ＬＴＤ
			2.10.16	ＬＴＤ
			3. 3.18	ＬＴＤ
			3. 5.27	ＬＴＤ
			3. 7.27	ＬＴＤ
			3.10.17	ＬＴＤ
			4. 3.23	ＬＴＤ
			4. 5.27	ＬＴＤ
			4. 8. 1	ＬＴＤ
			4.10.21	ＬＴＤ
		富来町福浦港（丹和）地先	2. 7.26	ＬＴＤ
			2.10.16	ＬＴＤ
			3. 3.18	ＬＴＤ
			3. 5.27	ＬＴＤ
			3. 7.28	ＬＴＤ
			3.10.17	ＬＴＤ
			4. 3.23	ＬＴＤ
			4. 5.27	ＬＴＤ
			4. 8. 1	ＬＴＤ
			4.10.21	ＬＴＤ

（注）ＬＴＤは検出目標レベル未満である。
県は石川県実施分、電は北陸電力実施分である。

3．気象要素

(1) 風向・風速

石川県実施分

観測地点		測定年月	最多風向（16方位）	風速（m／s）	
				最高値	平均値
志賀町	① 志賀局	2年 7月	東北東	9．6	2．6
		8月	東北東	10．2	2．6
		9月	東北東	11．4	2．6
		10月	北東	8．7	2．2
		11月	北東	16．3	3．3
		12月	西	17．0	4．2
		3年 1月	北西	12．4	3．2
		2月	北西	16．1	4．0
		3月	東北東	9．8	2．6
		4月	東北東	13．5	2．7
		5月	北東	9．8	2．8
		6月	東北東	8．6	2．7
		7月	南西	14．6	3．2
		8月	東北東	8．7	2．4
		9月	北東	19．8	2．6
		10月	北東	9．6	2．6
		11月	北東	13．9	2．8
		12月	北東	20．0	2．8
		4年 1月	北東	14．8	3．1
		2月	北西	12．0	2．9
		3月	北東	7．5	2．5
		4月	北東	12．0	3．3
		5月	北東	9．1	2．9
		6月	北東	8．3	2．6
		7月	西南西	9．0	2．8
		8月	北東	10．9	2．5
		9月	北東	13．5	2．4
		10月	北東	12．7	2．6
		期間	北東	20．0	2．8

（注）観測地点：地上12m

(1) 風向・風速（つづき）
石川県実施分

観測地点		測定年月	最多風向（16方位）	風速（m／s）	
				最高値	平均値
志賀町	② 赤住局	2年 7月	東北東	8．9	2．5
		8月	東北東	10．6	2．5
		9月	東北東	12．4	2．7
		10月	東北東	10．2	2．5
		11月	東北東	20．0	3．7
		12月	南西	19．8	4．8
		3年 1月	東北東	18．0	4．4
		2月	北西	18．4	5．0
		3月	東北東	10．7	2．9
		4月	東北東	16．7	2．8
		5月	東北東	11．3	2．6
		6月	東北東	11．8	2．3
		7月	南西	13．2	2．7
		8月	東北東	7．3	2．4
		9月	東北東	13．2	2．8
		10月	東北東	12．8	3．0
		11月	東北東	15．1	3．2
		12月	東北東	19．4	3．1
		4年 1月	東北東	18．1	3．5
		2月	北西	13．6	3．2
		3月	東北東	8．7	2．8
		4月	東北東	13．9	3．2
		5月	東北東	9．1	2．7
		6月	東北東	9．4	2．8
		7月	南西	7．8	2．2
		8月	東北東	11．3	2．8
		9月	東北東	14．0	2．8
		10月	東北東	17．9	3．4
		期間	東北東	20．0	3．0

（注）観測地点：地上10m

(1) 風向・風速（つづき）
石川県実施分

観測地点		測定年月	最多風向（16方位）	風速（m／s）	
				最高値	平均値
志賀町	③ 直海局	2年 7月	西南西	6.2	1.6
		8月	北西	7.8	1.6
		9月	東北東	7.1	1.6
		10月	北西	6.2	1.2
		11月	北西	10.9	1.8
		12月	西南西	11.9	2.5
		3年 1月	北西	9.8	1.9
		2月	北西	9.5	2.5
		3月	北西	7.4	1.7
		4月	北西	9.3	1.7
		5月	北西	7.4	1.7
		6月	南西	6.5	1.6
		7月	南西	8.6	1.9
		8月	東北東	6.1	1.5
		9月	東北東	13.1	1.7
		10月	北西	7.8	1.6
		11月	北西	8.0	1.5
		12月	北西	14.8	1.7
		4年 1月	北西	9.4	1.8
		2月	北西	10.0	1.9
		3月	北西	6.0	1.7
		4月	北西	8.9	2.1
		5月	北西	7.0	1.8
		6月	北西	5.9	1.6
		7月	南西	6.8	1.8
		8月	東北東	7.4	1.5
		9月	北西	11.0	1.5
		10月	北西	8.1	1.6
		期間	北西	14.8	1.7

（注）観測地点：地上10m

(1) 風向・風速（つづき）
石川県実施分

観測地点		測定年月	最多風向（16方位）	風速（m／s）	
				最高値	平均値
富来町	④ 福浦局	2年 7月	東南東	5．7	1．4
		8月	東南東	7．5	1．5
		9月	東南東	13．4	1．6
		10月	東南東	12．9	1．7
		11月	南東	13．5	2．4
		12月	南東	17．0	3．7
		3年 1月	北北西	15．1	3．7
		2月	北北西	17．2	4．2
		3月	北北西	13．9	2．1
		4月	東南東	11．8	1．7
		5月	東南東	7．8	1．8
		6月	東南東	5．8	1．4
		7月	南東	8．5	1．8
		8月	東南東	6．9	1．3
		9月	東	12．8	1．4
		10月	東	11．7	2．0
		11月	東	16．4	2．4
		12月	東南東	15．5	2．6
		4年 1月	北西	13．7	2．9
		2月	北西	12．8	3．2
		3月	北西	7．8	1．9
		4月	東	10．3	2．2
		5月	東南東	8．2	1．8
		6月	北西	6．4	1．6
		7月	南西	5．4	1．5
		8月	東	15．3	1．3
		9月	東	8．6	1．7
		10月	東南東	9．9	1．9
		期間	東南東	17．2	2．1

（注）観測地点：地上10m

(1) 風向・風速（つづき）
石川県実施分

観測地点		測定年月	最多風向（16方位）	風速（m／s） 最高値	風速（m／s） 平均値
富来町	⑤ 熊野局	2年 7月	西北西	6.7	1.6
		8月	北西	10.4	1.6
		9月	東南東	7.7	1.4
		10月	北西	6.2	1.1
		11月	北西	13.5	1.7
		12月	西	12.3	2.7
		3年 1月	北西	11.6	2.3
		2月	北西	10.8	2.9
		3月	北西	7.3	1.5
		4月	北西	8.8	1.6
		5月	北西	7.5	1.7
		6月	西北西	6.0	1.6
		7月	南西	8.8	1.9
		8月	東南東	6.0	1.3
		9月	東南東	15.2	1.4
		10月	北西	7.8	1.5
		11月	北西	8.4	1.5
		12月	北北西	12.5	1.7
		4年 1月	北西	10.0	1.8
		2月	北北西	8.2	2.0
		3月	北西	5.7	1.3
		4月	北西	9.3	2.1
		5月	西北西	7.2	1.7
		6月	西北西	6.6	1.4
		7月	西南西	6.8	1.8
		8月	東南東	8.8	1.3
		9月	北北西	8.0	1.3
		10月	北西	7.9	1.3
		期間	北西	15.2	1.7

（注）観測地点：地上10m

(1) 風向・風速（つづき）
石川県実施分

観測地点		測定年月	最多風向（16方位）	風速（m／s）	
				最高値	平均値
辰口町	⑥ 辰口局（比較対照局）	2年 7月	南東	8.5	1.7
		8月	南東	10.7	2.0
		9月	南東	10.3	2.0
		10月	南東	8.5	1.7
		11月	南東	11.6	2.2
		12月	南東	12.4	3.1
		3年 1月	南東	10.9	2.3
		2月	南東	11.5	2.9
		3月	北北東	8.2	2.0
		4月	南東	12.9	2.1
		5月	南東	9.1	2.1
		6月	南南西	11.2	1.9
		7月	西南西	14.3	2.4
		8月	南東	6.5	1.6
		9月	南東	17.8	1.9
		10月	南東	8.8	2.0
		11月	南東	8.3	2.1
		12月	南東	18.0	2.6
		4年 1月	南東	10.4	2.4
		2月	南	9.0	2.6
		3月	北北東	6.7	2.0
		4月	南東	11.8	2.6
		5月	南東	11.4	2.3
		6月	南東	10.6	1.7
		7月	西南西	9.1	2.0
		8月	南東	9.5	1.5
		9月	南東	16.0	2.1
		10月	南東	10.9	1.8
		期間	南東	17.8	2.1

（注）観測地点：鉄筋コンクリート建物屋上

(1) 風向・風速（つづき）
北陸電力実施分

観測地点	測定年月	最多風向（１６方位）	風速（m／s）	
			最高値	平均値
発電所敷地内（気象観測鉄塔）	２年　７月	東北東	８．０	２．５
	８月	東北東	９．５	３．０
	９月	東北東	１０．４	３．４
	１０月	北　東	７．４	２．６
	１１月	東北東	８．９	３．３
	１２月	南　西	１１．１	４．０
	３年　１月	北　西	１０．２	３．５
	２月	北　西	１０．１	４．１
	３月	東北東	９．９	３．０
	４月	東北東	９．６	２．７
	５月	東北東	７．８	２．７
	６月	東北東	６．６	２．４
	７月	東北東	１１．４	２．８
	８月	東北東	６．２	２．４
	９月	東北東	１９．９	２．９
	１０月	東北東	１０．０	２．７
	１１月	東北東	８．４	３．１
	１２月	東北東	１６．６	３．２
	４年　１月	東北東	８．５	３．２
	２月	北　西	１６．２	３．２
	３月	東北東	８．３	３．２
	４月	東北東	１０．７	２．９
	５月	東北東	８．０	２．６
	６月	東北東	８．０	２．６
	７月	南　西	６．５	２．５
	８月	東北東	６．２	２．３
	９月	東北東	９．６	２．７
	１０月	東北東	７．４	３．０
	期　間	東北東	１９．９	２．９

（注）観測地点：地上１０m

風　　配　　図 (期間：平成２年７月～４年６月)

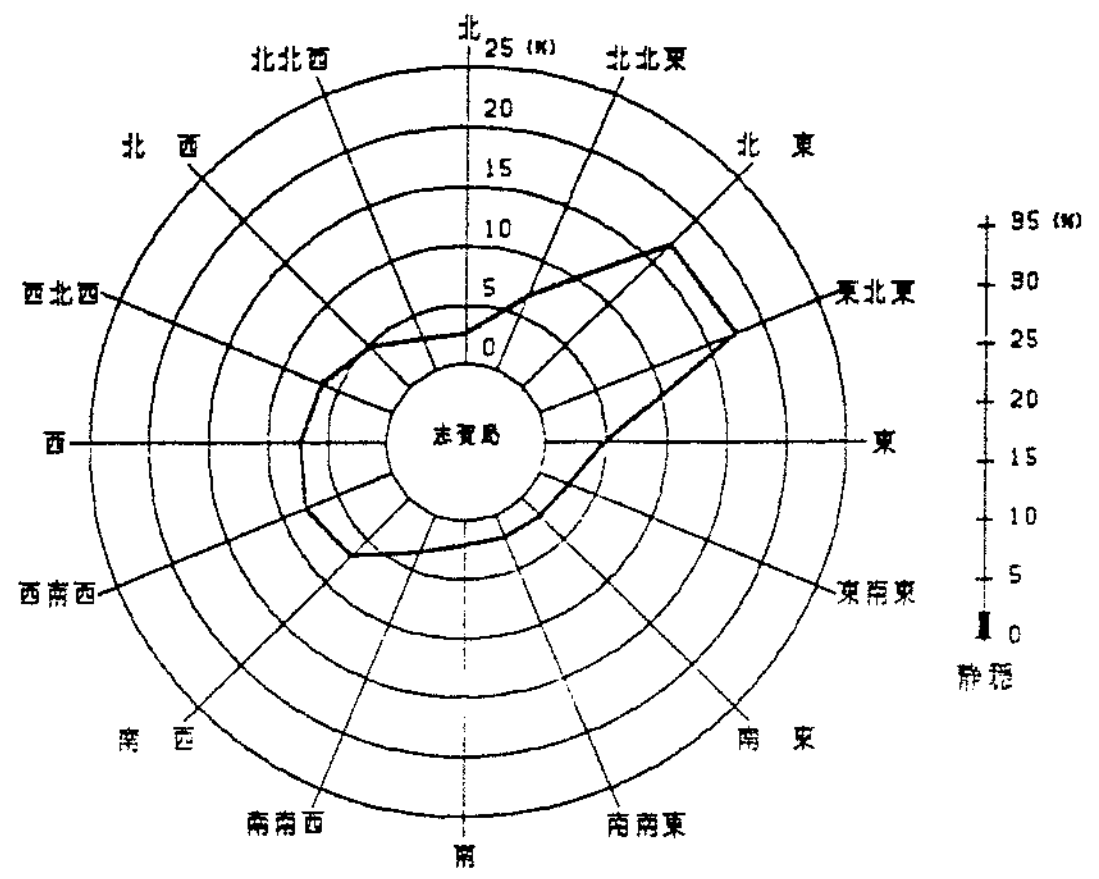

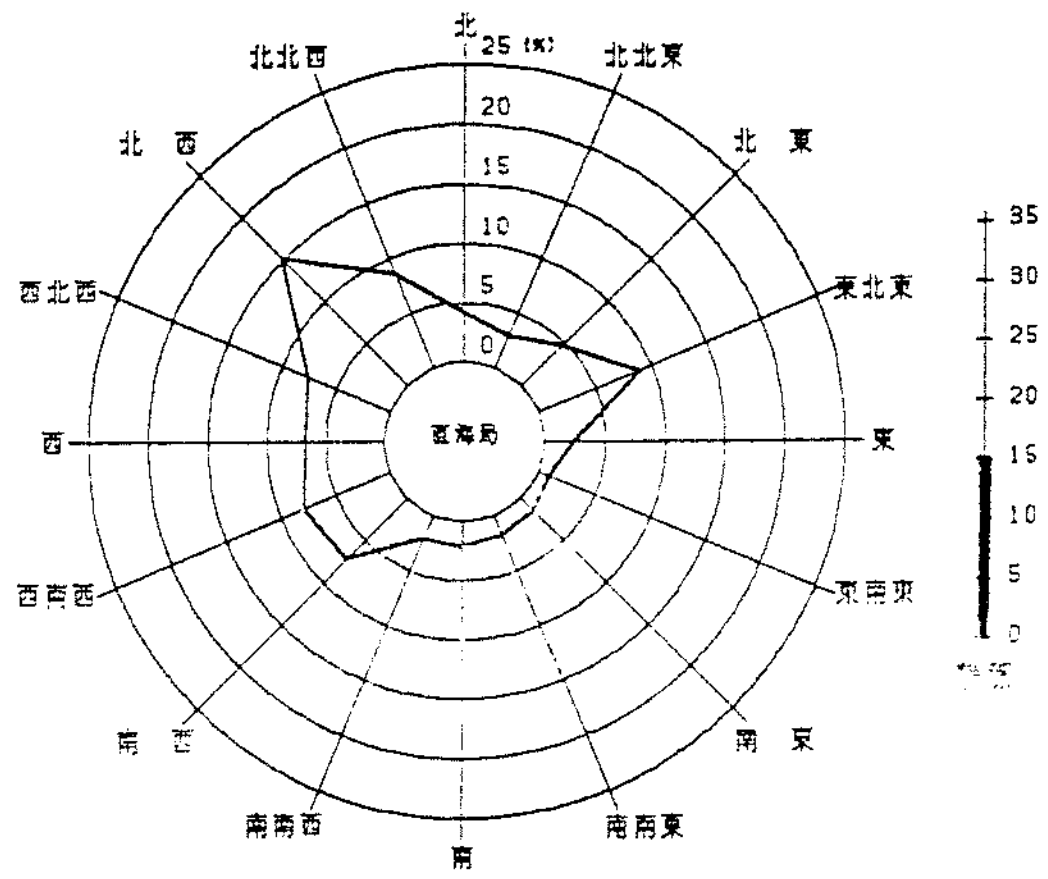

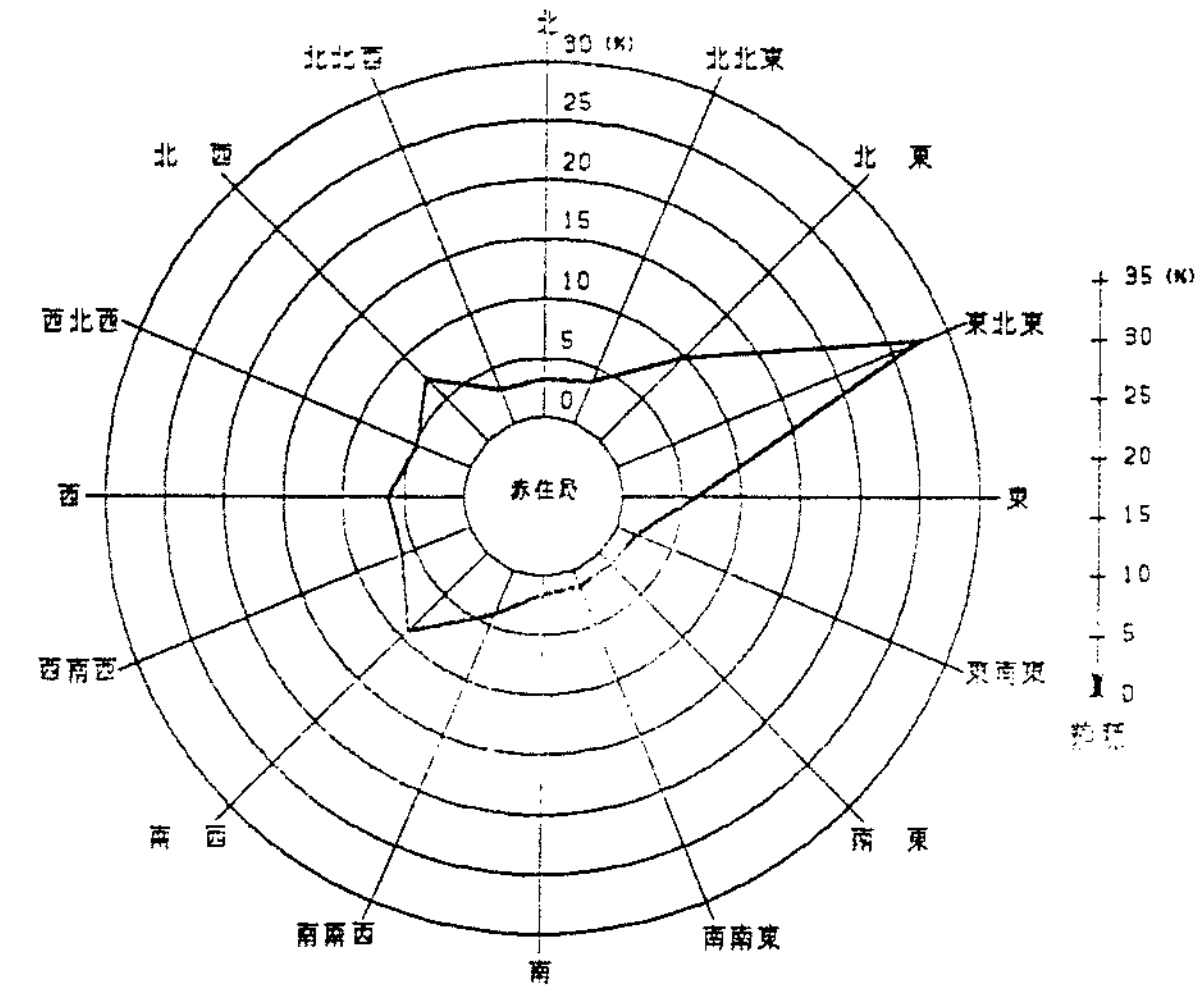

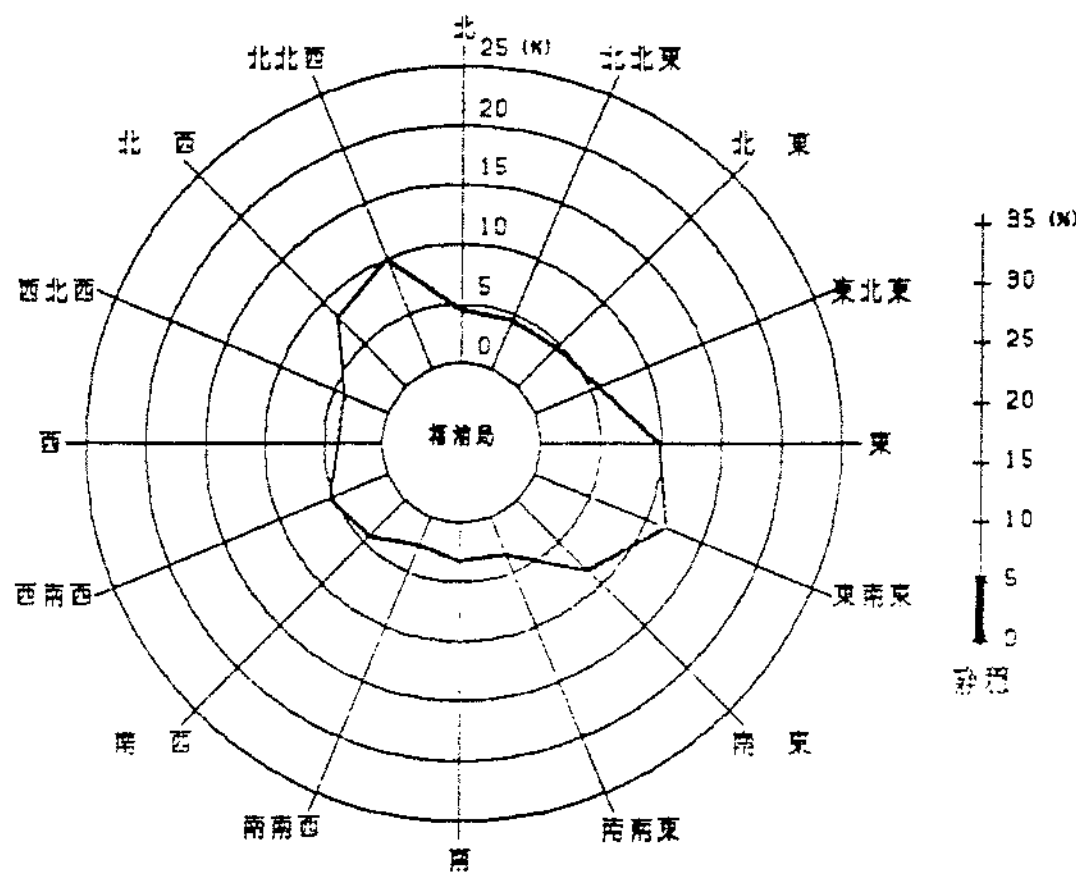

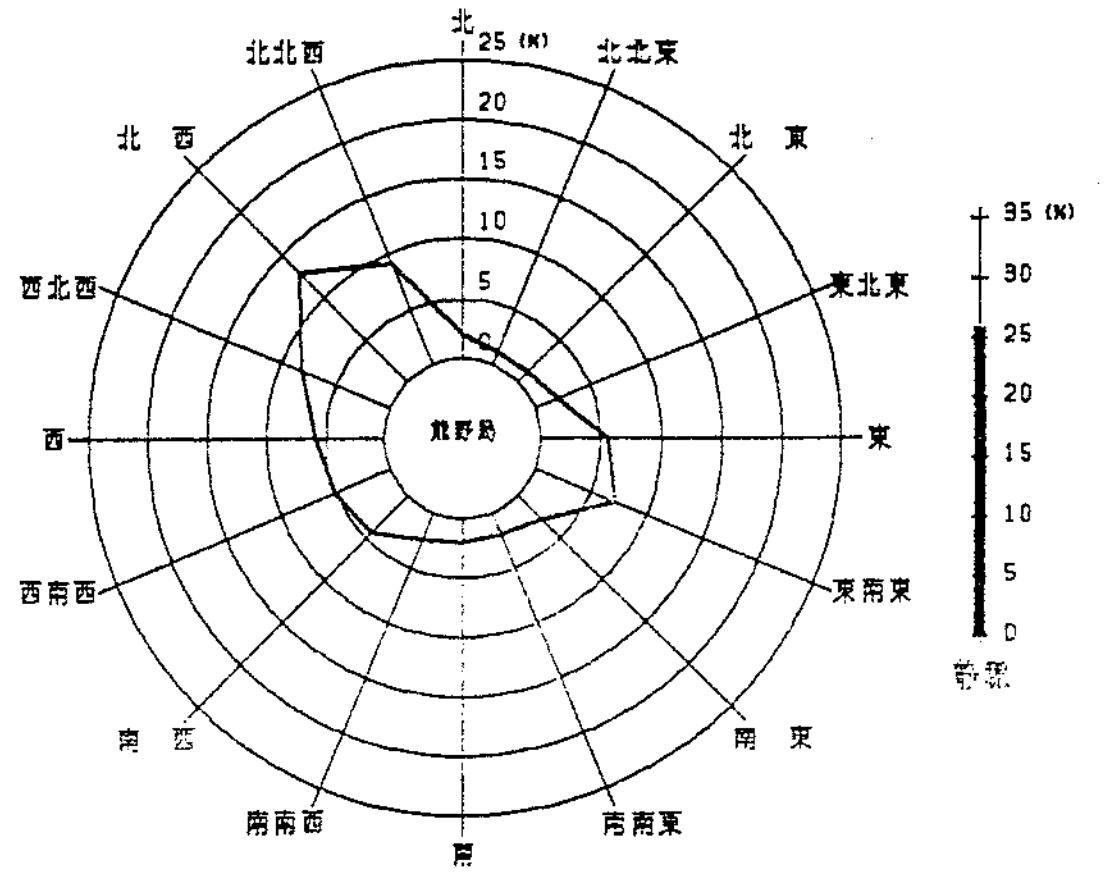
北
25 (%)
20
15
10
5
0
北北西
北北東
北西
北東
西北西
東北東
西
龍野局
東
西南西
東南東
南西
南東
南南西
南南東
南
35 (%)
30
25
20
15
10
5
0
静穏

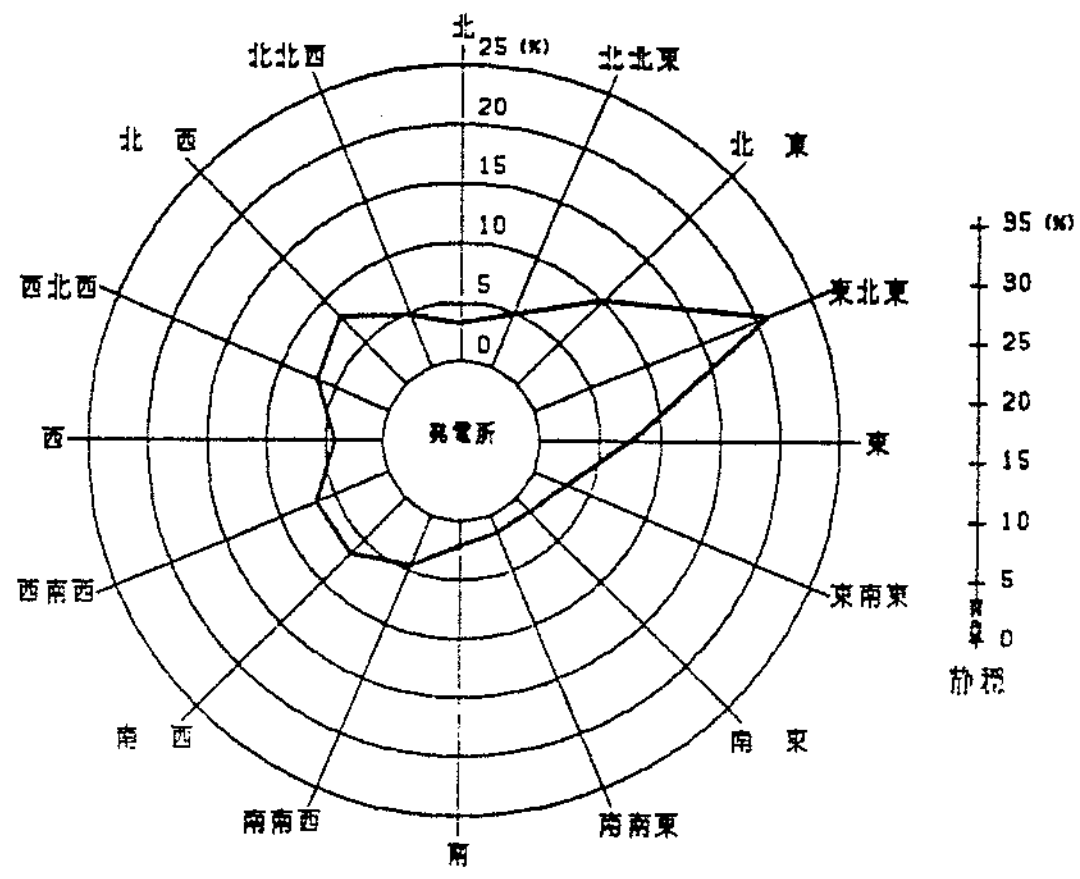
北
25 (%)
20
15
10
5
0
北北西
北北東
北西
北東
西北西
東北東
西
発電所
東
西南西
東南東
南西
南東
南南西
南南東
南
35 (%)
30
25
20
15
10
5
0
静穏

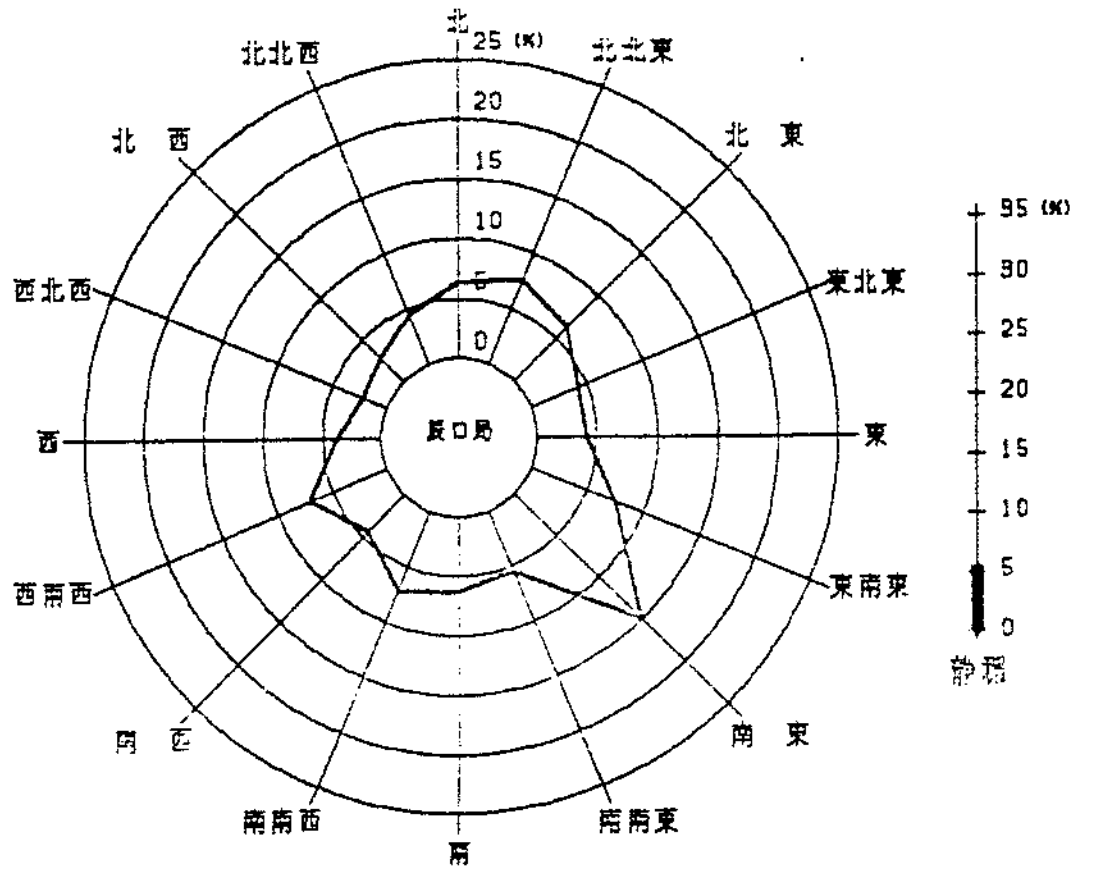
北
25 (%)
20
15
10
5
0
北北西
北北東
北西
北東
西北西
東北東
西
辰口局
東
西南西
東南東
南西
南東
南南西
南南東
南
35 (%)
30
25
20
15
10
5
0
静穏

参　　　　　考

【目　次】

1．測定方法

(1) 空間放射線

項目		測定方法	測定機器
線量率	県	測定法：「連続モニタによる環境γ線測定法（昭和57.7科学技術庁）」に準拠 測定位置：地上1.8m（辰口局を除く5局） 鉄筋コンクリート建物屋上（辰口局） 測定エネルギー範囲 ：50 keV ～ 3 MeV 校正線源：Ra-226、Co-60、Cs-137	線量率測定器 3″ φ×3″ NaI(Tl)シンチレーション検出器
	電	測定法：「連続モニタによる環境γ線測定法（昭和57.7科学技術庁）」に準拠 測定位置：鉄骨造建物屋上（地上約4m） 測定エネルギー範囲 ：50 keV ～ 3 MeV 校正線源：Ra-226、Co-60、Cs-137	線量率測定器 2″ φ×2″ NaI(Tl)シンチレーション検出器

（注）県は石川県実施分、電は北陸電力実施分である。

(1) 空間放射線（つづき）

項　目		測　定　方　法	測　定　機　器
積算線量	県	測定法：「熱ルミネセンス線量計を用いた環境γ線量測定法（平成 2.2〔改訂〕科学技術庁）」に準拠 測定本数：地点当り 4 本（8 素子） 収納容器：塩化ビニル製 測定位置：地上1.5m 校正線源：Cs-137	熱蛍光線量計 ＴＬＤ素子 素子主成分：$CaSO_4$(Tm) ＴＬＤ読取装置
	電	測定法：「熱ルミネセンス線量計を用いた環境γ線量測定法（平成 2.2〔改訂〕科学技術庁）」に準拠 測定本数：地点当り 4 本（8 素子） 収納容器：木製 測定位置：地上1.5m 校正線源：Cs-137	熱蛍光線量計 ＴＬＤ素子 素子主成分：$CaSO_4$(Tm) ＴＬＤ読取装置

（注）県は石川県実施分、電は北陸電力実施分である。

(2) 環境試料中の放射能

<table>
<tr><th colspan="2">項　目</th><th>測　定　方　法</th><th>測　定　機　器</th></tr>
<tr><td rowspan="3">大気中放射性物質</td><td>県</td><td>測定法：大気浮遊じんの連続採取及び全アルファ、全ベータ放射能測定
捕集材：ろ紙（TOYO　HE-40T）
捕集方式：捕集材連続移動方式
吸引量：約 200ℓ／分
吸引口高さ：地上2.2m
校正線源：U_3O_8</td><td>大気中放射性物質測定装置
・ZnS(Ag)シンチレーション検出器
（全アルファ放射能）
・プラスチックシンチレーション検出器
（全ベータ放射能）</td></tr>
<tr><td>県</td><td>測定法：ヨウ素モニタによる大気中放射性ヨウ素測定
捕集材：ろ紙（TOYO　HE-40T）、チャコールフィルタ及びチャコールカートリッジ
捕集方式：捕集材自動交換方式
吸引量：約50ℓ／分
吸引口高さ：地上2.2m
校正線源：模擬ヨウ素
（Ba-133及びCs-137）</td><td>・2″ φ×2″ NaI(Tl)シンチレーション検出器</td></tr>
<tr><td>電</td><td>測定法：大気浮遊じんの連続採取及び全ベータ放射能測定
捕集材：ろ紙（TOYO　HE-40T）
捕集方式：捕集材連続移動方式
吸引量：約 250ℓ／分
吸引口高さ：地上2.5m
校正線源：U_3O_8</td><td>大気中放射性物質測定装置
・プラスチックシンチレーション検出器</td></tr>
</table>

（注）県は石川県実施分、電は北陸電力実施分である。

(2) 環境試料中の放射能（つづき）

項　目		測　定　方　法	測　定　機　器
核種分析 （機器分析）	県	測定法：「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー（平成 2.11〔改訂〕科学技術庁）」に準拠 「ゲルマニウム半導体検出器等を用いる機器分析のための試料の前処理法（昭和57.7科学技術庁）」に準拠 「放射性ヨウ素分析法（昭和52.10〔改訂〕科学技術庁）」に準拠 〔試料採取方法〕 （大気浮遊じん） (1)ﾀﾞｽﾄｻﾝﾌﾟﾗｰ法（大気浮遊じんの連続採取及び全アルファ、全ベータ放射能測定の項参照） (2)ﾊｲﾎﾞﾘｳﾑｴｱｻﾝﾌﾟﾗｰ法 捕集材：ろ紙（TOYO GB-100R ） 吸引量：約 800ℓ／分 吸引口高さ：地上1.1m 〔試料測定形態〕 降下物（雨水ちり） ：蒸発濃縮物 大気中放射性物質（大気浮遊じん） ：灰化物（ﾀﾞｽﾄｻﾝﾌﾟﾗｰ法） ：ろ紙（ﾊｲﾎﾞﾘｳﾑｴｱｻﾝﾌﾟﾗｰ法）	ゲルマニウム半導体検出器付核種分析装置 相対効率：約25〜40％ 分解能　：約1.9 keV 遮蔽材　：　鉄　　：　55mm 鉛　　：100mm 無酸素銅：　5mm アクリル：　5mm

（注）県は石川県実施分である。

(2) 環境試料中の放射能（つづき）

項目		測定方法	測定機器
核種分析 （機器分析）	県	陸　水（水道水） 　：蒸発濃縮物 土　壌（2層） 　：乾燥細土 指標植物（松葉） 　：灰化物 畜産物（牛乳） 　：灰化物（I-131は生試料） 農産物：灰化物（白菜中I-131は生試料） 海　水：AMP-MnO_2法による共沈物 海底土：乾燥細土 指標海産物（ホンダワラ） 　：灰化物（I-131は生試料） 海産物：灰化物（イワノリ、ワカメ中 　I-131は生試料） 〔測定容器〕 灰化物、蒸発濃縮物、乾燥細土、共沈物 　：U-8 容器又はそれに準じたもの 生試料：マリネリ容器	ゲルマニウム半導体検出器付核種分析装置 相対効率：約25～40％ 分解能　：約1.9 keV 遮蔽材　：鉄　：55mm 　鉛　：100mm 　無酸素銅：5mm 　アクリル：5mm

（注）県は石川県実施分である。

⑵ 環境試料中の放射能（つづき）

項目		測定方法	測定機器
核種分析 （機器分析）	電	測定法：「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー（平成 2.11〔改訂〕科学技術庁）」に準拠 「ゲルマニウム半導体検出器等を用いる機器分析のための試料の前処理法（昭和57.7科学技術庁）」に準拠 「放射性ヨウ素分析法（昭和52.10〔改訂〕科学技術庁）」に準拠 〔試料採取方法〕 （大気浮遊じん） ﾀﾞｽﾄｻﾝﾌﾟﾗｰ法（大気浮遊じんの連続採取及び全ベータ放射能測定の項参照） 〔試料測定形態〕 降下物（雨水ちり） ：蒸発濃縮物 大気中放射性物質（大気浮遊じん） ：灰化物（１カ月間のろ紙） 陸　水（水道水、河川水） ：蒸発濃縮物	ゲルマニウム半導体検出器付核種分析装置 相対効率：約４０％ 分解能　：約1.9 keV 遮蔽材　：　鉄　　：　６０mm 鉛　　：１００mm 無酸素銅：　５mm アクリル：　５mm

（注）電は北陸電力実施分である。

(2) 環境試料中の放射能（つづき）

<table>
<tr><th colspan="2">項　　目</th><th>測　定　方　法</th><th>測　定　機　器</th></tr>
<tr><td>核種分析
(機器分析)</td><td>電</td><td>土　壌：乾燥細土
指標植物（松葉）
　　　：灰化物
畜産物（牛乳）
　　　：灰化物（Ｉ-131は生試料）
農産物：灰化物（葉菜中Ｉ-131は生試料）
海　水：AMP-MnO_2法による共沈物
海底土：乾燥細土
指標海産物（ホンダワラ）
　　　：灰化物（Ｉ-131は生試料）
海産物：灰化物（ワカメ中Ｉ-131は生試料）

〔測定容器〕
灰化物、蒸発濃縮物、乾燥細土、共沈物
　　　：U-8 容器
生試料：マリネリ容器</td><td>ゲルマニウム半導体検出器付核種分析装置
相対効率：約４０％
分解能　：約1.9 keV
遮蔽材　：　鉄　　：　６０mm
　　　　　　鉛　　：１００mm
　　　　　無酸素銅：　５mm
　　　　　アクリル：　５mm</td></tr>
</table>

（注）電は北陸電力実施分である。

(2) 環境試料中の放射能（つづき）

項目		測定方法	測定機器
核種分析（放射化学分析）放射性ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ	県	測定法：「放射性ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ分析法（昭和58.12 ［改訂］科学技術庁）」に準拠 〔測定容器〕 25㎜φステンレススチール皿	低バックグラウンド放射能自動測定装置 測定効率：約20～30％ 遮蔽材　：　鉛　　：約 100 ㎜
	電	測定法：「放射性ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ分析法（昭和58.12 ［改訂］科学技術庁）」に準拠 〔測定容器〕 25㎜φステンレススチール皿	低バックグラウンド放射能自動測定装置 測定効率：約30～40％ 遮蔽材　：　鉛　　：約 100 ㎜
核種分析（放射化学分析）ﾄﾘﾁｳﾑ	県	測定法：「ﾄﾘﾁｳﾑ分析法（昭和52. 10科学技術庁）」に準拠 〔測定容器〕 100㎖テフロン瓶	低バックグラウンド液体シンチレーション計測装置 測定効率：約20～25％ 遮蔽材　：　鉛　　：約 100 ㎜
	電	測定法：「ﾄﾘﾁｳﾑ分析法（昭和52. 10科学技術庁）」に準拠 〔測定容器〕 100㎖テフロン瓶	低バックグラウンド液体シンチレーション計測装置 測定効率：約10～15％ 遮蔽材　：　鉛　　：約 100 ㎜

（注）県は石川県実施分である。
　　　電は北陸電力実施分である。

(3) 気象要素

項目		測定方法	測定機器
風向	県	尾翼－制御シンクロ方式	風向風速計
	電		
風速	県	プロペラー光パルス方式	
	電	プロペラーパルス方式	
日射量	県	銅－コンスタンタン熱電対方式	日射計
放射収支量	県	銅－コンスタンタン熱電対方式	放射収支計
気温	県	白金測温抵抗方式	温度計
	電		
湿度	県	毛髪－差動トランス方式	湿度計
降水量	県	温水加温漏斗－転倒升方式	雨雪量計
積雪深	県	温度補償式超音波反射方式	積雪深計
感雨雪	県	電極面短絡電流方式	感雨雪計
感雷	県	空中電荷感知方式	感雷計

(注) 県は石川県実施分、電は北陸電力実施分である。

2．測定値の取扱い

項目				単位	測定
空間放射線			線量率	nGy／h	小数第1位まで 有効数字3桁
空間放射線			積算線量	mGy／91日	有効数字2桁又は
環境試料中の放射能	大気中放射性物質		全アルファ放射能	Bq／m^3	有効数字3桁又は
	大気中放射性物質		全ベータ放射能	Bq／m^3	有効数字3桁又は
	大気中放射性物質		放射性ヨウ素	Bq／m^3	有効数字3桁又は
	核種分析	機器分析	降下物	Bq／m^2・月	・有効数字は原則
		機器分析	大気中放射性物質	mBq／m^3	・計数誤差を併記
		機器分析	陸水・海水	mBq／ℓ	・放射能濃度が検 し、検出下限値
		機器分析	土壌・海底土	Bq／kg乾土	濃度をN、計数 を検出下限値未
		機器分析	農水産生物	Bq／kg生	
		機器分析	牛乳	Bq／ℓ	・降下物は30日換
		放射化学分析	ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ 土壌・海底土	Bq／kg乾土	
		放射化学分析	ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ 農水産生物	Bq／kg生	
		放射化学分析	ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ 牛乳	Bq／ℓ	
		放射化学分析	ﾄﾘﾁｳﾑ 陸水・海水	Bq／ℓ	
気象要素			風向	16方位	
気象要素			風速	m／s	小数第1位まで

（注）数値の丸め方は四捨五入とする。

北陸電力の気象要素の1時間値については、正時前10分値を1時間値

値　　の　　取　　扱　　い	備　考
（石　川　県） （北 陸 電 力）	１０分値
小数第２位まで	
小数第１位まで（石川県のみ）	石川県 ：１０分値 北陸電力 ：１時間値
小数第１位まで	
小数第１位まで（石川県のみ）	
として２桁 （原則として測定値と同じ位まで） 出目標レベル未満の場合はＬＴＤと 未満の場合はＮＤとする。（放射能 誤差をΔＮとしたとき、Ｎ＜３ΔＮ 満とする。） 算値	
	石川県 ：１０分値 北陸電力 ：１時間値

とする。

3．検出目標レベル

ゲルマニウム半導体検出器による測定は、検出器の性能、試料の形状、測定時間等により検出下限
次表に試料毎の核種別の検出目標レベルを示す。

測定試料		測定条件			Cr－51	Mn－54
		供試料量	試料形状等	測定時間		
陸上試料	降下物（雨水ちり）	月間全量（0.5 m^2）	蒸発濃縮物	80000秒	4	0．2
陸上試料	大気中放射性物質（大気浮遊じん）	8,000～10,000m^3	灰化物 ろ紙	80000秒	0．9	0．02
陸上試料	陸水	20ℓ	蒸発濃縮物	80000秒	40	4
陸上試料	土壌	100g乾土	乾燥細土	80000秒	20	2
陸上試料	指標植物（松葉）	1kg生	灰化物	80000秒	2	0．2
陸上試料	畜産物（牛乳）	2ℓ	灰化物	80000秒	0．5	0．07
陸上試料	農産物	1kg生	灰化物	80000秒	2	0．2
海洋試料	海水	20ℓ	共沈物	80000秒	——	3
海洋試料	海底土	100g乾土	乾燥細土	80000秒	20	2
海洋試料	指標海産物（ホンダワラ）	1kg生	灰化物	80000秒	2	0．3
海洋試料	海産物 藻類	1kg生	灰化物	80000秒	2	0．3
海洋試料	海産物 貝類 魚類	1kg生	灰化物	80000秒	2	0．2

（注）「—」は調査対象外を示す。

値が異なるため、検出目標レベルを定めて運用する。

Fe－59	Co－58	Co－60	Cs－134	Cs－137	I－131 (直接法)	単 位
0．4	0．2	0．1	0．1	0．2	——	Bq/m²・月
0．08	0．04	0．02	0．02	0．02	——	mBq/m³
6	4	3	3	4	——	mBq/ℓ
3	2	2	2	2	——	Bq/kg乾土
0．4	0．2	0．2	0．2	0．2	——	Bq/kg生
0．2	0．09	0．09	0．09	0．06	0．07	Bq/ℓ
0．4	0．2	0．2	0．2	0．2	0．2	Bq/kg生
6	3	3	3	2	——	mBq/ℓ
3	2	2	2	2	——	Bq/kg乾土
0．5	0．3	0．3	0．2	0．2	0．2	Bq/kg生
0．5	0．3	0．3	0．2	0．2	0．2	Bq/kg生
0．4	0．2	0．2	0．2	0．2	——	Bq/kg生

3．検出目標レベル（つづき）

ストロンチウム、トリチウムの測定は、検出器の性能、試料の形状、測定時間等により検出下限値が異なるため、検出目標レベルを定めて運用する。
次表に試料毎の核種別の検出目標レベルを示す。

<table>
<tr><th colspan="3" rowspan="2">測定試料</th><th colspan="2">測定条件</th><th rowspan="2">Sr－90</th><th rowspan="2">H－3</th><th rowspan="2">単位</th></tr>
<tr><th>供試料量</th><th>測定時間</th></tr>
<tr><td rowspan="4">陸上試料</td><td colspan="2">陸水</td><td>50mℓ</td><td>30,000秒</td><td>——</td><td>1</td><td>Bq/ℓ</td></tr>
<tr><td colspan="2">土壌</td><td>100g乾土</td><td rowspan="3">3,600秒</td><td>0．4</td><td>——</td><td>Bq/kg乾土</td></tr>
<tr><td rowspan="2">農畜産物</td><td>畜産物（牛乳）</td><td>2ℓ</td><td>0．02</td><td>——</td><td>Bq/ℓ</td></tr>
<tr><td>農産物</td><td>1kg生</td><td>0．04</td><td>——</td><td>Bq/kg生</td></tr>
<tr><td rowspan="4">海洋試料</td><td colspan="2">海水</td><td>50mℓ</td><td>30,000秒</td><td>——</td><td>1</td><td>Bq/ℓ</td></tr>
<tr><td colspan="2">海底土</td><td>100g乾土</td><td rowspan="3">3,600秒</td><td>0．4</td><td>——</td><td>Bq/kg乾土</td></tr>
<tr><td rowspan="2">海産物</td><td>藻類</td><td rowspan="2">1kg生</td><td rowspan="2">0．04</td><td>——</td><td>Bq/kg生</td></tr>
<tr><td>魚類
貝類</td><td>——</td><td>Bq/kg生</td></tr>
</table>

（注）「－」は調査対象外を示す。
